

Manaus, 19 de fevereiro de 2016

Ofício nº 09/2016

Assunto: Resposta a Notificação nº 02/2016

ATT.: À Comissão de Fiscalização do contrato 04/2015 - Parintins

Na oportunidade em que o(a) cumprimentamos, estamos por meio desta, esclarecendo a Comissão de Fiscalização responsável pela Obra de Construção do Ginásio Poliesportivo do IFAM – Parintins, os itens solicitados na notificação nº 02/2016.

Informamos que o atraso no cronograma físico, lentidão e baixa produtividade dos serviços realizados é um problema que estamos cientes e que não foi gerado somente pela empresa, pois, todos os pagamentos recebidos foram pagos com atraso e isto impacta diretamente na evolução dos serviços uma vez que os pagamentos estão sendo realizados com uma média de 100 dias após a emissão das notas fiscais de faturamento, conforme foi demonstrado no ofício 08/2016 desta empresa encaminhado para a comissão de fiscalização do referido contrato.

Informamos que apesar das dificuldades apresentadas, esta empresa já está tomando providências para acelerar a execução dos serviços e que a situação atual da obra já esta diferente ao que foi exposto nas fotos presentes nesta notificação nº02/2016 conforme exponho nas fotos a seguir.

Fotos 01,02 e 03: Concretagem dos blocos de fundação e vigas baldrames

Foto 01




Pro-Reitoria de Administração
PROCOLO
19.02.16
Recebido em: 14.36
Horário: *Rouff*

Foto 02



Foto 03

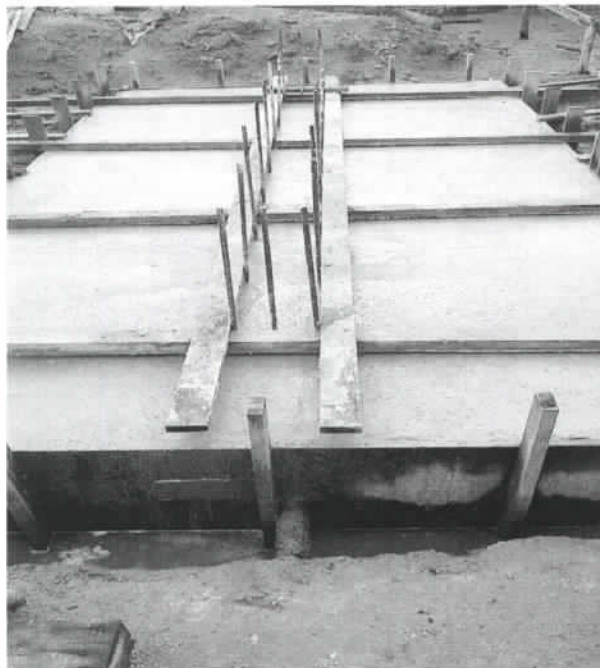

A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

Fotos 04 e 05: Instalação das formas e ferragens dos blocos e vigas baldrame

Foto 04

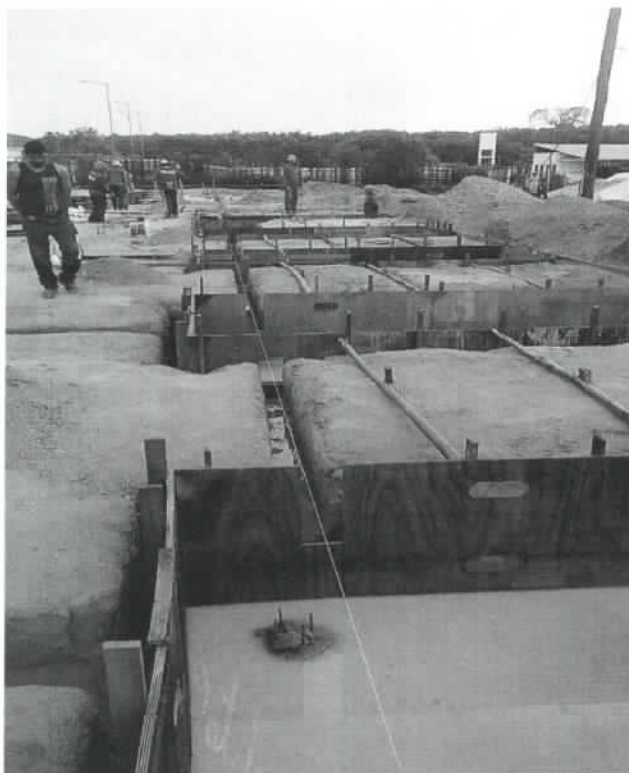


Foto 05



A handwritten signature in blue ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

A estrutura metálica de cobertura já esta no canteiro de obra e iniciaremos o processo de montagem dos arcos e pintura para posterior instalação.

Esta empresa vem reiterar seu total compromisso em executar os serviços pertinentes a obra com agilidade e atenção aos critérios definidos nas especificações técnicas e que esta sempre disposta a atender as solicitações realizada por esta Comissão de Fiscalização.

Certos de sua compreensão,


EMBRATERRO IND. E COM. LTDA
Angelito Costa Chaves
Eng. Civil / CREA-17945/AM
