

GESTORES/FISCAIS INSTITUCIONAIS

Módulo Monitoramento – Obras 2.0 - FNDE



Definições	03
Apresentando o Sistema Integrado de Monitoramento do MEC	04
Solicitação de Cadastro	05
Acessando ao sistema Simec	09
Tela Principal	11
Dados da Obra	14
Licitação	23
Contratação	38
Cronograma	61
Vistoria	77
Recursos	101
Documentos	107
Galeria de Fotos	113
Execução Orçamentária	119
Prazos	138
Aditivo ao contrato	140
Obras Paralisadas	161
Sugestão mínima para Fotografias	163
Orientações Gerais	166

MEC - Ministério da Educação e Cultura

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação

DIGAP - Diretoria de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais

CGIMP - Coordenador-Geral de Implementação e Monitoramento de Projetos Educacionais

Fiscal Institucional - técnico engenheiro/arquiteto da Secretaria de Educação do Estado ou da Prefeitura responsável pelo acompanhamento da execução da obra, por inserir e pela qualidade das informações no sistema Simec;

Gestor institucional – responsável junto ao FNDE pelo cumprimento do objeto acordado (Convênio/Termo de Compromisso, etc.) e pelo valor recebido.

Manual digital:

<http://www.fnde.gov.br/programas/proinfancia/monitoramento-proinfancia>

ORIENTAÇÕES GERAIS

ATENÇÃO

A execução do objeto acordado com o FNDE tem sua **localização, projetos e planilhas orçamentárias** analisados e aprovados previamente à assinatura e repasse do recurso.

Toda e qualquer alteração que se fizer necessária posteriormente à assinatura do documento com o FNDE deve ser, **antes de sua adoção e execução pelo construtor**, solicitada a análise à equipe CGEST/FNDE e somente poderá ser executada após sua aprovação.



TERMO DE COMPROMISSO:

O prazo de vigência do Termo de Compromisso é de 720 dias a contar de sua assinatura. Solicitação de prorrogação deverá ser realizada pelo Simec módulo PAR., com antecedência **mínima de um mês**.

CONVÊNIO:

Quando necessário deve-se , por meio de ofício endereçado à DIRETORIA DE GESTÃO ARTICULAÇÃO E PROJETOS EDUCACIONAIS - DIGAP/FNDE, solicitar e justificar a prorrogação do prazo de vigência, com no mínimo três meses de antecedência da data de final do convênio.

As informações sobre a execução da obra no sistema Simec, módulo Obras 2.0, devem ser atualizadas, no máximo, mensalmente, inserindo vistorias, as informações nas abas e toda a documentação necessária.



Ao **gestor institucional**, responsabilidade pelo uso do recurso repassado, cabe verificar o prazo de vigência do documento pactuado com o FNDE pela manutenção da atualização e preenchimento do sistema Simec e pela garantia da veracidade das informações prestadas ao FNDE. Acompanhar e cobrar do fiscal institucional e da empresa contratada a execução da obra dentro do prazo e da qualidade da obra pactuados com o FNDE.

O **fiscal institucional** é responsável: pelo acompanhamento da execução das obras; pelas informações prestadas e inseridas sob seu nome e CPF ao FNDE; pela cobrança da execução da obra dentro do cronograma informado; por garantir a qualidade dos serviços recebidos da construtora ao final da obra e sua conformidade com o projeto apresentado ao FNDE e por expedir o Termo de Recebimento Provisório e o Definitivo da obra. Deve sempre observar os prazos informados no Simec módulo Obras 2.0 e mantê-los atualizados com a inserção dos documentos que se fizerem necessários.

Devem ser observados:

- Prazo de **vigência** do documento pactuado com o FNDE;
- Prazo de **início** e **fim** do contrato entre a Instituição e a empresa executora;
- Prazo de **vigência contratual** entre a Instituição e a empresa executora;
- Prazo de **execução da obra**;
- Prazos dos **serviços no cronograma**.



Documentos solicitados:

Documento sobre a licitação (Publicação do Edital, Abertura da Proposta, Homologação, etc...) – aba Licitação;

Contrato assinado com a empresa – aba Contratação;

Ordem de Serviço – aba Contratação;

Planilha Orçamentária – aba Contratação;

Aditivos ao contrato realizados – aba Contratação;

Empenhos – aba Execução Orçamentária;

Notas fiscais para cada medição – aba Execução Orçamentária;

ART's (de fiscalização e de execução) assinadas e pagas, registradas no CREA regional – aba Documentos;


Demais documentos – aba Documentos.

Fotografias legendadas de todos os ambientes da unidade escolar executados, de forma que comprovem, adequada e indubitavelmente, a evolução física relatada.

SIMEC

SiMEC Apresentando o Sistema Integrado de Monitoramento do MEC

10

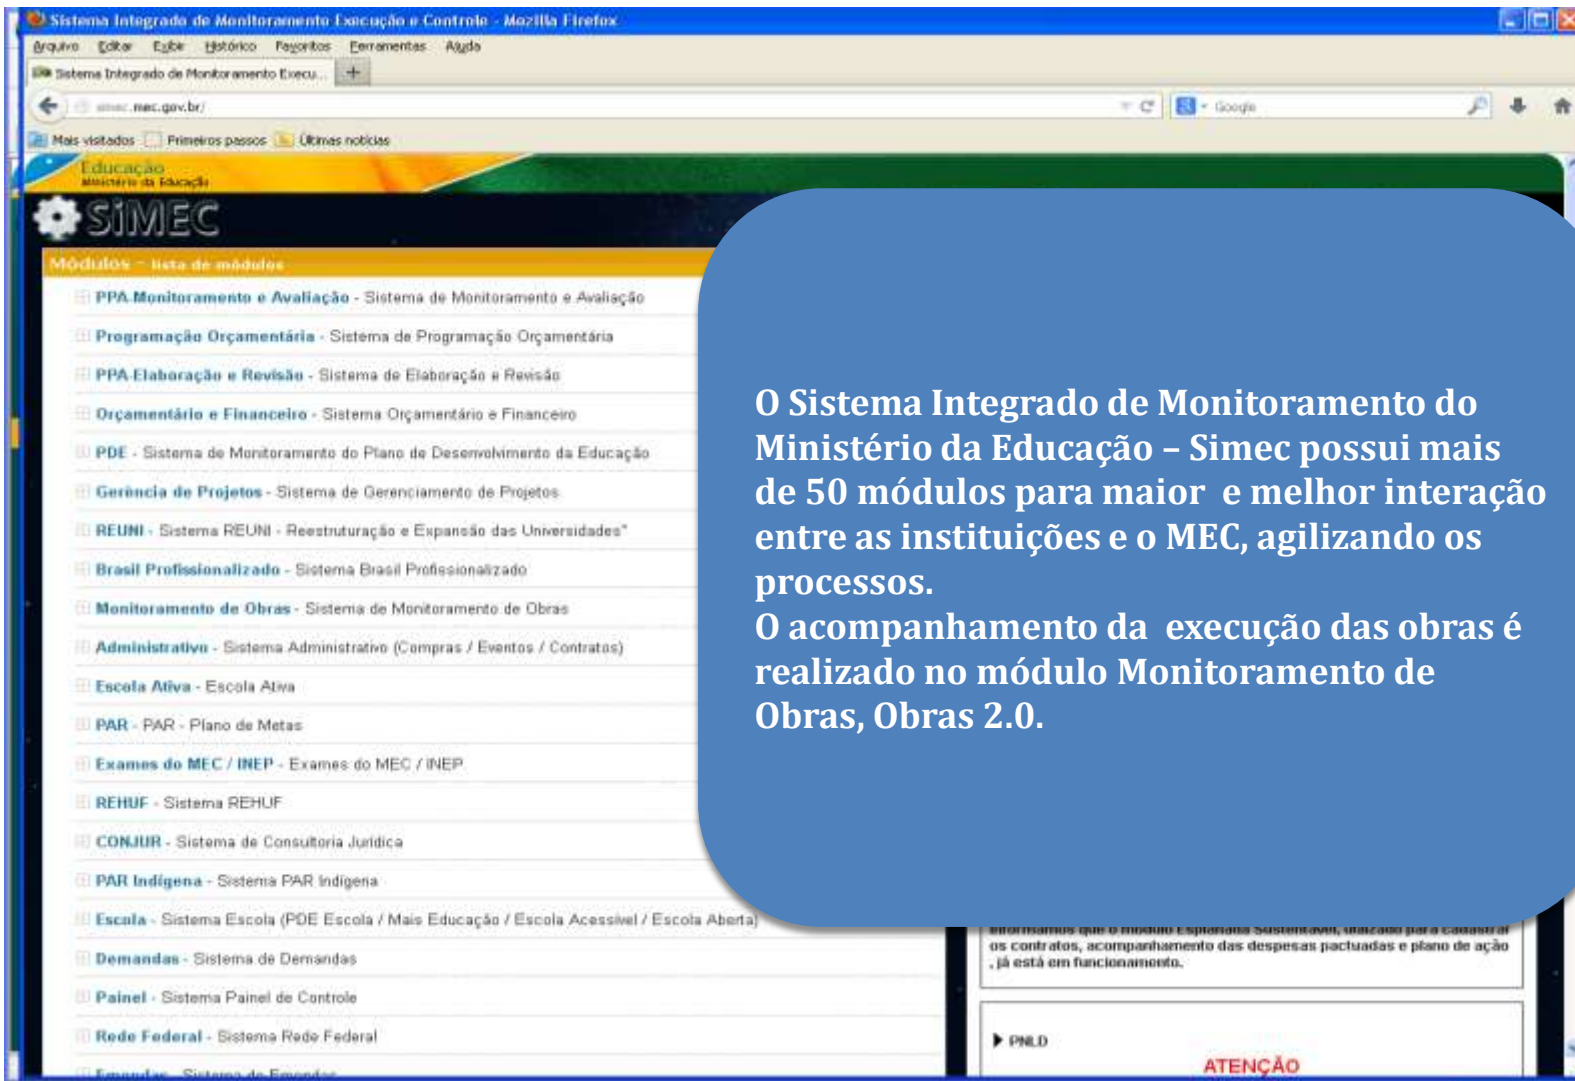

The screenshot displays the SiMEC web application interface. The browser window title is "Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - Mozilla Firefox". The address bar shows "simec.mec.gov.br". The page header includes the logo of the Ministry of Education (Ministério da Educação) and the SiMEC logo. A sidebar menu titled "Módulos - lista de módulos" lists various modules, including:

- PPA Monitoramento e Avaliação - Sistema de Monitoramento e Avaliação
- Programação Orçamentária - Sistema de Programação Orçamentária
- PPA Elaboração e Revisão - Sistema de Elaboração e Revisão
- Orçamentário e Financeiro - Sistema Orçamentário e Financeiro
- PDE - Sistema de Monitoramento do Plano de Desenvolvimento da Educação
- Gerência de Projetos - Sistema de Gerenciamento de Projetos
- REUNI - Sistema REUNI - Reestruturação e Expansão das Universidades*
- Brasil Profissionalizado - Sistema Brasil Profissionalizado
- Monitoramento de Obras - Sistema de Monitoramento de Obras
- Administrativo - Sistema Administrativo (Compras / Eventos / Contratos)
- Escola Ativa - Escola Ativa
- PAR - PAR - Plano de Metas
- Exames do MEC / INEP - Exames do MEC / INEP
- REHUF - Sistema REHUF
- CONJUR - Sistema de Consultoria Jurídica
- PAR Indígena - Sistema PAR Indígena
- Escola - Sistema Escola (PÓE Escola / Mais Educação / Escola Acessível / Escola Aberta)
- Demandas - Sistema de Demandas
- Painel - Sistema Painel de Controle
- Rede Federal - Sistema Rede Federal
- Eventos - Sistema de Eventos

At the bottom right, there is a notification box with the text: "Informamos que o módulo Esporões Sistemável, utilizado para a controlar os contratos, acompanhamento das despesas pactuadas e plano de ação, já está em funcionamento." Below this, there is a "PNLD" button and a red "ATENÇÃO" label.

O Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação – Simec possui mais de 50 módulos para maior e melhor interação entre as instituições e o MEC, agilizando os processos.

O acompanhamento da execução das obras é realizado no módulo Monitoramento de Obras, Obras 2.0.

SOLICITAR CADASTRO




Primeiro acesso ao Sistema SIMEC, deve-se solicitar o cadastro:

1. acessar ao sistema pelo endereço: simec.mec.gov.br
2. solicitar o cadastro no sistema;
3. a instituição (SEDUC/Prefeitura) deverá **encaminhar e-mail com ofício assinado pelo Gestor Institucional**, contendo os dados do fiscal (nome, CPF, CREA/CAU,...) responsável pela fiscalização e preenchimento das informações no SIMEC, identificar a obra.

E-mail: senha.monitoramento@fnde.gov.br

Após clicar em **Solicitar Cadastro** abrirá a seguinte tela:

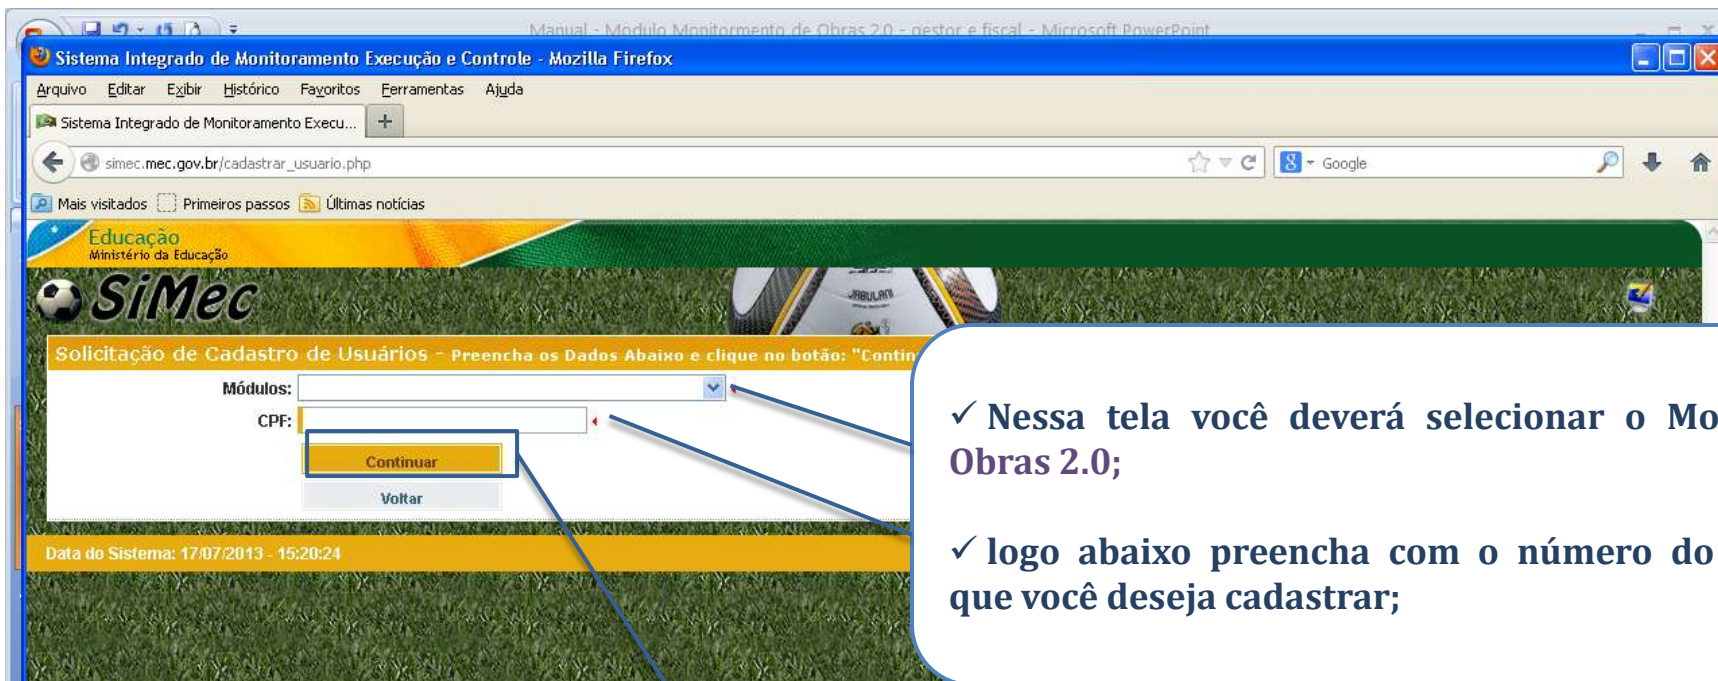

Manual - Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - gestor e fiscal - Microsoft PowerPoint

Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle - Mozilla Firefox

Arquivo Editar Exibir Histórico Favoritos Ferramentas Ajuda

Sistema Integrado de Monitoramento Execu... +

simec.mec.gov.br/cadastrar_usuario.php

Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias

Educação
Ministério da Educação

SiMEC

Solicitação de Cadastro de Usuários - Preencha os Dados Abaixo e clique no botão: "Continuar"

Módulos:

CPF:

Continuar

Voltar

Data do Sistema: 17/07/2013 - 15:20:24

✓ Nessa tela você deverá selecionar o Modulo Obras 2.0;

✓ logo abaixo preencha com o número do CPF que você deseja cadastrar;

Feito isto clique em **Continuar**



Ficha de Solicitação de Cadastro de Usuários

Módulo: Obras 2.0

Obras 2

Obras 2.0

- Público-Alvo: Obras 2.0
- Sistemas Relacionados: Obras 2.0

CPF: 892.176.292-27

Nome:

Sexo: Masculino Feminino

UF:

Município: A Unidade Federal selecionada não possui municípios.

Tipo do Órgão / Instituição: Outros

Órgão / Instituição:

Unidade Orçamentária: Este órgão não possui uma unidade.

Unidade Gestora: Esta unidade não possui uma Unidade Gestora.

(DDD) + Telefone:

Seu E-Mail:

Confirme o Seu E-Mail: Este e-mail é para uso individual, não utilize endereço coletivo.

Função/Cargo: Engenheiro / Arquiteto - Supervisão de Obra

Observações:

Perfil desejado: Empresa supervisora - Gestor

Enviar Solicitação Voltar

✓ Tipo de órgão/Instituição: **Nome da Instituição**

✓ Órgão/Instituição: **Nome da Instituição**

✓ **INSERIR DADOS PARA CONTATO**

✓ Função/Cargo: **Engenheiro/ Arquiteto**

✓ Perfil Desejado: **SUPERVISOR INSTITUCIONAL**

Clicar em **Enviar Solicitação**

Após o cadastramento e o encaminhamento do
ofício via e-mail:

senha.monitoramento@fnde.gov.br

Aguarde o retorno via e-mail com a senha
provisória para acesso ao Sistema Simec , módulo
Obras 2.0. No primeiro acesso será solicitada a
elaboração de nova senha.




ACESSANDO O SISTEMA
SIMEC

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec

Como acessar ao Simec



17



Acesso no Sistema:

1. Acessar a página do Simec: simec.mec.gov.br para efetuar login no Sistema
2. Digitar o CPF e a senha de acesso ;
3. Clicar em “Entrar”.

TELA PRINCIPAL

Após log in tem-se:

1. Lista de Obras que apresenta a possibilidade de “Pesquisa Avançada” ou Pesquisar;
2. Apresenta a listagem de obras às quais o fiscal está vinculado.

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Pesquisar Gerar Excel

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato	
							1000015				(1000015) Obra teste - 003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasília - DF			Planejamento pelo proponente	29/07/2013 (8 dia(s))					Escola de Educação Infantil Tipo B	
							7828				(7828) teste 02	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Brasília - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 (15 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00	

Total de Registros: 2

A **vinculação** à obra se dá por meio de solicitação expressa via ofício pelo Gestor Institucional ao FNDE, via e-mail encaminhado para: senha.monitoramento@fnde.gov.br



Tela Lista de Obras:
 1. Gráfico de Evolução Financeira;
 2. Acesso a obra.

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Pesquisar Gerar Excel

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
							1000015			(1000015) Obra teste - 003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasília - DF			Planejamento pelo proponente	29/07/2013 (8 dia(s))				Escola de Educação Infantil Tipo B	
							7828			(7828) teste 02	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Brasília - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 (15 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00

Total de Registros: 2

BUSCA DE OBRA



Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Pesquisa pelo número de identificação da Obra "ID"

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
							1000015				(1000015) Obra teste	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasília - DF			Planejamento pelo proponente	29/07/2013 (8 dia(s))				Escola de Educação Infantil Tipo B	
							7828						Brasília - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 (15 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00

Total de Registros: 2

O ID da obra auxilia a sua identificação
Sempre que encaminhar um e-mail ao Monitoramento indique no campo Assunto o nome do município, o Estado e o ID da obra.

Data: 06/08/2013 - 14:40:38 / Último acesso (06/08/2013) - Usuários

1 -Escrever o número do ID da obra a ser buscada pelo Simec

SIMEC Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato		
							1000146				(1000146) Fundo Nacional de teste Desenvolvimento da vinculada Educação					Aguardando 1º repasse						Escola de Educação Infantil Tipo B		
							1000147				(1000147) Fundo Nacional de teste Desenvolvimento da vinculada Educação					Aguardando 1º repasse							Escola de Educação Infantil Tipo B	
							1000015				(1000015) FUNDO NACIONAL Obra DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasilia - DF	07/08/2013	21/10/2014	Paralisada	06/08/2013 00:00:00 (21 dia(s))	06/08/2013	Instituição		7,32	Escola de Educação Infantil Tipo B	1.190.000,00		
							7828				(7828) Fundo Nacional de teste 02 Desenvolvimento da Educação	Brasilia - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 00:00:00 (36 dia(s))	22/07/2013			0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00		

Total de Registros: 4



2 - Clicar em "Pesquisar"

SiMEC Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato	
							1000146				(1000146) teste vinculada	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação				Aguardando 1º repasse						Escola de Educação Infantil Tipo B	
							1000147				(1000147) teste vinculada	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação				Aguardando 1º repasse						Escola de Educação Infantil Tipo B	
							1000015				(1000015) teste - 003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasilia - DF	07/08/2013	21/10/2014	Paralisada	06/08/2013 00:00:00 (21 dia(s))	06/08/2013	Instituição	7,32	Escola de Educação Infantil Tipo B	1.190.000,00	
							7828				(7828) teste 02	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Brasilia - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 00:00:00 (36 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00	

Total de Registros: 4

The screenshot shows the SIMEC Obras 2.0 interface. At the top, there is a navigation menu with 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. Below this is a search bar with the text 'Nome da Obra / ID: 7828' and a '[Busca avançada]' button. A 'Pesquisar' button is also visible. The main content area displays a table with the following data:

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
							7828				(7828) teste 02	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Brasília - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 00:00:00 (36 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00

Below the table, it says 'Total de Registros: 1'. At the bottom of the page, there is a status bar with the text: 'Data: 27/08/2013 - 17:06:36 / Último acesso (27/08/2013) - Usuários Online: 1 / SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 1,3709s / 6,35'.

Após a Busca o sistema retorna a obra procurada.



Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: [Busca avançada]

Pesquisar Gerar Excel

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
							1000015				(1000015) Obra teste - 003	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO	Brasília - DF			Planejamento pelo proponente	29/07/2013 (8 dia(s))				Escola de Educação Infantil Tipo B	
							7828				(7828) teste 02	Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação	Brasília - DF	03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 (15 dia(s))	22/07/2013		0,44	Escola de Educação Infantil Tipo C	100,00

Total de Registros: 2

Data: 06/08/2013 - 14:40:38 / Último acesso (06/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 12,4980s / 4,48

“Pesquisa Avançada”



Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec BUSCA de OBRA



SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

SIMEC - Sistema Integrado de Monitorament...

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal&listaObras&acao=A

Principal Relatórios Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID: _____

Agrupar por: Unidades Obras

Busca Avançada

Situação: Todos

Tipo de Obra: Todos

Classificação da Obra: Todos

Tipologia da Obra: Todos

Programa: Todos

Fonte: Seleciona...

Modalidade de Ensino: Todos

Unidade: Todos

Última atualização: Todos

UF: Seleciona...

Município: Seleciona...

Efêre: Seleciona...

Postul foto: Sim Não Todas

Postul vídeo: Sim Não Todas

Postul relatório: Sim Não Todas

Restrição superada: Sim Não Todas

Postul Aditivo: Sim Não Todas

Postul Supervisão: Sim Não Todas

Tipo Vídeos (Realizado por): Todos

Valor da Obra: De: _____ Até: _____

Nível de Preenchimento: Todos

% Executado da Obra: Mínimo Máximo
0% 100%

Pesquisar Gerar Excel

Ação	A	F	P	G	R	I	A	D	ID	ID	Convênio	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início de Execução	Data de Término de Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vitória	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato
------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----------	-----------------	------	----------------------	-----------	----------------------------	-----------------------------	------------------	--------------------	----------------	---------------	-------------	-----------	----------------

BUSCA AVANÇADA

1- Selecionar os filtros para realizar a pesquisa;



Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Educação Básica

Lista de Obras

Filtre as Obras

Nome da Obra / ID:

Agrupar por: Unidades Obras

Busca Avançada

Situação:

Tipo de Obra:

Classificação da Obra:

Tipologia da Obra:

Programa:

Fonte:

Modalidade de Ensino:

Unidade:

Última atualização:

UF:

Município:

Esfera:

Possui foto: Sim Não Todas

Possui vistoria: Sim Não Todas

Possui restrição: Sim Não Todas

Restrição superada: Sim Não Todas

Possui Aditivo: Sim Não Todas

Possui Supervisão: Sim Não Todas

Tipo Vistoria (Realizado por):

Valor da Obra: De: Até:

Nível de Preenchimento:

% Executado da Obra:

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID	Convênio	Ano do	Obra	Unidade	Município	Data de	Data de	Situação	Última	Última	Realizado	%	Tipologia	Valor
------	---	---	----	---	---	----	----	----	----------	--------	------	---------	-----------	---------	---------	----------	--------	--------	-----------	---	-----------	-------

BUSCA AVANÇADA (cont.)

2- Clicar em Pesquisar



Aparece a Lista de Obras às quais se tem acesso

The screenshot shows the 'Busca de Obra' (Work Search) interface in the Simec system. It features a sidebar with various filters and a main table displaying search results.

Search Filters:

- Programa: Todos
- Fonte: Selecciona...
- Modalidade de Ensino: Todos
- Unidade: Todos
- Última atualização: Todos
- UF: DF - Distrito Federal
- Município: Brasília
- Esfere: Selecciona...
- Possui foto: Sim Não Todas
- Possui vistoria: Sim Não Todas
- Possui restrição: Sim Não Todas
- Restrição superada: Sim Não Todas
- Possui Aditivo: Sim Não Todas
- Possui Supervisão: Sim Não Todas
- Tipo Vistoria (Realizado por): Todos
- Valor da Obra: De: [] Até: []
- Nível de Preenchimento: Todos
- % Executado da Obra: Mínimo: 0% Máximo: 100%

Buttons: Pesquisar, Gerar Excel

Table Headers: Ação, A, F, PG, R, I, AD, ID, ID Pré-Obra, Conexão, Ano do Convênio, Obra, Unidade Implantadora, Município, Data de Início da Execução, Data de Término da Execução, Situação da Obra, Última Atualização, Última Vistoria, Realizado por, % Executado, Tipologia, Valor Contrato

Ação	A	F	PG	R	I	AD	ID	ID Pré-Obra	Conexão	Ano do Convênio	Obra	Unidade Implantadora	Município	Data de Início da Execução	Data de Término da Execução	Situação da Obra	Última Atualização	Última Vistoria	Realizado por	% Executado	Tipologia	Valor Contrato	
							1000146		(1000146) Fundo Nacional de teste Desenvolvimento da vinculação Educação							Aguardando 1º repasse						Escola de Educação Infantil Tipo B	
							1000147		(1000147) Fundo Nacional de teste Desenvolvimento da vinculação Educação							Aguardando 1º repasse						Escola de Educação Infantil Tipo B	
							1000015		(1000015) FUNDO NACIONAL DE teste - 003 DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		Brasília - DF		07/08/2013	21/10/2014	Paralizada	06/08/2013 00:00:00 (21 dias(s))	06/08/2013	Instituição		7,32		Escola de Educação Infantil Tipo B	1.190.000,00
							7828		(7828) Fundo Nacional de teste 02 Desenvolvimento da Educação		Brasília - DF		03/07/2013	01/09/2013	Execução	22/07/2013 00:00:00 (35 dias(s))	22/07/2013			0,44		Escola de Educação Infantil Tipo C	160,00

Total de Registros: 4



DADOS DA OBRA

WORKFLOW :

O módulo Obras 2.0 traz o controle de fluxo de trabalho, o Workflow, para que se façam todas as alterações da situação da obra e se possa ter o histórico das mesmas.


A cada passo que for realizar deve-se observar o estado atual e realizar a tramitação necessária.






estado atual
Planejamento pelo proponente
ações
Enviar para obra cancelada

Retornar para Aguardando 1º Repasse
Enviar para licitação
Enviar para reformulação
Enviar para Registro de Preços
histórico



estado atual
Licitação
ações
Enviar para obra cancelada
Enviar para contratação
Retornar para planejamento pelo proponente

Enviar para Aguardando registro de preços
histórico


estado atual
Contratação
ações
Enviar para obra cancelada
Enviar para execução
Retornar para licitação
histórico


estado atual
Execução
ações
Enviar para obra cancelada

Retornar para contratação
histórico


estado atual
Paralisada
ações
Enviar para obra cancelada
Retornar para Execução
histórico


estado atual
Celebração de aditivo
ações
Enviar para obra cancelada
Cancelar solicitação de aditivo
Enviar para Execução
histórico


Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec DADOS DA OBRA



32

ABA CADASTRO DE OBRA

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

[Dados da Obra](#) | [Cadastro](#) | [Compras](#) | [Vendas](#) | [Recursos](#) | [Documentos](#) | [Serviço de Férias](#) | [Emissão Organizativa](#)

Tipo de ensino: Educação Básica
Data: (007) Obra teste - 033
Município/UF: Brasília - DF

Cadastro de Obra
 + Adicionar Campo Obrigatório

Tipo de Ensino: Educação Básica
Fase:
Unidade Insritadora: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO [Pesquisar] +
Nome da Obra: Obra teste - 033
Tipologia da Obra: Escola de Educação Infantil Tipo A
Tipo de Obra: Construção
Classificação da Obra: Urbana
Descrição / Composição da Obra:
Valor Previsto (R\$): 1.000.000,00 +

Data da Obra:
Efetivo:
Programa: PROEFICIENCIA
Instância de Ensino:

Histórico de Paralisações
 Não foram encontrados Registros

Local da Obra
CEP: 70.170-500
Logradouro: 888 Quilom. 2 Bloco 4
Nome:
Complemento:
Bairro: Asa Sul
Município/UF: Brasília - DF

Coordenadas Geográficas
Latitude: - S +
Longitude: - W +
 Visualizar / Inserir no Mapa

Contatos

Nome	Telefone
(98) 201-076-31 ADILENE SILVA MARTINS	(61) 2022-4852
Total de Registros: 1	

Responsáveis pela Obra

Nome	E-mail	Telefone	Superior Unidade	Perfil
ANTONIELLE FERNANDES MARTINS	antonelle.fernandes@fnde.gov.br	2022-4184	Superior Unidade	
Total de Registros: 1				

Contatos do PAR

Visualizar Contatos PAR

Salvar

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec

DADOS DA OBRA



33

Cadastro de Obra

↑ indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica

Foto:

Unidade Implantadora: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO

Nome da Obra: Obra teste - 003

Tipo da Obra: Escola de Educação Infantil Tip:

Tipo da Obra: Construção

Classificação da Obra: Urbana

Descrição / Composição da Obra:

Valor Previsto (R\$): 1.500.000,00

Dados da Obra:

Esfere: Estadual

Programa: PROINFÂNCIA

Modalidade de Ensino: Infantil

Matrizes de Paralelações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP: 70.070-929

Logradouro: SRS Quadra 2 Bloco F

Número:

Complemento:

Bairro: Ass Sul

Município/UF: Brasília DF

Coordenadas Geográficas

Latitude: ° ' " S

Longitude: ° ' " W

Contatos

Nome

(989 281.076-04) ADLERE SILVA MARTINS

IBR: 2022-4652

Concluído

Internet

100%

Workflow:
Essa nova ferramenta será utilizada sempre que for necessário realizar uma tramitação ou alteração da situação da obra

- Após acessar a obra tem-se todas as abas:
1. Dados da Obra;
 2. Licitação;
 3. Contratação;
 4. Cronograma;
 5. Vistorias;
 6. Recursos;
 7. Documentos;
 8. Galeria de Fotos;
 9. Execução Orçamentária.



- 1. Dados da Obra (Cadastro de Obra):
 - Tem-se todas as informações cadastrais da obra
 - Esta aba não é editável pelo fiscal/gestor institucional;
 - Quaisquer divergências nas informações devem ser repassadas à equipe do FNDE – Monitoramento de Obras.



1. Dados da Obra (Cadastro de Obra):
Campos com as informações dos contatos e responsáveis pela obra



Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município/UF: Brasília / DF

Cadastro de Obra

Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica
Foto:
Unidade Implantadora: FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCACAO [Pesquisar]
Nome da Obra: Obra teste - 003
Tipologia da Obra: Escola de Educação Infantil Tipo
Tipo da Obra: Construção
Classificação da Obra: Urbana
Descrição / Composição da Obra:
Valor Previsto (R\$): 1.500.000,00

Dados da Obra
Esfera: Estadual
Programa: PROINFÂNCIA
Modalidade de Ensino: Infantil

Histórico de Paralisações
Não foram encontradas Registros.

Local da Obra
CEP: 70.070-929
Logradouro: SRS Quadra 2 Bloco F
Número:
Complemento:
Bairro: Aze Sul
Município/UF: Brasília / DF

Coordenadas Geográficas
Latitude: ° ' " S
Longitude: ° ' " W
Visualizar / Buscar No Mapa

Atualizar atual
Planejamento pelo proponente
ações
Enviar para licitação
Histórias

Workflow:

Para **tramitar** a obra de “Planejamento pelo Proponente” para “Licitação”, deve-se clicar em “**Enviar para licitação**”.

Este procedimento permitirá o preenchimento da aba **Licitação**

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec DADOS DA OBRA



The screenshot shows the 'Dados da Obra' form in the Simec system. The form is titled 'Cadastro de Obra' and includes fields for 'Tipo de Ensino' (Educação Básica), 'Empreendimento' (9007) Obra teste - 003, and 'Município/UF' (Brasília / DF). A 'Mensagem da página da web' dialog box is overlaid on the form, asking 'Deseja realmente enviar para licitação?'. The dialog has 'OK' and 'Cancelar' buttons. A red arrow points from the dialog box to the text in the adjacent callout box. The form also includes sections for 'Dados da Obra' (Esfera: Estadual, Programa: PROINFÂNCIA, Modalidade de Ensino: Infantil), 'Histórico de Paralisações' (Não foram encontradas Registros), and 'Local da Obra' (CEP: 70.070-929, Logradouro: SBB Quadra 2 Bloco F, Complemento, Bairro: Asa Sul, Município/UF: Brasília / DF). The browser address bar at the bottom shows 'http://200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/cadObraacao=A#'. The browser status bar shows 'Internet' and '100%' zoom.

O Módulo Obras 2.0 interage com o usuário:
Um pop up aparecerá perguntando se realmente deseja tramitar a obra para licitação.
Ok – passará para licitação
Cancelar – retorna a situação atual



The screenshot shows the 'Dados da Obra' (Work Data) page in the Simec system. The page is titled 'Cadastro de Obra' and contains various fields for work registration. A modal dialog box titled 'Mensagem da página da web' (Web page message) is displayed in the center, with the text 'Estado alterado com sucesso!' (State changed successfully!) and an 'OK' button. A red arrow points from the dialog box to a blue callout box on the right that says 'Após realizar a operação solicitada, o sistema informa que o estado da obra foi alterado com sucesso' (After performing the requested operation, the system informs that the work status was successfully changed). Another red arrow points from the dialog box to a blue callout box at the bottom that says 'Clique em "OK"' (Click on "OK").

Mensagem da página da web

Estado alterado com sucesso!

OK

Após realizar a operação solicitada, o sistema informa que o estado da obra foi alterado com sucesso

Clique em "OK"

Dados da Obra

Tipo de ensino: Educação Básica

Empreendimento: (9087) Obra teste - 003

Município/UF: Brasília / DF

Cadastro de Obra

Indica Campo Obrigatório.

Tipo de Ensino: Educação Básica

Foto:

Unidade Implantadora: FUNDO NACIONAL DE DESE

Nome da Obra: Obra teste - 003

Tipologia da Obra: Escola de Educação Infa

Tipo da Obra: Construção

Classificação da Obra: Urbana

Descrição / Composição da Obra:

Valor Previsto (R\$): 1.500.000,00

Dados da Obra

Esfera: Estadual

Programa: PROINFÂNCIA

Modalidade de Ensino: Infantil

Histórico de Paralisações

Não foram encontrados Registros.

Local da Obra

CEP: 70.070-929

Logradouro: SBS Quadra 2 Bloco F

Número:


Complemento:




The screenshot displays the SIMEC system interface. A pop-up window titled "Histórico de Tramitações" is open, showing a table of workflow steps. The table has columns for "Seq.", "Onde Estava", "O que aconteceu", "Quem fez", and "Quando fez". The steps listed are:

Seq.	Onde Estava	O que aconteceu	Quem fez	Quando fez
1.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	06/06/2013 16:43:56
2.	Licitação	Retornar para planejamento pelo proponente	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	06/06/2013 16:48:47
3.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	06/06/2013 16:49:09

The pop-up window also includes a "Fechar" button. A red arrow points from the "Fechar" button to a blue text box. Another red arrow points from the "Histórico" icon in the main interface to the same blue text box. The main interface shows a form for "Dados da Obra" with fields for "Classificação da Obra" (Urbana), "Valor Previsto (R\$)" (1.300.000,00), "Estrutura" (Estrada), "Programa" (PROINFÂNCIA), and "Modalidade de Ensino" (Infantil). Other fields include "Local da Obra", "CEP" (70.070-929), "Logradouro" (DBS Quadra 2 Bloco F), "Número", and "Complemento".

WORKFLOW:
Ao clicar no ícone  (histórico) abrirá um pop up com as informações sobre as tramitações ocorridas na obra

LICITAÇÃO

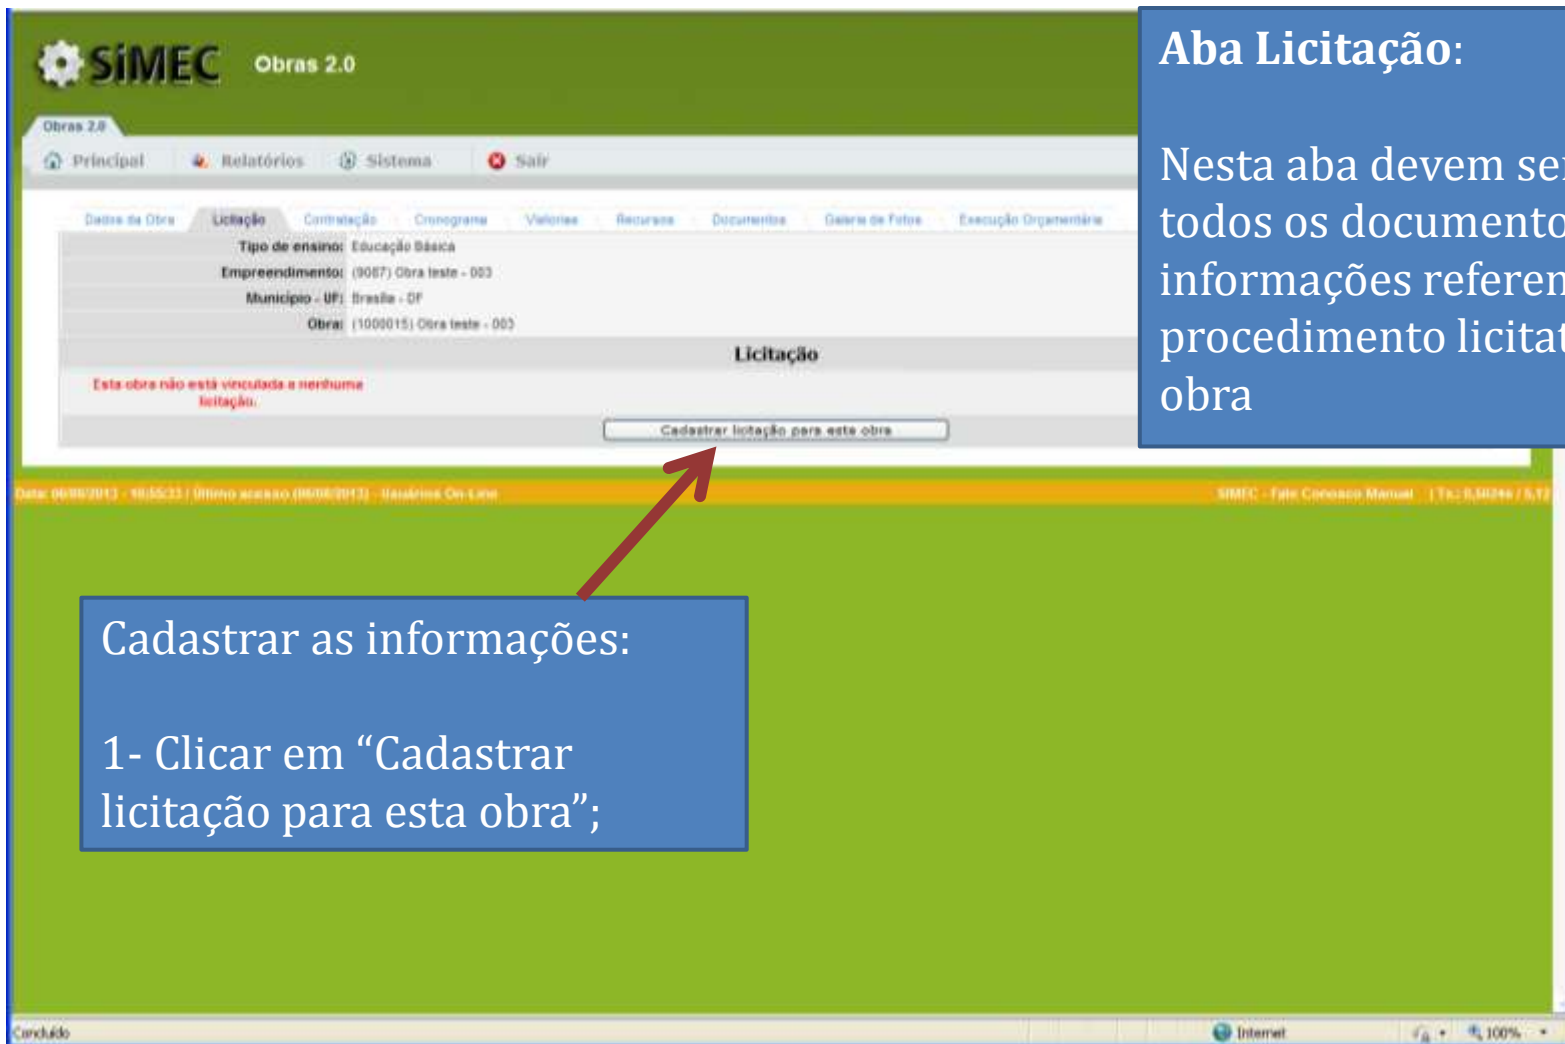

Aba Licitação:

Nesta aba devem ser inseridos todos os documentos e informações referentes ao procedimento licitatório da obra

Cadastrar as informações:

- 1- Clicar em “Cadastrar licitação para esta obra”;



Cadastro de Licitação
Indica Campo Obrigatório

Órgão: Educação Básica

Modalidade de Licitação: Seleção...

Fases de Licitação

Aplo

Inserir Fases de Licitação

Salvar e Voltar Voltar

Data: 06/06/2013 - 17:00:14 | Último acesso: 06/06/2013 | Usuário: On-Line

SiMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,1081x | 4,40

Concluído Internet 100%

2- Selecionar Modalidade de Licitação realizada;



Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 56min06s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Cadastro de Licitação

Órgão: Educação Básica
Modalidade de Licitação: Concorrência

Fases de Licitação

Inscrição	Descrição	Data
-----------	-----------	------

+ Inserir Fases de Licitação

Número da Licitação:

Salvar e Voltar Voltar

Data: 06/08/2013 - 17:00:14 / Último acesso (06/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,1081s / 4,88

3- Clicar em Inserir Fases de Licitação;



The screenshot shows a web browser window titled "Fases da Licitação - Windows Internet Explorer". The address bar shows the URL: `http://200.130.3.100/obras2/obras2.php?modulo=principal/vincFaseLicitacao&acao=A&objeto=licitacao`. The main content area is titled "Fases da Licitação" and contains a form with the instruction "Selecione a fase desejada". A dropdown menu is open, showing the following options: "Selecione...", "Publicação de Edital", "Abertura de Proposta", "Recurso Interposto", and "Homologação da Licitação". A blue callout box with a white border and a pointer to the dropdown menu contains the text: "4- Selecionar a fase da licitação a ser informada;".

Usoário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em:52min06s

voce esta aqui: Principal » Licitação » Cadastro de Licitação

licitação
atório.

Data

Concluído

Internet 100%

Data: 06/08/2013 - 17:00:14 / Último acesso (06/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,1081s / 4,88



5- Inserir as informações;

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 54min32s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Órgão: Educação Básica
Modalidade de Licitação: Concorrência

Fases de Licitação

Ação

Inserir Fases de Licitação

Número da Licitação:

Salvar e Voltar | Voltar

Fases da Licitação - Mozilla Firefox

simec.mec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/vincFaseLicitacao&acao=A&objeto=licitacao

Fases de Licitação
Selecione a fase desejada

Selecionar a Fase: Publicação de Edital
Data: 05/08/2013

Anexar Documentos

Arquivo: Selecionar arquivo... Publicação_DOU.pdf
Descrição: teste
245 máximo de caracteres

Salvar

Data: 07/08/2013 - 09:15:26 / Último acesso (07/08/2013) - Usuários On-Line

1s / 4,65

6- Anexar o documento digitalizado da publicação do edital, na extensão PDF;
7- Salvar.



Órgão: Educação Básica
Modalidade de Licitação: Concorrência
Fases de Licitação
Número da Licitação:
Salvar e Voltar Voltar

Operação realizada com sucesso!
OK

Data: 07/08/2013 - 09:15:26 / Último acesso (07/08/2013) - Usuários On-Line

O Sistema retorna com a informação, após a correta operação.

Clicar em **OK**



SiMEC Obras 2.0

Órgão: Educação Básica
Modalidade de Licitação: Concorrência

Fases de Licitação

Ação	Descrição	Data
	Publicação de Edital	05/06/2013

Insirir Fases de Licitação

Número da Licitação: 1224

Salvar e Voltar Voltar

Data: 07/06/2013 - 09:29:58 | Último acesso: 07/06/2013 - Usuário: On-Line | SiMEC - File Conoco Manual | Tel: 0115316 / 4.51

Informações salvas

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. The header includes the SIMEC logo and 'Obras 2.0'. The user is identified as 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' with a session expiration of 58 minutes and 44 seconds. The navigation menu contains 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The current page is 'Cadastro de Licitação', which includes a breadcrumb trail: 'Você está aqui: Principal > Licitação > Cadastro de Licitação'. The form contains the following fields and elements:

- Órgão: Educação Básica
- Modalidade de Licitação: Concorrência
- Fases de Licitação table:

Ação	Descrição	Data
 	Publicação de Edital	05/06/2013
- Link: Inserir Fases de Licitação
- Numero da Licitação: 1224
- Buttons: Salvar e Voltar, Voltar

The footer shows the date '07/08/2013 - 09:29:58', the last access time '07/08/2013 - 09:29:58', and the SIMEC logo with 'SIMEC - File Conexao Manual' and 'Tel: 0800361431'.

Para inserir mais documentos de licitação:

- 1- Clicar em **“Inserir Fases de Licitação”**;
- 2- Repetir os passos de inserção apresentados para inserção de documentos e fases.

Cadastro de Licitação

Indica Campo Obrigatório.

Órgão: Educação Básica

Modalidade de Licitação: Concorrência

Fases de Licitação

Ação	
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013


Devem ser informadas todas as fases e inseridos todos os documentos digitalizados com a extensão **PDF** até a homologação.

Informar o **Número da Licitação**

Número da Licitação: 123

Salvar e Voltar Voltar

Clicar em **salvar e voltar** para inserir as informações



Confirma a realização da operação
pelo Sistema



Mais visitados Primeiros passos Últimas notícias

SiMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 59min55s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Licitação

Modalidade de Licitação: Concorrência
Número da Licitação: 123

Fases de Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013

estado atual
Licitação
ações
Enviar para contratação
histórico

Editar Licitação

Documentos inseridos e salvos na Aba Licitação



Workflow
apresenta a situação da atual da obra, as ações possíveis e o histórico de tramitação.

Sistema de Monitoramento de Obras 2.0 - Licitação

Dados da Obra

- Tipo de ensino: Educação Básica
- Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
- Município - UF: Brasília - DF
- Obra: (1000015) Obra teste - 003

Licitação

Modalidade de Licitação: Concorrência
Número da Licitação: 123

Fases de Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013

Botão: Editar Licitação

Menu de navegação: estado atual, Licitação, ações, Enviar para contratação, histórico

Tela do Histórico de Tramitações

Seq.	Onde estava	O que aconteceu	Quem fez	Quando fez
1.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	06/08/2013 16:43:56
2.	Licitação	Retornar para planejamento pelo proponente	HENIA RACINE LEDO	06/08/2013 16:48:47
3.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	06/08/2013 16:49:09

Estado atual: Licitação

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 53min14s

Recurso Interposto
Homologação da Licitação

Editar Licitação

Data: 07/08/2013 - 14:37:01 / Último acesso (07/08/2013) - Usuários On-Line

O retorno para uma situação previa é realizado pela equipe CGIMP.

Quando houver a necessidade de voltar uma situação de obra, deve-se solicitar à equipe de monitoramento apresentando as devidas justificativas.

CONTRATAÇÃO

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Licitação

Modalidade de Licitação: Concorrência
Número da Licitação: 123

Fases de Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013

estado atual

- Licitação
- ações
- Enviar para contratação
- histórico

Editar Licitação

WORKFLOW:

Para que se possa preencher os dados relativos à contratação, a obra deve ser **Enviada para Contratação**.



The screenshot displays the Simec Obras 2.0 web application. A central dialog box asks "Deseja realmente enviar para contratação?". Below the dialog, a table lists the stages of the bidding process:

	Descrição	Data
1	Participação de Edital	06/09/2013
2	Abertura de Proposta	06/09/2013
3	Recurso Interposto	08/09/2013
4	Homologação de Licitação	07/09/2013

At the bottom of the interface, the status bar shows: "Data: 05/08/2013 - 11:34:11 / Último acesso: 05/08/2013 - Baudilio Os Lira" and "SiMEC - Fato Contrato Manual | Tel: 8.0576 1137".

Após enviar para Contratação o sistema retorna a pergunta para ser confirmada a ação, “OK”, ou “CANCELAR” a ação.



Manual - Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - gestor e fiscal - Microsoft PowerPoint

Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

Recebendo dado... Primeiros passos Últimas notícias

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 54min29s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Modalidade de Licitação: Concorrência
Número da Licitação: 123

Fases de Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013

Estado alterado com sucesso!
 Bloquear janelas de confirmação desta página?
OK

Editar Licitação

Data: 08/08/2013 - 11:38:11 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fate Conosco Manual | Tx.: 0,4257s / 5,37

Após confirmar a ação de tramitar para Contratação o sistema apresenta a mensagem “Estado alterado com sucesso!”



Obras 2.0



Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS

Sua sessão expira em: 59min53s

- Principal
- Relatórios
- Sistema
- Sair

Dados da Obra | **Licitação** | Contratação | Cronograma

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003


Modalidade de Licitação: Concorrência
Número da Licitação: 123

Fases de Licitação

Descrição	Data
Publicação de Edital	05/08/2013
Abertura de Proposta	06/08/2013
Recurso Interposto	06/08/2013
Homologação da Licitação	07/08/2013

Workflow
Observe o “Estado Atual” da obra alterado de “Licitação” para “Contratação”

- estado atual
- Contratação**
- ações
- Enviar para execução
- histórico

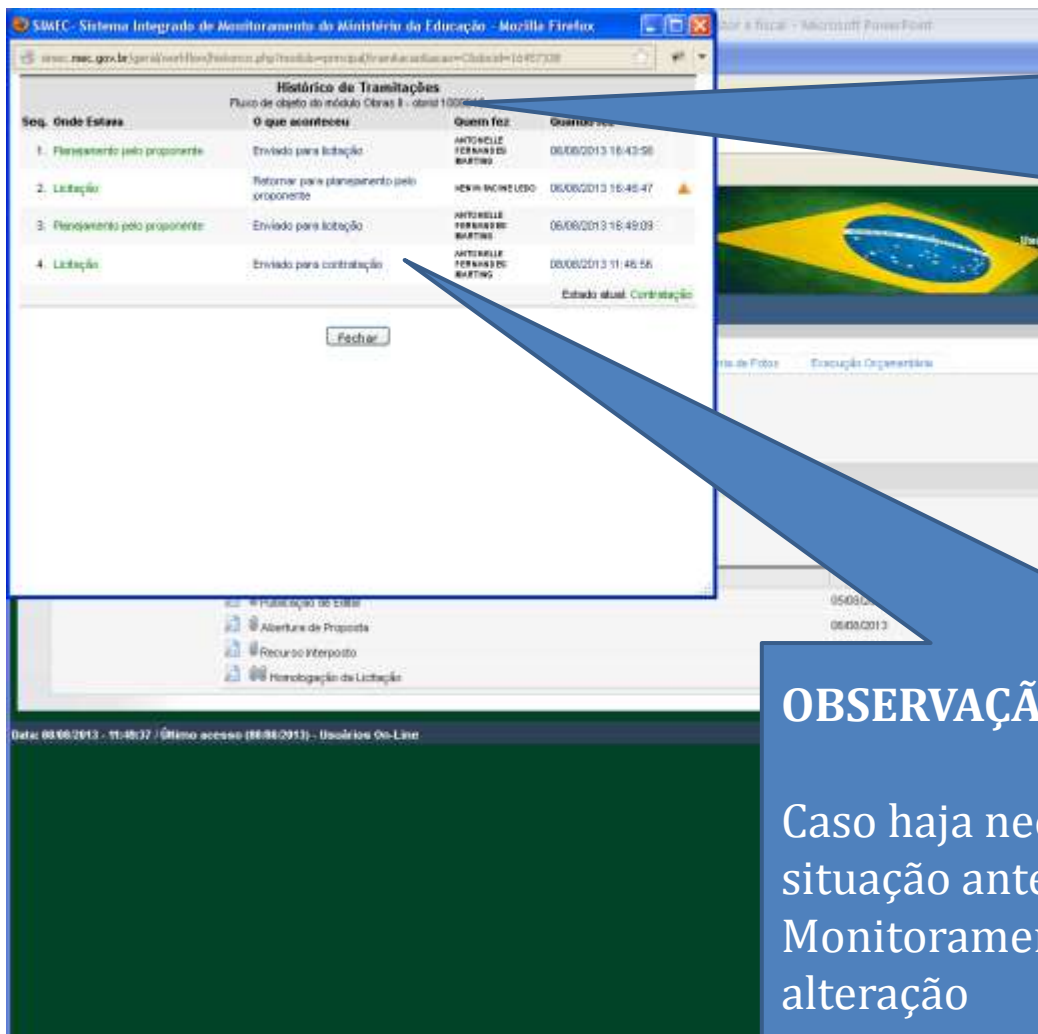

Histórico de tramitações:
Observe o histórico de todas as tramitações realizadas.

OBSERVAÇÃO:
Caso haja necessidade justificada de retornar à situação anterior **deve-se solicitar** à equipe de Monitoramento de Obras – CGIMP que realize a alteração

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application interface. At the top left, the SIMEC logo is visible. The main header includes the text 'Obras 2.0' and a Brazilian flag. On the right side of the header, the user's name 'Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS' and the session expiration time 'Sua sessão expira em: 59min55s' are shown. Below the header is a navigation menu with options: 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The main content area features a tabbed interface with the following tabs: 'Dados da Obra', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', and 'Execução Orçamentária'. The 'Contratação' tab is currently selected, displaying a table with the following data:

Tipo de ensino:	Educação Básica
Empreendimento:	(9087) Obra teste - 003
Município - UF:	Brasilia - DF
Obra:	(1000015) Obra teste - 003

Below the table, the heading 'Contratação' is centered. A red message states: 'Esta obra não está vinculada a nenhum contrato.' Below this message is a button labeled 'Cadastrar contrato para esta obra'. At the bottom of the interface, the status bar shows 'Data: 08/08/2013 - 11:59:16 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line' on the left and 'SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,2021s / 7,04' on the right.

ABA CONTRATAÇÃO:

Após a realização as etapas anteriores, com o perfeito preenchimento das informações sobre a licitação e a tramitação da obra para “Contratação” o botão “ **Cadastrar contrato para esta obra**” é ativado e aparece na tela.

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. At the top left is the SIMEC logo. The header includes the user name 'Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS' and a session expiration notice 'Sua sessão expira em: 59min55s'. A navigation menu contains 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. Below this is a sub-menu with tabs: 'Dados da Obra', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', and 'Execução Orçamentária'. The 'Contratação' tab is active, showing a table with the following data:

Tipo de ensino:	Educação Básica
Empreendimento:	(9087) Obra teste - 003
Município - UF:	Brasília - DF
Obra:	(1000015) Obra teste - 003

Below the table, the heading 'Contratação' is followed by a red message: 'Esta obra não está vinculada a nenhum contrato.' A button labeled 'Cadastrar contrato para esta obra' is positioned below the message. At the bottom of the interface, a status bar shows 'Data: 08/08/2013 - 11:59:16 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line' and 'SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,2021s / 7,04'.

ABA CONTRATAÇÃO:

1- Clicar em “Cadastrar contrato para esta obra”

Cadastro de Contrato
* Indica Campo Obrigatório.
Contratação de Obra
(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Orgão: Educação Básica
Licitação: 123 - Concomitância
Empresa Contratada: [Pesquisar]
Data de Assinatura do Contrato: []
Prazo de Vigência do Contrato (dias): []
Data de término do contrato: []
Valor do Contrato (R\$): []
Percentual BDI: [] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Obras

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra: 1000015 - Obra teste - 003
Data da Ordem de Serviço: []
Início da Execução: []
Prazo de Execução (dias): []
Término da Execução: []
Ordem de Serviço: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Valor Contratado (R\$): [0,00]
Área/Quantidade a ser Construída: [0,00] Unidade de Medida: [m2]
Custo Unitário (R\$ / Unidade de Medida): [0,00]
Percentual BDI: [0,00] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Planilha de Custos: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

[Salvar e Voltar] [Voltar]

Data: 06/06/2013 - 12:06:14 / Último acesso (06/06/2013) - Usuários On-Line SIMEC - Fale Conosco Manual | Tel.: 0,51796 / 4,88

Nesta tela “**Cadastro de Contrato**” deve-se inserir as informações sobre a contratação.



Cadastro de Contrato
Indica Campo Obrigatório.
Contratação de Obra
(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica
Licitação: 123 - Concomitância
Empresa Contratada: **Pesquisar**
Data de Assinatura do Contrato:
Prazo de Vigência do Contrato (dias):
Data de término do contrato:
Valor do Contrato(R\$):
Percentual BDI: (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: Nenhum arquivo selecionado.

Obras


[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra: 1000015 - Obra teste - 003
Data da Ordem de Serviço:
Início da Execução:
Prazo de Execução (dias):
Término da Execução:
Ordem de Serviço: Nenhum arquivo selecionado.

Valor Contratado (R\$):
Área/Quantidade a ser Construída: Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$: (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI: (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Planilha de Custos: Nenhum arquivo selecionado.

Data: 06/06/2013 - 12:06:14 / Último acesso (06/06/2013) - Usuários On-Line SIMEC - Fale Conosco Manual | Tel.: 011796 / 4.88

Deve-se:
1 – Clicar em “PESQUISAR” para cadastrar a empresa contratada.

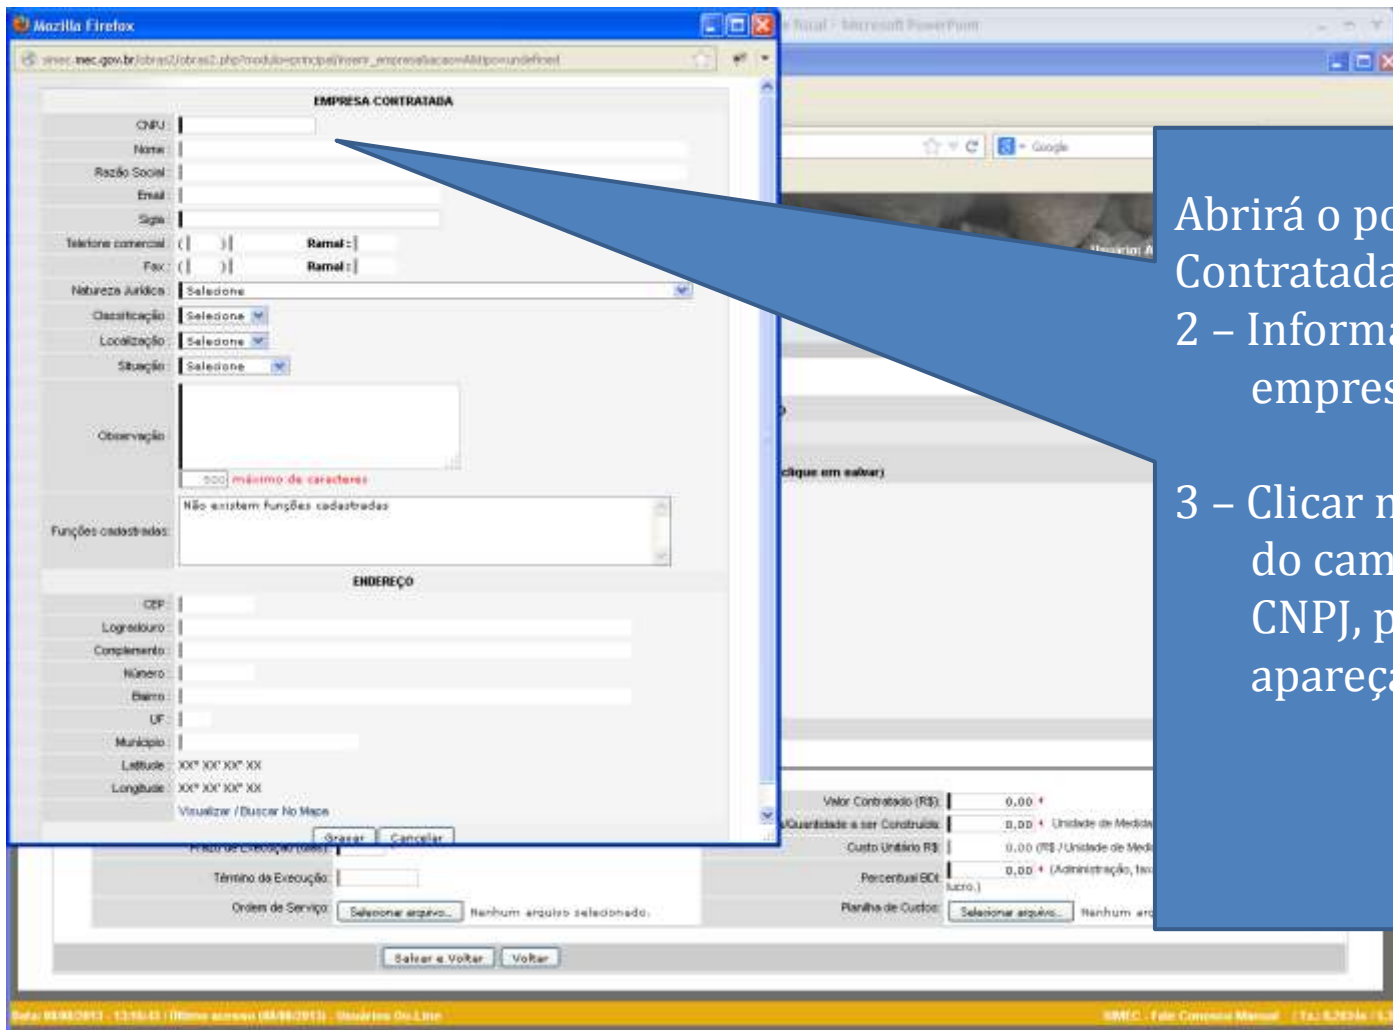

EMPRESA CONTRATADA

CNPJ:

Nome:

Razão Social:

Email:

Sigla:

Telefone comercial: () Ramal:

Fax: () Ramal:

Número Jurídico: Seleção

Classificação: Seleção

Localização: Seleção

Situação: Seleção

Observação:

Funções cadastradas:

ENDEREÇO

CEP:

Logradouro:

Complemento:

Número:

Bairro:

UF:

Município:

Latitude:

Longitude:


Visualizar / Buscar no Mapa

Salvar e Voltar Voltar

Abrirá o pop up de Empresa Contratada onde deve-se:

- 2 – Informar o CNPJ da empresa;

- 3 – Clicar na tela da janela, fora do campo de informação do CNPJ, para que os dados apareçam;

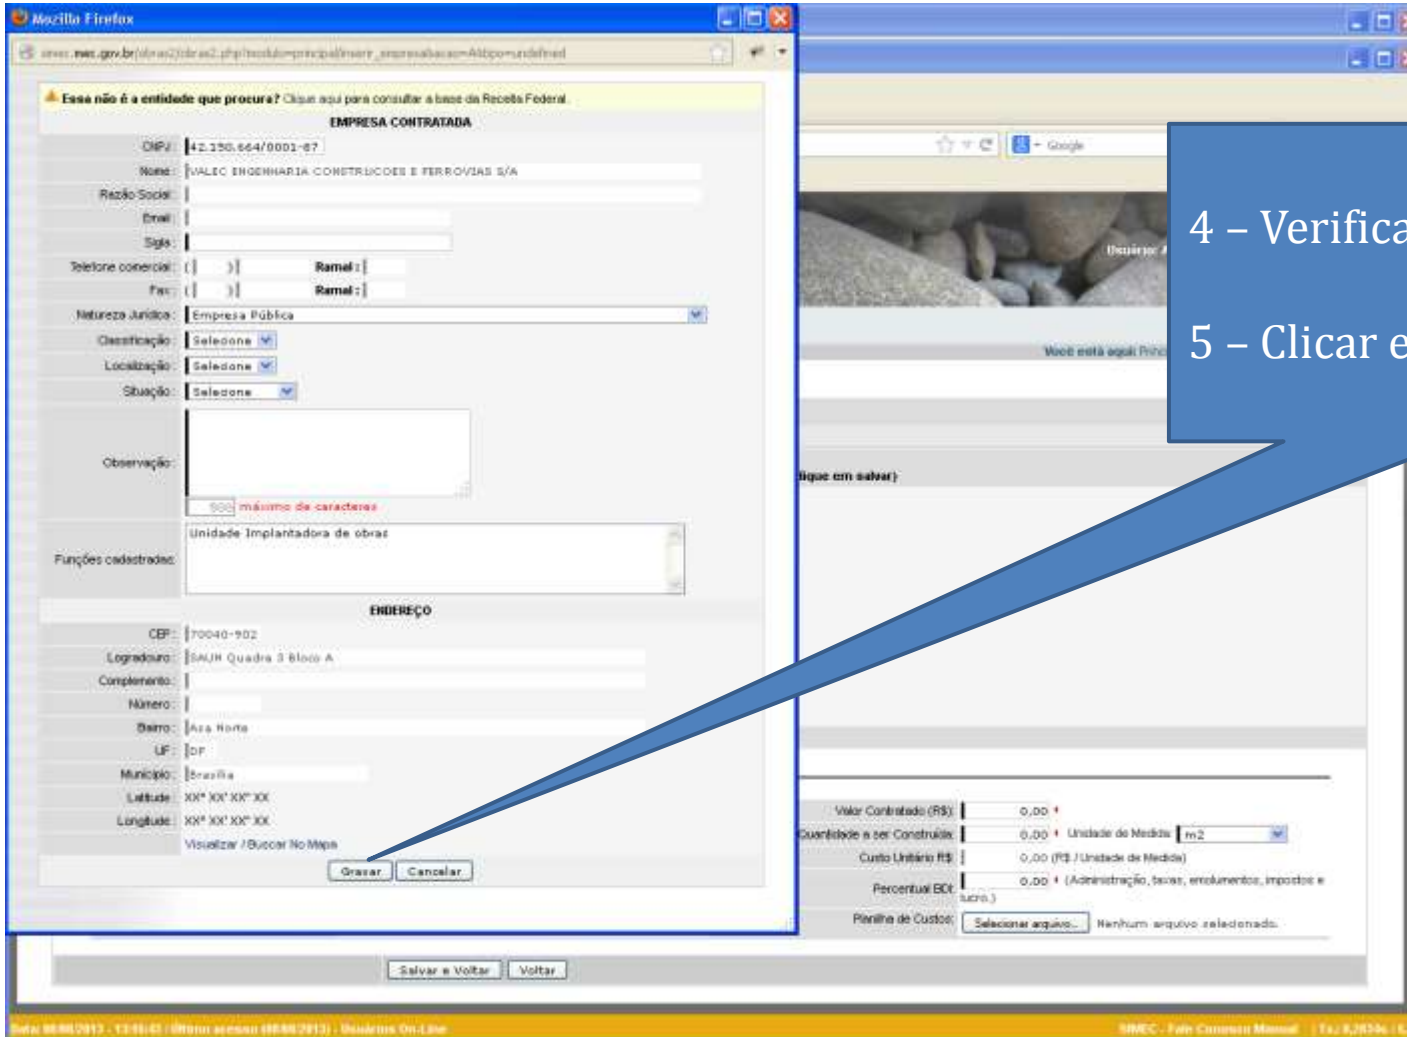

4 - Verificar as informações;
5 - Clicar em “Gravar”;

Cadastro de Contrato

Indica Campo Obrigatório.

Contratação da Obra (Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica

Licitação: 123 - Concorrência

Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A

Data de Assinatura do Contrato:

Prazo de Vigência do Contrato (dias):

Data de término do contrato:

Valor do Contrato(R\$):

Percentual BDI: (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Contrato Digitalizado: Nenhum arquivo selecionado.

Obra(s)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra: 1000015 - Obra teste - 003

Data da Ordem de Serviço:

Início da Execução:

Prazo de Execução (dias):

Término da Execução:

Ordem de Serviço: Nenhum arquivo selecionado.

Valor Contratado (R\$):

Área/Quantidade a ser Construída: Unidade de Medida: m2

Custo Unitário R\$: (R\$ / Unidade de Medida)

Percentual BDI: (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Planilha de Custos: Nenhum arquivo selecionado.

Observe as informações salvas
6 – Inserir as informações solicitadas;



Cadastro de Contrato
Indica Campo Obrigatório.

Contratação da Obra
(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica
Licitação: 123 - Concorrência
Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A [Pesquisar]
Data de Assinatura do Contrato: []
Prazo de Vigência do Contrato (dias): []
Data de término do contrato: []
Valor do Contrato(R\$): []
Percentual BDI: [] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Obra(s)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra:	1000015 - Obra teste - 003	Valor Contratado (R\$):	0,00
Data da Ordem de Serviço:	[]	Área/Quantidade a ser Construída:	0,00 Unidade de Medida: m2
Início da Execução:	[]	Custo Unitário R\$:	0,00 (R\$ / Unidade de Medida)
Prazo de Execução (dias):	[]	Percentual BDI:	0,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Término da Execução:	[]	Planilha de Custos:	[Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.
Ordem de Serviço:	[Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.		

[Salvar e Voltar] [Voltar]

Data: 08/08/2013 - 13:16:43 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx: 0,2834s / 5,38

7 - Inserir documentos digitalizados na extensão PDF;

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 51min26s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Você está aqui: Principal >> Contratação >> Cadastrar Contrato

Lista de Contratos | Cadastro de Contrato

Cadastro de Contrato

Indica Campo Obrigatório.

Contratação da Obra

(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica

Licitação: 123 - Concorrência

Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A [Pesquisar]

Data de Assinatura do Contrato: []

Prazo de Vigência do Contrato (dias): []

Data de término do contrato: []

Valor do Contrato(R\$): []

Percentual BDI: [] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Contrato Digitalizado: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Obra(s)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra: 1000015 - Obra teste - 003	Valor Contratado (R\$): 0,00
Data da Ordem de Serviço: []	Área/Quantidade a ser Construída: 0,00 Unidade de Medida: m2
Início da Execução: []	Custo Unitário R\$: 0,00 (R\$ / Unidade de Medida)
Prazo de Execução (dias): []	Percentual BDI: 0,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Término da Execução: []	Planilha de Custos: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.
Ordem de Serviço: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.	

[Salvar e Voltar] [Voltar]

Data: 08/08/2013 - 13:16:43 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx: 0,2834s / 5,38

8 - Inserir as informações solicitadas;



The screenshot displays the 'Cadastro de Contrato' (Contract Registration) form in the SIMEC Obras 2.0 system. The interface includes a navigation menu with 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The user is identified as 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' with a session expiration of 51 minutes. The breadcrumb trail shows 'Principal >> Contratação >> Cadastrar Contrato'. The form is titled 'Cadastro de Contrato' and includes a sub-section 'Contratação da Obra' with the instruction '(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)'. The form fields are as follows:

- Órgão: Educação Básica
- Licitação: 123 - Concorrência
- Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A
- Data de Assinatura do Contrato: []
- Prazo de Vigência do Contrato (dias): []
- Data de término do contrato: []
- Valor do Contrato(R\$): []
- Percentual BDI: [] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
- Contrato Digitalizado: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Below the main form is a section for linking works to the contract, titled 'Obra(s)'. It includes a table with the following data:

Obra	Data da Ordem de Serviço	Início da Execução	Prazo de Execução (dias)	Término da Execução	Ordem de Serviço	Valor Contratado (R\$)	Área/Quantidade a ser Construída	Custo Unitário R\$	Percentual BDI	Planilha de Custos
1000015 - Obra teste - 003	[]	[]	[]	[]	[Selecionar arquivo...]	0,00	0,00	0,00	0,00	[Selecionar arquivo...]

Buttons for 'Salvar e Voltar' and 'Voltar' are located at the bottom of the form. A blue callout box on the right side of the image contains the text: '9 - Inserir documentos digitalizados na extensão PDF;'. A blue arrow points from this callout box to the 'Selecionar arquivo...' button in the 'Contrato Digitalizado' field.

9 - Inserir documentos digitalizados na extensão PDF;

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. At the top, the logo and name 'SIMEC Obras 2.0' are visible. The user is identified as 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' with a session expiration of 51 minutes and 20 seconds. The main navigation menu includes 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The current page is 'Cadastro de Contrato', which is divided into two sections: 'Cadastro de Contrato' and 'Obra(s)'. The 'Cadastro de Contrato' section contains various input fields for contract details, including 'Órgão' (Education Basic), 'Licitação' (123 - Concorrência), 'Empresa Contratada' (VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A), 'Data de Assinatura do Contrato', 'Prazo de Vigência do Contrato (dias)', 'Data de término do contrato', 'Valor do Contrato (R\$)', 'Percentual BDI' (Administration, taxes, fees, and profit), and 'Contrato Digitalizado'. The 'Obra(s)' section is titled '[Vincular Obra(s) ao Contrato]' and includes fields for 'Obra' (1000015 - Obra teste - 003), 'Data da Ordem de Serviço', 'Início da Execução', 'Prazo de Execução (dias)', 'Término da Execução', 'Ordem de Serviço', 'Valor Contratado (R\$)', 'Área/Quantidade a ser Construída', 'Custo Unitário R\$', 'Percentual BDI', and 'Planilha de Custos'. At the bottom of the form, there are 'Salvar e Voltar' and 'Voltar' buttons. A blue callout box on the right side of the screen contains the text '10 - Inserir as informações solicitadas;'. The footer of the page shows the date '08/08/2013 - 13:16:43 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line', the manual reference 'SIMEC - Faça Conosco Manual | Tx: 0,2834s / 5,38', and the page number '71'.

10 - Inserir as informações solicitadas;



The screenshot displays the 'Cadastro de Contrato' (Contract Registration) form in the SIMEC Obras 2.0 system. The interface includes a navigation menu with 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The user is identified as 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' with a session expiration of 51 minutes. The breadcrumb trail shows 'Principal >> Contratação >> Cadastrar Contrato'. The form is titled 'Cadastro de Contrato' and includes a sub-section 'Contratação da Obra' with the instruction '(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)'. The form fields are as follows:

- Órgão: Educação Básica
- Licitação: 123 - Concorrência
- Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇOES E FERROVIAS S/A
- Data de Assinatura do Contrato: [input field]
- Prazo de Vigência do Contrato (dias): [input field]
- Data de término do contrato: [input field]
- Valor do Contrato(R\$): [input field]
- Percentual BDI: [input field] (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
- Contrato Digitalizado: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Below the main form is a section for linking works to the contract, titled '[Vincular Obra(s) ao Contrato]'. It shows a table with the following data:

Obra:	Valor Contratado (R\$):
1000015 - Obra teste - 003	0,00

Additional fields for the work include:

- Data da Ordem de Serviço: [input field]
- Início da Execução: [input field]
- Prazo de Execução (dias): [input field]
- Término da Execução: [input field]
- Ordem de Serviço: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.
- Área/Quantidade a ser Construída: 0,00
- Custo Unitário R\$: 0,00 (R\$ / Unidade de Medida)
- Percentual BDI: 0,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
- Planilha de Custos: [Selecionar arquivo...] Nenhum arquivo selecionado.

Buttons for 'Salvar e Voltar' and 'Voltar' are located at the bottom of the form.

11 – Inserir documentos digitalizados na extensão PDF;



Cadastro de Contrato

Indica Campo Obrigatório.

Contratação da Obra
(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica

Licitação: 123 - Concorrência

Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A

Data de Assinatura do Contrato: 05/08/2013

Prazo de Vigência do Contrato (dias): 250

Data de término do contrato: 12/04/2014

Valor do Contrato(R\$): 1.200.000,00

Percentual BDI: 22 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Contrato Digitalizado: Acordao10692011.PDF


Obra(s)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra	Data da Ordem de Serviço	Início da Execução	Prazo de Execução (dias)	Término da Execução	Ordem de Serviço	Valor Contratado (R\$)	Área/Quantidade a ser Construída	Custo Unitário R\$	Percentual BDI	Planilha de Custos
1000015 - Obra teste - 003	06/08/2013	07/08/2013	210	05/03/2014	<input type="button" value="Selecionar arquivo..."/> Acordao10692011.PDF	1.190.000,00	112,00 m2	10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)	22 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)	<input type="button" value="Selecionar arquivo..."/> Acordao10692011.PDF

Após a inserção das informações e dos documentos

12 – Clicar em “Salvar e Voltar”;



Após a realização da ação o sistema apresenta esta informação de “ Operação realizada com sucesso!”



Obras 2.0

Obras 2.0

- Principal
- Relatórios
- Sistema
- Sair

Informações e documentos salvos

- Dados da Obra
- Licitação
- Contratação**
- Cronograma
- Vistorias
- Recursos
- Documentos
- Galeria de Fotos
- Execução

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasilia - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Contratação

Licitação: 123 - Concorrência
Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
Data de Assinatura do Contrato: 05/08/2013
Prazo de Vigência do Contrato (dias): 250
Data de término do contrato: 12/04/2014
Valor do Contrato (R\$): 1.200.000,00
Valor Previsto da Obra (R\$): 1.500.000,00
Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: Acordao10692011.PDF

- estado atual
- Contratação**
- ações
- Enviar para execução
- histórico

Vínculo da obra no contrato

Obra: 1000015 - Obra teste - 003	
Data da Ordem de Serviço:	06/08/2013
Início da Execução:	07/08/2013
Prazo de Execução (dias):	210
Término da Execução:	05/03/2014
Ordem de Serviço:	Acordao10692011.PDF
Valor Contratado (R\$):	1.190.000,00
Área/Quantidade a ser Construída:	112,00 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$:	10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI:	22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Planilha de Custos:	Acordao10692011.PDF

Editar Contrato



SiMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 59min36s

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | **Contratação** | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Licitação: 123 - Concorrência
Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIA
Data de Assinatura do Contrato: 05/08/2013
Prazo de Vigência do Contrato (dias): 250
Data de término do contrato: 12/04/2014
Valor do Contrato (R\$): 1.200.000,00
Valor Previsto da Obra (R\$): 1.500.000,00
Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: Acordao10692011.PDF

Vínculo da obra no contrato

Obra: 1000015 - Obra teste - 003	Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00
Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013	Área/Quantidade a ser Construída: 112.00 Unidade de Medida: m2
Início da Execução: 07/08/2013	Custo Unitário R\$: 10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)
Prazo de Execução (dias): 210	Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Término da Execução: 05/03/2014	Planilha de Custos: Acordao10692011.PDF
Ordem de Serviço: Acordao10692011.PDF	

Editar Contrato

Clicar no botão "Editar Contrato" caso seja necessária alteração nas informações

Contratação ações
Enviar para execução
histórico

Data: 08/08/2013 - 15:33:49 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,2934s / 9,94



77

Próximo passo é preencher a
aba **Cronograma**

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasilia - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Contratação

Licitação:	123 - Concorrência	estado atual Contratação ações Enviar para execução histórico
Empresa Contratada:	VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	
Data de Assinatura do Contrato:	05/08/2013	
Prazo de Vigência do Contrato (dias):	250	
Data de término do contrato:	12/04/2014	
Valor do Contrato (R\$):	1.200.000,00	
Valor Previsto da Obra (R\$):	1.500.000,00	
Percentual BDI:	22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)	
Contrato Digitalizado:	Acordao10692011.PDF	

Vínculo da obra no contrato

Obra: 1000015 - Obra teste - 003	
Data da Ordem de Serviço:	06/08/2013
Início da Execução:	07/08/2013
Prazo de Execução (dias):	210
Término da Execução:	05/03/2014
Ordem de Serviço:	Acordao10692011.PDF
Valor Contratado (R\$):	1.190.000,00
Área/Quantidade a ser Construída:	112.00 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$:	10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)
Percentual BDI:	22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
Planilha de Custos:	Acordao10692011.PDF

Editar Contrato

CRONOGRAMA

Cronograma Físico-Financeiro
Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição	Início da Execução	Término da Execução	Valor (R\$)
Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A	07/08/2013	05/03/2014	1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
Total					0,00	0,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					1.190.000,00	100,00 %

Botões: Inserir Etapa, Salvar, Voltar

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO:

Esta tela deve apresentar todos os serviços contratados para a execução da obra, reproduzindo a planilha de serviços vencedora do certame presente no contrato firmado entre a Prefeitura e a construtora

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 54min13s

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | **Cronograma** | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Cronograma Físico-Financeiro
Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição	Início da Execução	Término da Execução	Valor (R\$)
Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A	07/06/2013	05/03/2014	1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura	estado atual	
Total							0,00	0,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %		
Valor Restante					1.190.000,00			

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Aba Cronograma

1. Preencher o Cronograma com as informações da planilha de serviços contratada.

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 54min13s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | **Cronograma** | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Cronograma Físico-Financeiro
Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.
O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição	Início da Execução	Término da Execução	Valor (R\$)
Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A	07/08/2013	05/03/2014	1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra


Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a	estado atual
					Total		
					Valor do Contrato	1.190	

[+ Inserir Etapa](#)

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS...

Data: 08/08/2013 - 15:48:44 / Último acesso (08/08/2013) - Usuários On-Line

2. Clicar em “**Inserir Etapa**” para que sejam inseridas todas as etapas contratadas

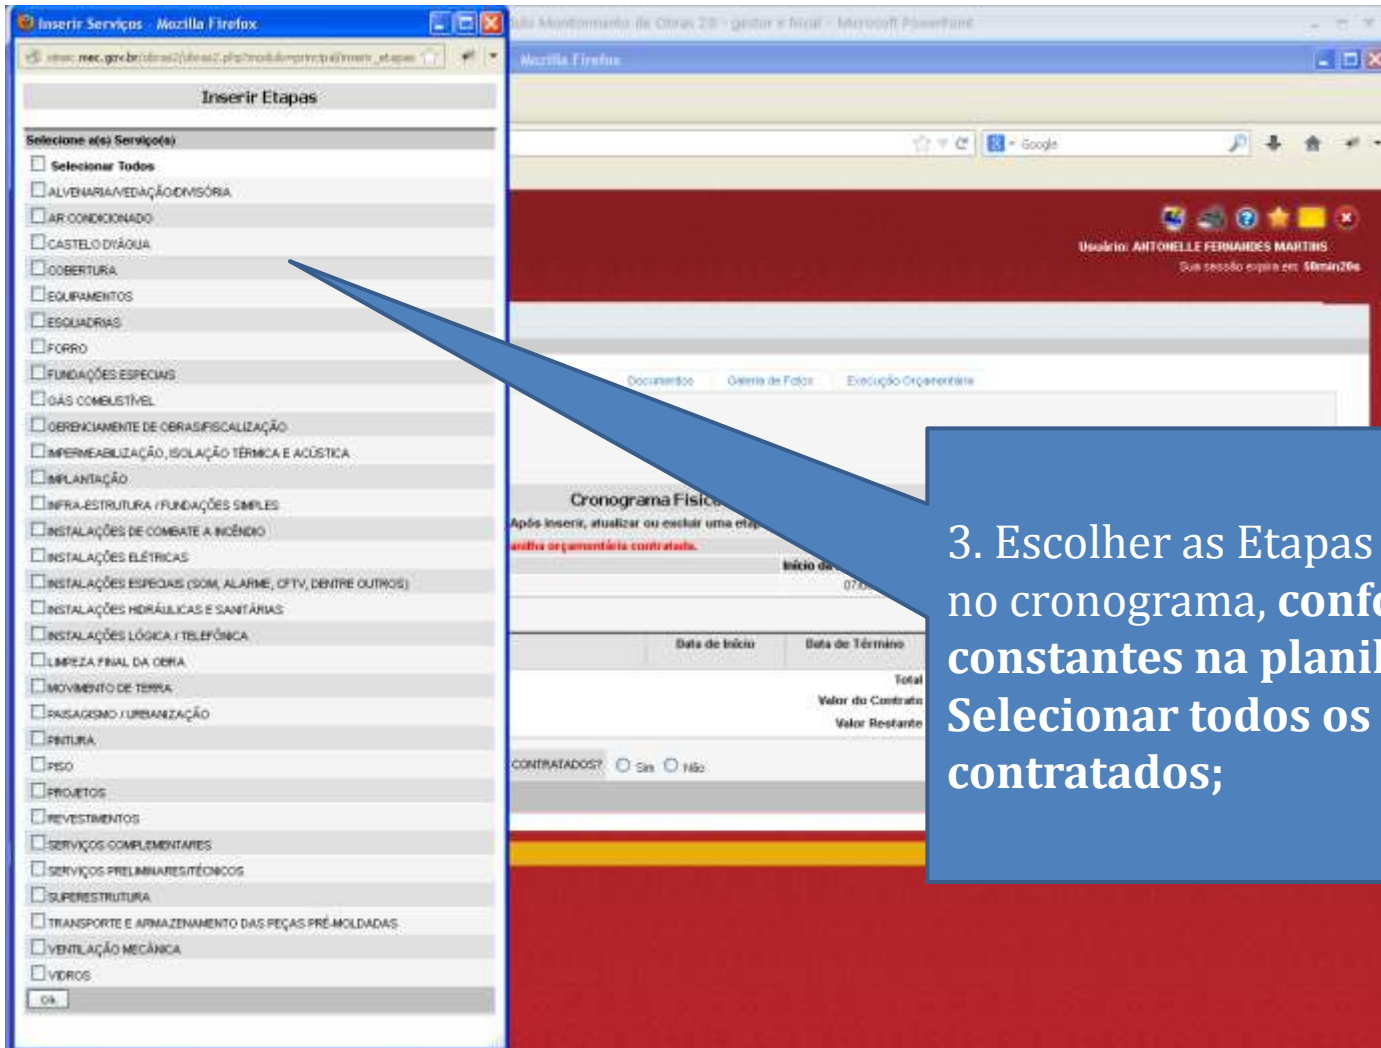



5. Preencher as informações solicitadas, conforme cronograma contratado;

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Cronograma Físico-Financeiro

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
Contrato: VALEC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
1	M	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS			0,00	0,00 %
2	M	MOVIMENTO DE TERRA			0,00	0,00 %
3	M	SUPERESTRUTURA			0,00	0,00 %
4	M	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DEVISÓRIA			0,00	0,00 %
5	M	FORRO			0,00	0,00 %
6	M	COBERTURA			0,00	0,00 %
7	M	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS			0,00	0,00 %
8	M	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS			0,00	0,00 %
9	M	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA			0,00	0,00 %
10	M	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)			0,00	0,00 %
11	M	REVESTIMENTOS			0,00	0,00 %
12	M	PISO			0,00	0,00 %
13	M	PINTURA			0,00	0,00 %
14	M	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA			0,00	0,00 %
15	M	ESQUADRIAS			0,00	0,00 %
16	M	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO			0,00	0,00 %
17	M	CASTELO D'ÁGUA			0,00	0,00 %
18	M	AIR-CONDICIONADO			0,00	0,00 %
19	M	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO			0,00	0,00 %
20	M	LIMPREZA FINAL DA OBRA			0,00	0,00 %
Total					0,00	0,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					1.190.000,00	100,00 %

TODO OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FACULTADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec CRONOGRAMA

85

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
Contrator: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCCES E FERROVIAS S/A

Início da Execução: 07/08/2013
Término da Execução: 05/03/2014

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura	
		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %	
		MOVIMENTO DE TERRA	31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %	
		INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %	
		SUPERESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %	
		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %	
		FORRO	31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %	
		COBERTURA	02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %	
		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %	
		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %	
		INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %	
		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %	
		REVESTIMENTOS	05/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %	
		PSO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %	
		PINTURA	02/02/2014	24/02/2014	120.000,00	10,08 %	
		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %	
		ESQUADRIAS	03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %	
		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %	
		CASTELHO D'ÁGUA	10/09/2013	10/10/2013	60.000,00	5,04 %	
		AR CONDICIONADO	03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %	
		PASSAGISMO / URBANIZAÇÃO	01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %	
		LMPEZA FINAL DA OBRA	01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %	
					Total	1.190.000,00	100,00 %
					Valor do Contrato	1.190.000,00	100,00 %
					Valor Restante	0,00	0,00 %

TOCOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

6. Garantir que ao final do preenchimento os valores informados resultem em 100% dos serviços contratados. Devendo o “Total” do valor distribuído ser igual valor ao “Valor do Contrato” e o “Valor Restante” igual a zero.

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec CRONOGRAMA

86

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
 Contratador: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCCES E FERROVIAS S/A
 Início da Execução: 07/08/2013
 Término da Execução: 05/03/2014
 Valor (R\$):

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
1		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %
2		MOVIMENTO DE TERRA	31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %
3		INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %
4		SUPERESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %
5		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %
6		FORRO	31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %
7		COBERTURA	02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
10		INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %
11		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
12		REVESTIMENTOS	05/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %
13		PISO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14		PINTURA	02/02/2014	24/02/2014	100.000,00	10,00 %
15		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
16		ESQUADRIAS	03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %
17		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
18		CASTELO D'ÁGUA	10/09/2013	10/12/2013	60.000,00	5,04 %
19		AR CONDICIONADO	03/11/2013	07/12/2013	70.000,00	5,89 %
20		PASSAGISMO / URBANIZAÇÃO	01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %
21		LMPEZA FINAL DA OBRA	01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

TOCOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA PACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

7. Responder à pergunta.



Principal | Relatórios | Sistema | Sair

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
 Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
 Início da Execução: 07/08/2013 | Término da Execução: 05/03/2014 | Valor (R\$): 1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura	
1		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %	
2		MÓVIMENTO DE TERRA	31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %	
3		INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %	
4		SUPERESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %	
5		ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,83 %	
6		FORRO	31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %	
7		COBERTURA	02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %	
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %	
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %	
10		INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %	
11		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %	
12		REVESTIMENTOS	09/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %	
13		PISO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %	
14		PINTURA	02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,08 %	
15		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	02/03/2014	120.000,00	10,08 %	
16		ESQUADRIAS	03/12/2013	03/01/2014	15.000,00	1,26 %	
17		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %	
18		CASTELÓ D'ÁGUA	10/09/2013	01/03/2014	60.000,00	5,04 %	
19		AIR CONDICIONADO	03/11/2013	01/03/2014	70.000,00	5,88 %	
20		PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	01/03/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %	
21		LIMPEZA FINAL DA OBRA	03/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %	
					Total	1.190.000,00	100,00 %
					Valor do Contrato	1.190.000,00	100,00 %
					Valor Restante	0,00	0,00 %

Insere Etapa


TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPEM A PLANILHA CONTRATADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar Voltar

Data: 08/08/2013 - 15:00:41 / Obra: sistema (08/08/2013) - Usuário: Ge.Lima

SiMEC - Não Concessa Manual - Tel: 8,1716x / 5,51

8. Clicar em "Salvar" após total e correto preenchimento do Cronograma.



Retorno do sistema
quando a operação é
realizada com
sucesso



Mais votados
 Privilegiados
 Últimas notícias

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
 Contrato: VALBC ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
 Início da Execução: 07/08/2013
 Término da Execução: 05/03/2014
 Valor (R\$): 1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente a Estrutura
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %
2	MOVIMENTO DE TERRA		31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %
3	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÕES SIMPLES)		30/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %
4	SUPERESTRUTURA		02/09/2013	02/11/2013	60.000,00	5,04 %
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DEMISÓRIA		24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %
6	FORRO		31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %
7	COBERTURA		02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
10	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA		28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)		28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
12	REVESTIMENTOS		05/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %
13	RISO		09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14	PINTURA		02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,08 %
15	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
16	ESQUADRIAS		03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
18	CASTELO D'ÁGUA		10/09/2013	10/10/2013	60.000,00	5,04 %
19	AIR-CONDICIONADO		03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		01/02/2014	01/02/2014	40.000,00	3,36 %
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA		01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FICLIADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Workflow

Clicar em “Enviar para execução”, no Workflow, para que a obra passe para a situação de “Em Execução”



Tela para confirmação da ação

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição
Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Início de Execução
07/06/2013

Lista das Etapas do Cronograma

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item	Porcentagem em relação a Estrutura
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		07/06/2013	31/08/2013	3.36	3.36 %
2	MOVIMENTO DE TERRA		21/08/2013	19/09/2013	1.28	1.28 %
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		20/09/2013	20/09/2013	2.52	2.52 %
4	SUB-ESTRUTURA		20/09/2013	20/09/2013	60.000,00	5.04 %
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA		20/09/2013	20/09/2013	200.000,00	16.67 %
6	FORMO		20/09/2013	20/09/2013	80.000,00	6.67 %
7	COBERTURA		20/09/2013	20/09/2013	80.000,00	6.67 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		20/09/2013	20/09/2013	40.000,00	3.33 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3.33 %
10	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA		28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2.08 %
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, OPTV, DENTRE OUTROS)		28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1.25 %
12	REVESTIMENTOS		09/11/2013	18/12/2013	25.000,00	2.08 %
13	PISO		09/01/2014	01/02/2014	80.000,00	6.67 %
14	PIXTURA		02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10.00 %
15	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		18/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5.00 %
16	ESQUADRIAS		03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6.67 %
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2.92 %
18	CASTELO D'ÁGUA		10/09/2013	18/10/2013	40.000,00	3.33 %
19	AR CONDICIONADO		03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5.83 %
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		01/01/2014	01/03/2014	45.000,00	3.75 %
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA		01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2.92 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

Salvar | Voltar

TOODS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA ORÇAMENTÁRIA CONTRATADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Data: 09/03/2014 - Usuário: TUBIANA ASSIS (ESP/2013) - Unidade: DN/Line

SiMEC - Para Consultar: 0800-701111 | Tel: 011-2106-1421



Tela de confirmação da ação

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. A modal dialog box is centered on the screen, containing the text "Estado alterado com sucesso!" and a checkbox labeled "Desejo paralisar a confirmação desta página?". Below the checkbox is an "OK" button. The background shows a table with project activities and their progress.

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Realização a Substituir
04	SE	SERVIÇOS PRELIMINARES	07/08/2013	11/08/2013	40.000,00	3,34 %
04	SE	REMOÇÃO DE TERRA	11/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,24 %
04	SE	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLIS	10/08/2013	10/08/2013	30.000,00	2,51 %
04	SE	SUBESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	40.000,00	3,04 %
04	SE	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	09/10/2013	09/11/2013	200.000,00	14,41 %
04	SE	FORNO	11/10/2013	11/01/2014	40.000,00	3,04 %
04	SE	COBERTURA	02/01/2014	11/03/2014	40.000,00	4,72 %
04	SE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	20/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,34 %
04	SE	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	10/08/2013	24/10/2013	40.000,00	3,34 %
04	SE	INSTALAÇÕES LÓGICA TELEFÔNICA	20/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,13 %
04	SE	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, ENTRE OUTROS)	08/10/2013	11/11/2013	15.000,00	1,24 %
04	SE	REVESTIMENTOS	09/11/2013	10/12/2013	20.000,00	2,10 %
04	SE	PESO	09/01/2014	01/02/2014	40.000,00	3,04 %
04	SE	ENTRADA	02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	13,40 %
04	SE	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/08/2013	02/09/2014	40.000,00	3,04 %
04	SE	ESQUADRIAS	09/12/2013	09/01/2014	40.000,00	4,72 %
04	SE	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	25.000,00	2,34 %



Principal Relatórios Sistema Sair

UNDE (11000013) Unidade - 003

Cronograma Físico-Financeiro

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição: Contrato VALEC ENGENHARIA

Descrição	Término da Execução	Valor (R\$)
13	05/03/2014	1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Valor (R\$)	%		
1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, OPTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26 %		
2	REVESTIMENTOS	30.000,00	2,52 %		
3	PISO	60.000,00	5,04 %		
4	PLUMBAGEM	200.000,00	16,81 %		
5	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	60.000,00	5,04 %		
6	ESQUADRIAS	80.000,00	6,72 %		
7	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	40.000,00	3,36 %		
8	CASTELO D'ÁGUA	40.000,00	3,36 %		
9	AR CONDICIONADO	25.000,00	2,10 %		
10	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	15.000,00	1,26 %		
11	REVESTIMENTOS	05/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %
12	PISO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
13	PLUMBAGEM	02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,00 %
14	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
15	ESQUADRIAS	03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %
16	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
17	CASTELO D'ÁGUA	10/09/2013	10/10/2013	60.000,00	5,04 %
18	AR CONDICIONADO	03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %
19	REVESTIMENTO DE PAREDES E TETO	01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %
20	LANFEZA FINAL DA OBRA	01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total		1.190.000,00	100,00 %		
Valor do Contrato		1.190.000,00	100,00 %		
Valor Restante		0,00	0,00 %		

status atual
Execução
agora
nenhuma ação disponível para o documento
Atualizar


WORKFLOW:
Observe que a situação atual da obra passou para Execução

Inserir Etapa

TOCOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA FACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar Voltar

VISTORIA

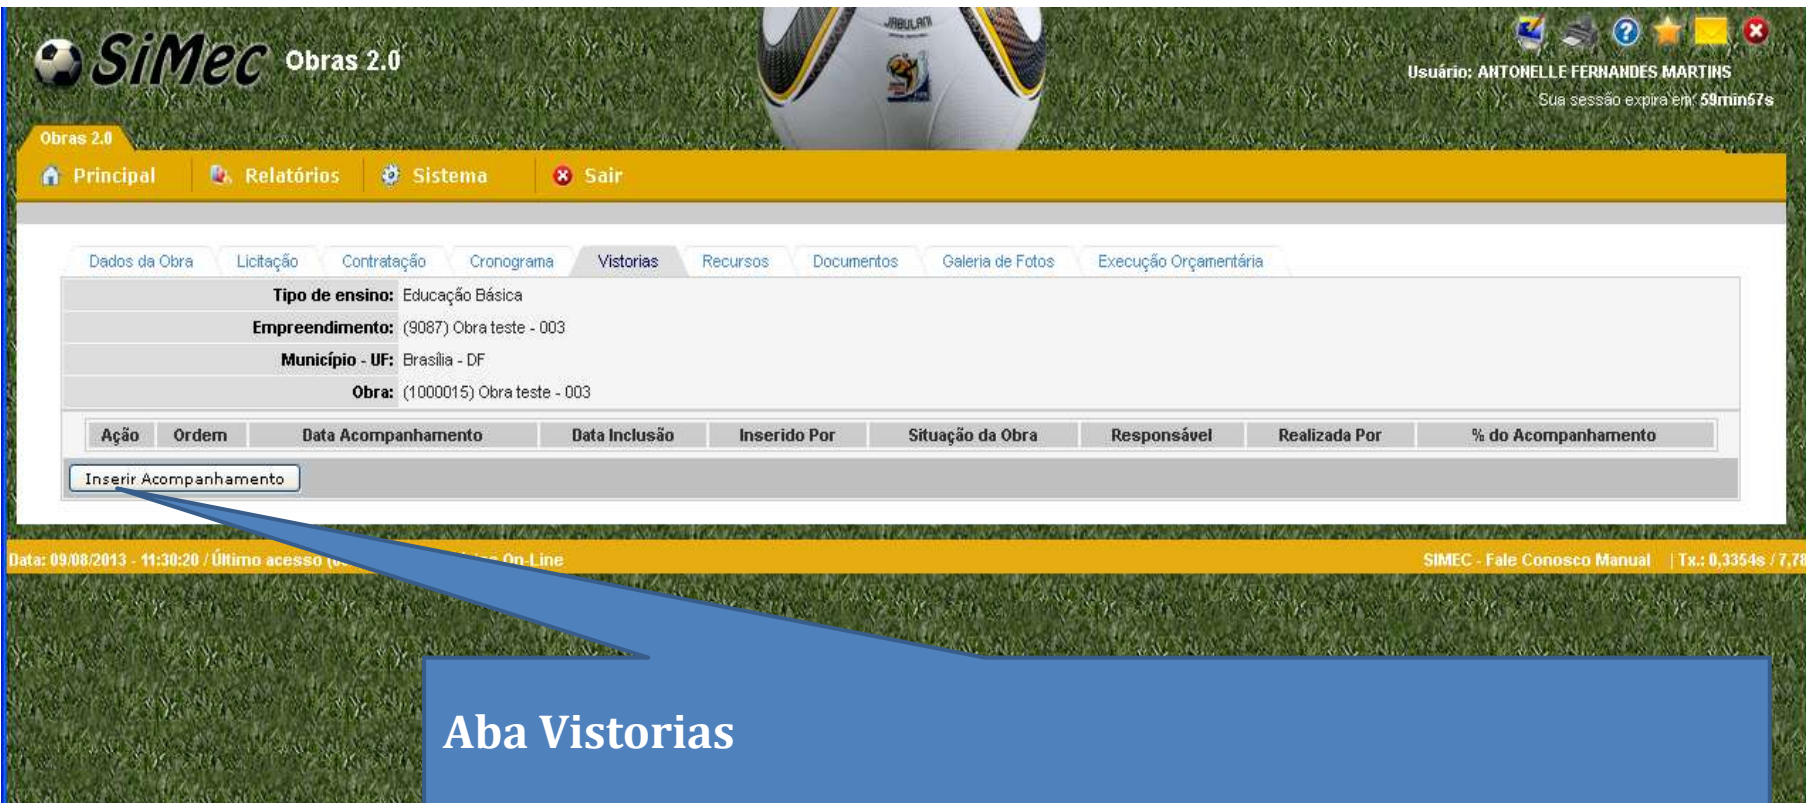

SiMEc Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 59min67s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma **Vistorias** Recursos Documentos Galeria de Fotos Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Ação	Ordem	Data Acompanhamento	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Responsável	Realizada Por	% do Acompanhamento
<input type="button" value="Inserir Acompanhamento"/>								

Data: 09/08/2013 - 11:30:20 / Último acesso via On-Line SIMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,3354s / 7,78

Aba Vistorias

1. Clicar em “**Inserir Acompanhamento**” para iniciar a inserção de vistorias periódicas;

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



95

ABA VISTORIA

The screenshot shows the SIMEC VISTORIA module interface. At the top, there are navigation menus for 'Menu', 'Soluções', 'Ajuda', and 'Sair'. The main area is titled 'Vistoria' and contains a table with the following columns: 'Código', 'Descrição', 'Quantidade', 'Unidade', 'Valor Unitário', 'Valor Total', 'Valor Estimado', 'Valor Realizado', 'Valor Liquidado', 'Valor Recebido', 'Valor em Aberto', 'Valor em Recebimento', 'Valor em Pagamento', 'Valor em Cancelamento', 'Valor em Suspensão', 'Valor em Retenção', 'Valor em Garantia', 'Valor em Caução', 'Valor em Seguro', 'Valor em Taxas', 'Valor em Impostos', 'Valor em Encargos', 'Valor em Juros', 'Valor em Multas', 'Valor em Penalidades', 'Valor em Sanções', 'Valor em Apreensões', 'Valor em Sequestros', 'Valor em Embargos', 'Valor em Arrestos', 'Valor em Interdições', 'Valor em Proibições', 'Valor em Injunções', 'Valor em Responsabilizações', 'Valor em Indenizações', 'Valor em Reparações', 'Valor em Restituições', 'Valor em Restituições com Juros', 'Valor em Restituições sem Juros', 'Valor em Restituições com Custos', 'Valor em Restituições sem Custos', 'Valor em Restituições com Encargos', 'Valor em Restituições sem Encargos', 'Valor em Restituições com Juros e Encargos', 'Valor em Restituições sem Juros e Encargos', 'Valor em Restituições com Juros e Encargos e Custos', 'Valor em Restituições sem Juros e Encargos e Custos'.



Inserir Vistoria
Acompanhamento da Obra

Dados de Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra)

Data de Acompanhamento:
 Data Prevista de Conclusão:
 Nome do Responsável:
 Situação:

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FUNDADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual			Diferença para a Supervisão anterior		
							(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado	(%) Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,38	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,28	-	-	21/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	60.000,00	5,04	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA/VEDAÇÃO /VISIÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRÃO	60.000,00	5,04	-	-	21/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	03/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,38	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,38	-	-	26/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	18.000,00	1,50	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	28.000,00	2,35	-	-	06/11/2013	30/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	6,74	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Inserir as informações solicitadas;



Inserir Vistoria
Acompanhamento da Obra

Dados do Acompanhamento (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra)

Data do Acompanhamento:
 Data Prevista de Conclusão:
 Nome do Responsável: **Pesquisar**
 Situação:


TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FUNDADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Detalhamento de Suspensão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	(%) Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual			Diferença para a Supervisão anterior		
							(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado	(%) Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS	40.000,00	3,38	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,28	-	-	21/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	60.000,00	5,04	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA/VEDAÇÃO DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRÃO	60.000,00	5,04	-	-	21/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	03/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,38	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,38	-	-	26/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	18.000,00	1,50	-	-	26/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	28.000,00	2,35	-	-	06/11/2013	30/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	6,73	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2. Pesquisar o “Nome do Responsável” técnico responsável pelo acompanhamento da obra (engenheiro/arquiteto);

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA

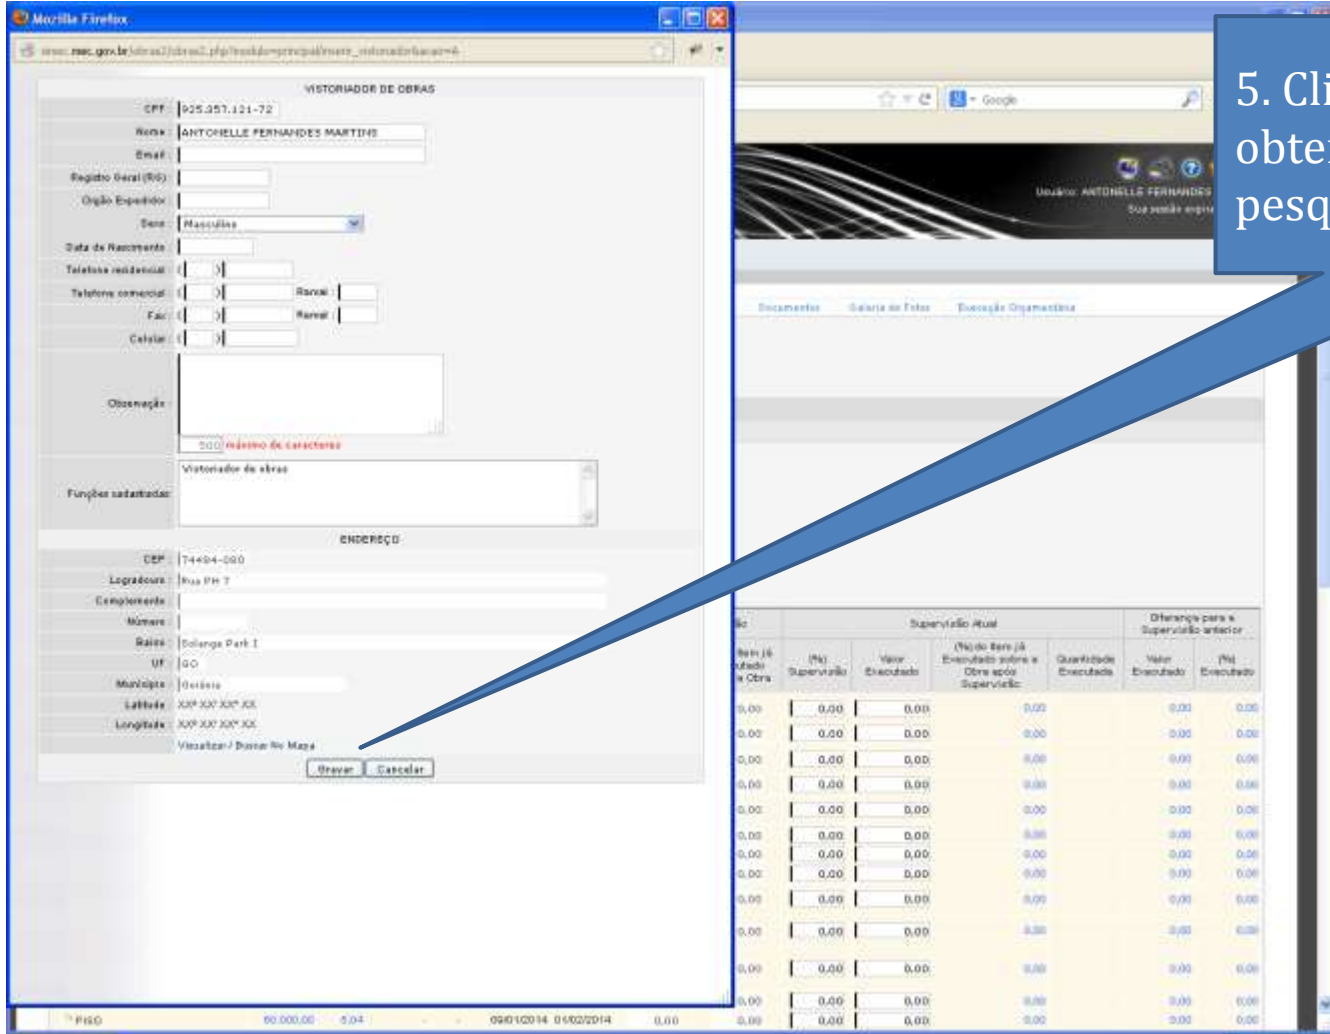

5. Clicar em "Salvar" após obter o resultado da pesquisa;

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



100

SiMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERREIRA
Sua sessão

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Liberação | Contratação | Cronograma | Vistorias | **Inserir Vistoria** | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (0087) Obra feita - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra feita - 003

Inserir Vistoria

Acompanhamento da Obra

Dados de Acompanhamento (Ver Gráfico de Execução da Execução da Obra)

Data do Acompanhamento: 05/08/2013
Data Prevista de Conclusão: 06/08/2013
Nome da Responsável: ANTONELLE FERNANDES MARTINS **Pesquisar**
Situação: Selecione...

TCOS OS SERVIÇOS QUE COMPEM A PLANILHA PACTUADA COM O TNEE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Detalhamento de Supervisões e Acompanhamentos

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Obras Supervisão		Supervisão Atual		Diferença para a Supervisão anterior		
							(%) de Item já Executado	(%) de Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,38	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,26	-	-	31/08/2013	10/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	60.000,00	5,04	-	-	03/09/2013	01/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA/VEGETAÇÃO /BARRIÓRA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	20/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO	60.000,00	5,04	-	-	31/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/11/2013	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,38	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,38	-	-	28/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (BOM, ALARME, CFV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	-	05/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	6,72	-	-	06/12/2013	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informações salvas



The screenshot shows the 'Inserir Vistoria' (Insert Inspection) form in the SiMEC Obras 2.0 system. The form includes fields for 'Data do Acompanhamento' (05/08/2013), 'Data Prevista de Conclusão' (06/08/2013), and 'Nome do Responsável' (ANTONELLE FERNANDES MARTINS). A dropdown menu for 'Situação' is open, showing options: 'Selecionar...', 'Concluído', 'Em Execução', and 'Paralisado'. Below the form is a table with columns for 'Descrição', 'Valor (R\$)', '(%) Sobre a Obra', 'Quantidade', 'Unidade de Medida', 'Data de Início', 'Data de Término', 'Última Supervisão', 'Supervisão Atual', and 'Diferença para a Supervisão anterior'.

Descrição	Valor (R\$)	(%) Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual			Diferença para a Supervisão anterior		
							(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado	(%) Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,38	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,28	-	-	21/08/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/08/2013	30/09/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPERESTRUTURA	60.000,00	5,04	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA/VEDAÇÃO /DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRÃO	60.000,00	5,04	-	-	21/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/10/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,38	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,38	-	-	26/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CCTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,28	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	28.000,00	2,10	-	-	05/11/2013	30/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	50.000,00	4,04	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6. Selecionar a “Situação da Obra”;
(Informar a situação em que se encontra a obra à data da vistoria)

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



Principal Relatórios Sair

Detalhamento da Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual		Data
							(%) do Rem. já Executado	(%) do Rem. já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,38	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	10,00	4.000,00	
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,28	-	-	31/08/2013	10/09/2013	0,00	0,00	10,00	1.500,00	0,13
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	5,00	1.500,00	0,13
SUPERESTRUTURA	80.000,00	6,04	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALVENARIA/VEDAÇÃO DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	34/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FORRO	80.000,00	6,04	-	-	31/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,38	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,38	-	-	28/08/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	16.000,00	1,38	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	-	05/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FISO	80.000,00	6,04	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	120.000,00	10,08	-	-	02/02/2014	28/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO	80.000,00	6,04	-	-	10/09/2013	02/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	80.000,00	6,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	38.000,00	3,94	-	-	01/02/2014	15/02/2014				0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	80.000,00	6,04	-	-	10/09/2013	10/10/2013				0,00	0,00
AR CONDICIONADO	70.000,00	5,68	-	-	03/11/2013	08/12/2013				0,00	0,00
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,38	-	-	01/02/2014	01/03/2014				0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	36.000,00	2,94	-	-	01/03/2014	03/03/2014				0,00	0,00
Total	1.180.000,00	100,00								0,58	

Relatório Técnico de Acompanhamento

a. O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução.

b. A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obra (posicionados e atualizados), dentre outros.

c. Informações sobre o andamento de obra (coordenação, organização e segurança de Trabalho).

d. Ata das reuniões de acompanhamento da obra e a necessidade ou não de aditivos.

e. Comentários sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra.

f. Outros apontamentos.

BOOM! (Ícone de caracteres)

Foto do Acompanhamento *Após adicionar as fotos, clique no botão 'Salvar' para salvar as alterações.

Foto do Acompanhamento

7. Preencher com o percentual de serviços realizados na Vistoria Atual (O Valor Executado será calculado automaticamente);

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



O sistema apresentará o somatório do % dos itens executados

Principal Relatórios Sair

Detalhamento de Suprimentos e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	(% sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão			Supervisão Atual		
							(%) do Bem já Executado	(%) do Bem já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Bem já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,36	-	-	07/08/2013	31/08/2013	0,00	0,00	10,00	4.000,00	0,34	
MOVIMENTO DE TERRA	18.000,00	1,26	-	-	31/08/2013	10/09/2013	0,00	0,00	16,00	1.300,00	0,13	
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	0,00	0,00	5,00	1.300,00	0,13	
SUPERESTRUTURA	80.000,00	6,04	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALVENARIA/VEDAÇÃO	200.000,00	15,81	-	-	24/10/2013	20/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FERRÃO	80.000,00	6,04	-	-	21/10/2013	16/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	60.000,00	4,72	-	-	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,36	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,36	-	-	28/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECÍFICAS (BOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	-	05/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	6,04	-	-	09/10/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	120.000,00	9,08	-	-	02/02/2014	28/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO	80.000,00	6,04	-	-	10/09/2013	02/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	80.000,00	6,04	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	80.000,00	6,04	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	25.000,00	2,10	-	-	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	80.000,00	6,04	-	-	10/09/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR CONDICIONADO	70.000,00	5,66	-	-	09/11/2013	08/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAVIMENTAÇÃO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,36	-	-	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	35.000,00	2,94	-	-	01/03/2014	03/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.180.000,00	100,00									0,58	

Relatório Técnico de Acompanhamento

3000 caracteres

Botão de Acompanhamento *Após adicionar as fotos, clique no botão "Salvar" para confirmar as alterações.
Fotos do Acompanhamento



Principal	Relatórios	Sair								
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,33	28/09/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,28	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	05/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	60.000,00	5,04	06/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	120.000,00	10,08	02/02/2014	26/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	60.000,00	5,04	18/06/2013	02/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	60.000,00	5,04	09/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.000,00	2,94	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	60.000,00	5,04	10/09/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR CONDICIONADO	70.000,00	5,88	03/11/2013	06/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,38	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	35.000,00	2,94	01/03/2014	03/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00								0,00

8. Redigir as informações descritivas sobre a obra no “Relatório Técnico de Acompanhamento”

Relatório Técnico de Acompanhamento

- a. o nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
- b. a existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obra, etc.;
- c. todas as informações sobre o canteiro de obra;
- d. informações sobre a compatibilidade e conformidade da execução com os projetos pactuados;
- e. se atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
- f. todos os comentários sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da mesma;

- No relatório deverão constar informações pertinentes a execução da obra, tais como:
- a. O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
 - b. A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diário de obra (atualizado e atualizado), dentre outros;
 - c. Informações sobre o canteiro de obra (acomodação, organização e segurança de trabalho);
 - d. Atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
 - e. Comentários sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra;
 - f. Outros apontamentos.

Foto do Acompanhamento *Após adicionar as fotos, clique no botão "Salvar" para confirmar as alterações.
Foto do Acompanhamento



9. Clicar em “**Inserir Fotos**” para inserir fotografias que apresentem as imagens de todos os serviços informados como executados e/ou em execução, uma visão panorâmica de toda a obra e os demais detalhes que se façam necessários visualizar;

The screenshot displays a software interface for monitoring construction works. At the top, there is a table with columns for various data points, including dates and numerical values. Below the table, a form titled 'Relatório Técnico de Acompanhamento' is visible. This form contains several sections with instructions and input fields. A red box highlights a character limit of 4200. At the bottom of the form, there is a button labeled 'Inserir Fotos'.

Sistema	Valor	Data	Status	Outros
40.000,00	3,33	28/09/2013	21/12/2013	0,00
25.000,00	2,10	28/10/2013	21/12/2013	0,00
15.000,00	1,28	28/10/2013	21/12/2013	0,00
25.000,00	2,10	05/11/2013	10/12/2013	0,00
60.000,00	5,04	06/01/2014	01/02/2014	0,00
120.000,00	10,08	02/02/2014	26/02/2014	0,00
60.000,00	5,04	10/04/2013	02/03/2014	0,00
60.000,00	5,04	09/12/2013	03/01/2014	0,00
35.000,00	2,94	01/02/2014	15/02/2014	0,00
60.000,00	5,04	10/09/2013	10/10/2013	0,00
70.000,00	5,88	03/11/2013	06/12/2013	0,00
40.000,00	3,36	01/02/2014	01/03/2014	0,00
35.000,00	2,94	01/03/2014	03/03/2014	0,00
190.000,00	100,00			0,00

Relatório Técnico de Acompanhamento

a. o nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
b. a existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obra, etc.;
c. todas as informações sobre o canteiro de obra;
d. informações sobre a compatibilidade e conformidade da execução com os projetos pactuados;
e. se atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
f. todos os comentários sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da mesma.

4200 **máximo de caracteres**

No relatório deverão constar informações pertinentes a execução da obra, tais como:

a. O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
b. A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obra (preenchido e atualizado), dentre outros;
c. Informações sobre o canteiro de obra (acompanha, organização e segurança de trabalho);
d. Atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
e. Comentários sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra;
f. Outros apontamentos.

Inserir Fotos

10. Procurar os arquivos das fotografias;
(QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)

The screenshot shows the 'Inserir fotos' window in Mozilla Firefox. The URL is `simec.mec.gov.br/obras/2024/gerenciar_componente_foto_simple.php`. The interface has a form area with 'Anexar arquivos' and two 'Selecionar arquivo...' buttons, each followed by 'Nenhum arquivo selecionado.'. Below this is a 'Salvar' button. A table with multiple columns and rows of numerical values is visible. At the bottom, there is a 'Salvar' button and a 'Desinstalar fotos de acompanhamento' button.



The screenshot displays the 'Inserir fotos - Mozilla Firefox' window. On the left, a list of files is shown with 'Selecionar arquivo...' buttons next to each. The files include various photos of a school building, such as 'Cozinha5.jpg', 'Pátio.jpg', 'PATIO INTERNO - Bloco Pedagógico.jpg', and 'Sala - Divisórias-Creche I e II.jpg'. At the bottom of the window, there is a 'Enviar' button. In the background, a data table is visible with columns for numerical values. A blue callout box points to the interface with the text: 'Pode-se adicionar mais de dois arquivos simultaneamente (QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)'. The bottom of the screen shows the system tray with the date '06/08/2011' and the time '12:55:49'.


Pode-se adicionar mais de dois arquivos simultaneamente (QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)



The screenshot displays the 'Inserir fotos - Mozilla Firefox' window. On the left, a list of files is shown with 'Selecionar arquivo...' buttons next to each. The files include: Cozinha5.jpg, Cozinha+Conforme projeto.jpg, Pátio.jpg, Pátio2.jpg, Pátio2.jpg, Pátio - Jardim.jpg, PATIO INTERNO - Bloco Pedagógico.jpg, PATIO INTERNO - Relevo coberto 4.JPG, Pátio interno - Servidor.jpg, Porta com proteção inferior e barra de apoio (corameada).JPG, Portão entre o Pátio e o Bloco de Serviços.jpg, Quadro Síntico.jpg, Sala - Divisórias-Creche I conforme projeto.jpg, Sala - Divisórias-Creche I e II.jpg, SALA - PRÉ-ESCOLA - Quadro Negro.jpg, sala creche II - Flocosinhos.jpg, Sala da Creche I conforme projeto.jpg, sala da Creche II.jpg, Vista Frontal.jpg, Vista Frontal2.jpg, Nenhum arquivo selecionado., and Nenhum arquivo selecionado. At the bottom of the file list, there is a 'Enviar' button. On the right, a data table is visible with columns for numerical values. Below the table, there is a text area with instructions in Portuguese regarding work execution and document submission. A blue callout box points to the 'Enviar' button.

00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11					

11. Enviar os arquivos;



12. Inserir legendas em todas as fotos, identificando-as, localizando-as e apresentando o que elas representam ;
(QUANTIDADE MINIMA DE 20 FOTOGRAFIAS)

The screenshot displays the Simec Vistoria software interface. On the left, there is a vertical list of photo thumbnails, each with a legend field labeled 'Foto nº' and 'legendar a foto'. The legend fields are currently empty. Below the list is a button labeled 'Gravar observações'. On the right, there is a table with five columns of numerical values, all showing '0,00'. Below the table is a text area containing instructions for recording observations, such as 'Formações pertinentes à execução da obra, tais como: cronograma da obra e o número de ART de execução...'. At the bottom of the right pane, there is a button labeled 'Gravar observações'.

13. Clicar em “Gravar observações” para que a legenda seja salva;



The screenshot shows the Simec Vistoria web application interface. On the left, there is a list of photos to be uploaded, each with a 'legendar a foto' (caption photo) button. A modal dialog box is displayed in the center with the message 'Observações gravadas com sucesso.' (Observations saved successfully) and an 'OK' button. The background shows a grid of numerical data and a text area for descriptions. At the bottom, there is a 'Salvar observações' (Save observations) button and a status bar.

Após salvar as informações o sistema apresenta a tela

14. Clicar em OK



15. Clicar em "X" para fechar a tela;

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



113

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

SIMEC - Sistema Integrado de Monitorament...

www.mec.gov.br/desdeu2/index.php?module=principal&view_vistoria&acao=Atua&id=175793

Mais visitados | Primeiros passos | Últimas notícias

Principal | **Relatórios** | Sistema | Sair

REVENDEZILIZAÇÃO	50.000,00	5,04	-	-	10/05/2013	03/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	50.000,00	5,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	50.000,00	5,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.000,00	2,34	-	-	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	50.000,00	5,04	-	-	10/05/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIR CONDICIONADO	70.000,00	5,05	-	-	03/11/2013	08/2/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGEM / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,76	-	-	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	25.000,00	7,34	-	-	01/03/2014	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00						7,31				7,31		

Relatório Técnico do Acompanhamento

No relatório deverão constar informações pertinentes à execução da obra, tais como:

- O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
- A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos; especificações; memoriais; ART's; licenças; alvarás; caderno de encargos; diário de obras (preenchido e atualizado); entre outros;
- Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho);
- Atuação na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
- comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada trecho de obra;

4350 caracteres

Fotos do Acompanhamento - Arraste as imagens para a área de Fotos da Galeria para adicioná-las à galeria. Após adicioná-las, clique no botão "Salvar" para confirmar as alterações.

Fotos do Acompanhamento

Fotos da Galeria


Alterar Fotos | Salvar Fotos

Salvar | Voltar

Data: 03/09/2013 - 13:16:08 - 08000000000000000000 - Direitos On-Line

SIMEC - Foto Censura Mensal | Pg. 8,099 de 18

16. Salvar;



17. Clicar em "OK"

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec VISTORIA



SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação - Mozilla Firefox

SIMEC - Sistema Integrado de Monitorament...

www.mec.gov.br/.../simec2.php?mod=principal&view_vistoria&acao=Atua&id=175793

Mais visitados | Primeiros passos | Últimas notícias

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

REVENDEZINHAÇÃO	50.000,00	5,04	-	-	10/05/2013	03/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	50.000,00	5,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	50.000,00	5,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.000,00	2,34	-	-	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	50.000,00	5,04	-	-	10/05/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIR CONDICIONADO	70.000,00	5,05	-	-	03/11/2013	08/2/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGEM / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,76	-	-	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	25.000,00	7,34	-	-	01/03/2014	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00						7,31				7,31	

Relatório Técnico do Acompanhamento

No relatório deverão constar informações pertinentes a execução da obra, tais como:

- O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
- A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diário de obras (preenchido e atualizado); entre outros;
- Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho);
- Atuação na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
- comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada trecho de obra;

4350 caracteres

Fotos do Acompanhamento - Arraste as imagens para a área de "Fotos da Galeria" para adicioná-las à galeria. Após adicioná-las, clique no botão "Salvar" para confirmar as alterações.

Fotos do Acompanhamento

Fotos da Galeria

Alterar Fotos | Salvar Fotos

Salvar | Voltar

18. Clicar em "VOLTAR"



The screenshot shows the SIMEC Obras 2.0 web application interface. The user is logged in as ANTONELLE FERNANDES MARTINS. The 'Vistorias' tab is active, displaying a table with the following data:

Ação	Ordem	Data Acompanhamento	Data Inclusão	Inserido Por	Situação da Obra	Responsável	Realizada Por	% do Acompanhamento
	1	05/08/2013	09/08/2013	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	Em Execução	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	Instituição	0,59 %

Below the table is a button labeled 'Inserir Acompanhamento'. The interface also shows a status bar at the bottom with the date and time: 'Data: 09/09/2013 - 16:10:25 / Último acesso (09/08/2013) - Usuários On-Line' and 'SIMEC - Para Conhecer Manual | Tx.: 0,4883s / 7,96'.

A vistoria inserida aparecerá salva na tela

RECURSOS



Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 69min54s

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | **Recursos** | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Recursos da Obra

Tipo:
Fonte:

Data: 09/09/2013 - 16:14:06 / Último acesso (09/09/2013) - Usuários On-Line

1. Inserir as informações solicitadas;



SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Dia sessão expira em: 03/04/2014

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Recursos

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (0087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Recursos da Obra

Tipo	Fonte
Seleção...	
Seleção	
Convênio	
Descentralização	
Recursos Próprios	
Tesouro - Ação da UO	

Data: 00/05/2013 - 16:14:06 / Obra: 0000015 - Usuário: Di...
Data: 00/05/2013 - 16:14:06 / Obra: 0000015 - Usuário: Di...

2. Selecionar o tipo de recurso;



SiMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 59min53s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | **Recursos** | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Recursos da Obra

Tipo:

Fonte:

Convênio

Número do Convênio	<input type="text"/>	Obras com o mesmo convênio
Ano	<input type="text"/>	
Processo	<input type="text"/>	
Concedente	<input type="text" value="0,00"/>	
Conveniente	<input type="text" value="0,00"/>	
Valor R\$	<input type="text" value="0,00"/>	
Início	<input type="text"/>	
Fim	<input type="text"/>	

Saldos Bancários

Repasses

3. Selecionar a fonte;

Data: 12/08/2013 - 10:38:58 / Último acesso (12/08/2013) - Usuários On-Line

SiMEC - Fale Conosco Manual | Tx.: 0,2023s / 5,42



4. Apresenta as informações sobre os recursos;

The screenshot displays the 'Recursos da Obra' (Work Resources) section of the SIMEC system. The interface includes a header with project details, a search filter, and a table with columns for 'Data Bancária', 'Linha Nat', 'Descrição', 'Valor Aproximado', and 'Total Comp'. A summary table at the bottom shows 'Valor do Recurso' for different categories.

Data Bancária	Linha Nat	Descrição	Valor Aproximado	Total Comp
000001			11.000.000,00	11.000.000,00
000002			11.000.000,00	11.000.000,00
000003			11.000.000,00	11.000.000,00
000004			11.000.000,00	11.000.000,00
000005			11.000.000,00	11.000.000,00
000006			11.000.000,00	11.000.000,00
000007			11.000.000,00	11.000.000,00
000008			11.000.000,00	11.000.000,00
000009			11.000.000,00	11.000.000,00
000010			11.000.000,00	11.000.000,00
000011			11.000.000,00	11.000.000,00
000012			11.000.000,00	11.000.000,00
000013			11.000.000,00	11.000.000,00
000014			11.000.000,00	11.000.000,00
000015			11.000.000,00	11.000.000,00
000016			11.000.000,00	11.000.000,00
000017			11.000.000,00	11.000.000,00
000018			11.000.000,00	11.000.000,00
000019			11.000.000,00	11.000.000,00
000020			11.000.000,00	11.000.000,00
000021			11.000.000,00	11.000.000,00
000022			11.000.000,00	11.000.000,00
000023			11.000.000,00	11.000.000,00
000024			11.000.000,00	11.000.000,00
000025			11.000.000,00	11.000.000,00
000026			11.000.000,00	11.000.000,00
000027			11.000.000,00	11.000.000,00
000028			11.000.000,00	11.000.000,00
000029			11.000.000,00	11.000.000,00
000030			11.000.000,00	11.000.000,00
000031			11.000.000,00	11.000.000,00
000032			11.000.000,00	11.000.000,00
000033			11.000.000,00	11.000.000,00
000034			11.000.000,00	11.000.000,00
000035			11.000.000,00	11.000.000,00
000036			11.000.000,00	11.000.000,00
000037			11.000.000,00	11.000.000,00
000038			11.000.000,00	11.000.000,00
000039			11.000.000,00	11.000.000,00
000040			11.000.000,00	11.000.000,00
000041			11.000.000,00	11.000.000,00
000042			11.000.000,00	11.000.000,00
000043			11.000.000,00	11.000.000,00
000044			11.000.000,00	11.000.000,00
000045			11.000.000,00	11.000.000,00
000046			11.000.000,00	11.000.000,00
000047			11.000.000,00	11.000.000,00
000048			11.000.000,00	11.000.000,00
000049			11.000.000,00	11.000.000,00
000050			11.000.000,00	11.000.000,00
000051			11.000.000,00	11.000.000,00
000052			11.000.000,00	11.000.000,00
000053			11.000.000,00	11.000.000,00
000054			11.000.000,00	11.000.000,00
000055			11.000.000,00	11.000.000,00
000056			11.000.000,00	11.000.000,00
000057			11.000.000,00	11.000.000,00
000058			11.000.000,00	11.000.000,00
000059			11.000.000,00	11.000.000,00
000060			11.000.000,00	11.000.000,00
000061			11.000.000,00	11.000.000,00
000062			11.000.000,00	11.000.000,00
000063			11.000.000,00	11.000.000,00
000064			11.000.000,00	11.000.000,00
000065			11.000.000,00	11.000.000,00
000066			11.000.000,00	11.000.000,00
000067			11.000.000,00	11.000.000,00
000068			11.000.000,00	11.000.000,00
000069			11.000.000,00	11.000.000,00
000070			11.000.000,00	11.000.000,00
000071			11.000.000,00	11.000.000,00
000072			11.000.000,00	11.000.000,00
000073			11.000.000,00	11.000.000,00
000074			11.000.000,00	11.000.000,00
000075			11.000.000,00	11.000.000,00
000076			11.000.000,00	11.000.000,00
000077			11.000.000,00	11.000.000,00
000078			11.000.000,00	11.000.000,00
000079			11.000.000,00	11.000.000,00
000080			11.000.000,00	11.000.000,00
000081			11.000.000,00	11.000.000,00
000082			11.000.000,00	11.000.000,00
000083			11.000.000,00	11.000.000,00
000084			11.000.000,00	11.000.000,00
000085			11.000.000,00	11.000.000,00
000086			11.000.000,00	11.000.000,00
000087			11.000.000,00	11.000.000,00
000088			11.000.000,00	11.000.000,00
000089			11.000.000,00	11.000.000,00
000090			11.000.000,00	11.000.000,00
000091			11.000.000,00	11.000.000,00
000092			11.000.000,00	11.000.000,00
000093			11.000.000,00	11.000.000,00
000094			11.000.000,00	11.000.000,00
000095			11.000.000,00	11.000.000,00
000096			11.000.000,00	11.000.000,00
000097			11.000.000,00	11.000.000,00
000098			11.000.000,00	11.000.000,00
000099			11.000.000,00	11.000.000,00
000100			11.000.000,00	11.000.000,00

Recursos	Valor do Recurso	Valor Aproximado	Data Bancária
000001	11.000.000,00	11.000.000,00	000001
000002	11.000.000,00	11.000.000,00	000002
000003	11.000.000,00	11.000.000,00	000003



Recursos da Obra


Nome: [Selecione] | Filtro: [Selecione]

Quantia: [Selecione] | Nº de Obras: [Selecione]


Data	Valor	Descrição	Total
02/01/11	0,00		0,00
03/01/11	0,00		0,00
04/01/11	0,00		0,00
05/01/11	0,00		0,00
06/01/11	0,00		0,00
07/01/11	0,00		0,00
08/01/11	0,00		0,00
09/01/11	0,00		0,00
10/01/11	0,00		0,00
11/01/11	0,00		0,00
12/01/11	0,00		0,00
01/02/11	0,00		0,00
02/02/11	0,00		0,00
03/02/11	0,00		0,00
04/02/11	0,00		0,00
05/02/11	0,00		0,00
06/02/11	0,00		0,00
07/02/11	0,00		0,00
08/02/11	0,00		0,00
09/02/11	0,00		0,00
10/02/11	0,00		0,00
11/02/11	0,00		0,00
12/02/11	0,00		0,00
01/03/11	0,00		0,00
02/03/11	0,00		0,00
03/03/11	0,00		0,00
04/03/11	0,00		0,00
05/03/11	0,00		0,00
06/03/11	0,00		0,00
07/03/11	0,00		0,00
08/03/11	0,00		0,00
09/03/11	0,00		0,00
10/03/11	0,00		0,00
11/03/11	0,00		0,00
12/03/11	0,00		0,00
01/04/11	0,00		0,00
02/04/11	0,00		0,00
03/04/11	0,00		0,00
04/04/11	0,00		0,00
05/04/11	0,00		0,00
06/04/11	0,00		0,00
07/04/11	0,00		0,00
08/04/11	0,00		0,00
09/04/11	0,00		0,00
10/04/11	0,00		0,00
11/04/11	0,00		0,00
12/04/11	0,00		0,00
01/05/11	0,00		0,00
02/05/11	0,00		0,00
03/05/11	0,00		0,00
04/05/11	0,00		0,00
05/05/11	0,00		0,00
06/05/11	0,00		0,00
07/05/11	0,00		0,00
08/05/11	0,00		0,00
09/05/11	0,00		0,00
10/05/11	0,00		0,00
11/05/11	0,00		0,00
12/05/11	0,00		0,00
01/06/11	0,00		0,00
02/06/11	0,00		0,00
03/06/11	0,00		0,00
04/06/11	0,00		0,00
05/06/11	0,00		0,00
06/06/11	0,00		0,00
07/06/11	0,00		0,00
08/06/11	0,00		0,00
09/06/11	0,00		0,00
10/06/11	0,00		0,00
11/06/11	0,00		0,00
12/06/11	0,00		0,00
01/07/11	0,00		0,00
02/07/11	0,00		0,00
03/07/11	0,00		0,00
04/07/11	0,00		0,00
05/07/11	0,00		0,00
06/07/11	0,00		0,00
07/07/11	0,00		0,00
08/07/11	0,00		0,00
09/07/11	0,00		0,00
10/07/11	0,00		0,00
11/07/11	0,00		0,00
12/07/11	0,00		0,00
01/08/11	0,00		0,00
02/08/11	0,00		0,00
03/08/11	0,00		0,00
04/08/11	0,00		0,00
05/08/11	0,00		0,00
06/08/11	0,00		0,00
07/08/11	0,00		0,00
08/08/11	0,00		0,00
09/08/11	0,00		0,00
10/08/11	0,00		0,00
11/08/11	0,00		0,00
12/08/11	0,00		0,00
01/09/11	0,00		0,00
02/09/11	0,00		0,00
03/09/11	0,00		0,00
04/09/11	0,00		0,00
05/09/11	0,00		0,00
06/09/11	0,00		0,00
07/09/11	0,00		0,00
08/09/11	0,00		0,00
09/09/11	0,00		0,00
10/09/11	0,00		0,00
11/09/11	0,00		0,00
12/09/11	0,00		0,00
01/10/11	0,00		0,00
02/10/11	0,00		0,00
03/10/11	0,00		0,00
04/10/11	0,00		0,00
05/10/11	0,00		0,00
06/10/11	0,00		0,00
07/10/11	0,00		0,00
08/10/11	0,00		0,00
09/10/11	0,00		0,00
10/10/11	0,00		0,00
11/10/11	0,00		0,00
12/10/11	0,00		0,00
01/11/11	0,00		0,00
02/11/11	0,00		0,00
03/11/11	0,00		0,00
04/11/11	0,00		0,00
05/11/11	0,00		0,00
06/11/11	0,00		0,00
07/11/11	0,00		0,00
08/11/11	0,00		0,00
09/11/11	0,00		0,00
10/11/11	0,00		0,00
11/11/11	0,00		0,00
12/11/11	0,00		0,00
01/12/11	0,00		0,00
02/12/11	0,00		0,00
03/12/11	0,00		0,00
04/12/11	0,00		0,00
05/12/11	0,00		0,00
06/12/11	0,00		0,00
07/12/11	0,00		0,00
08/12/11	0,00		0,00
09/12/11	0,00		0,00
10/12/11	0,00		0,00
11/12/11	0,00		0,00
12/12/11	0,00		0,00

5. Salvar as informações.


DOCUMENTOS

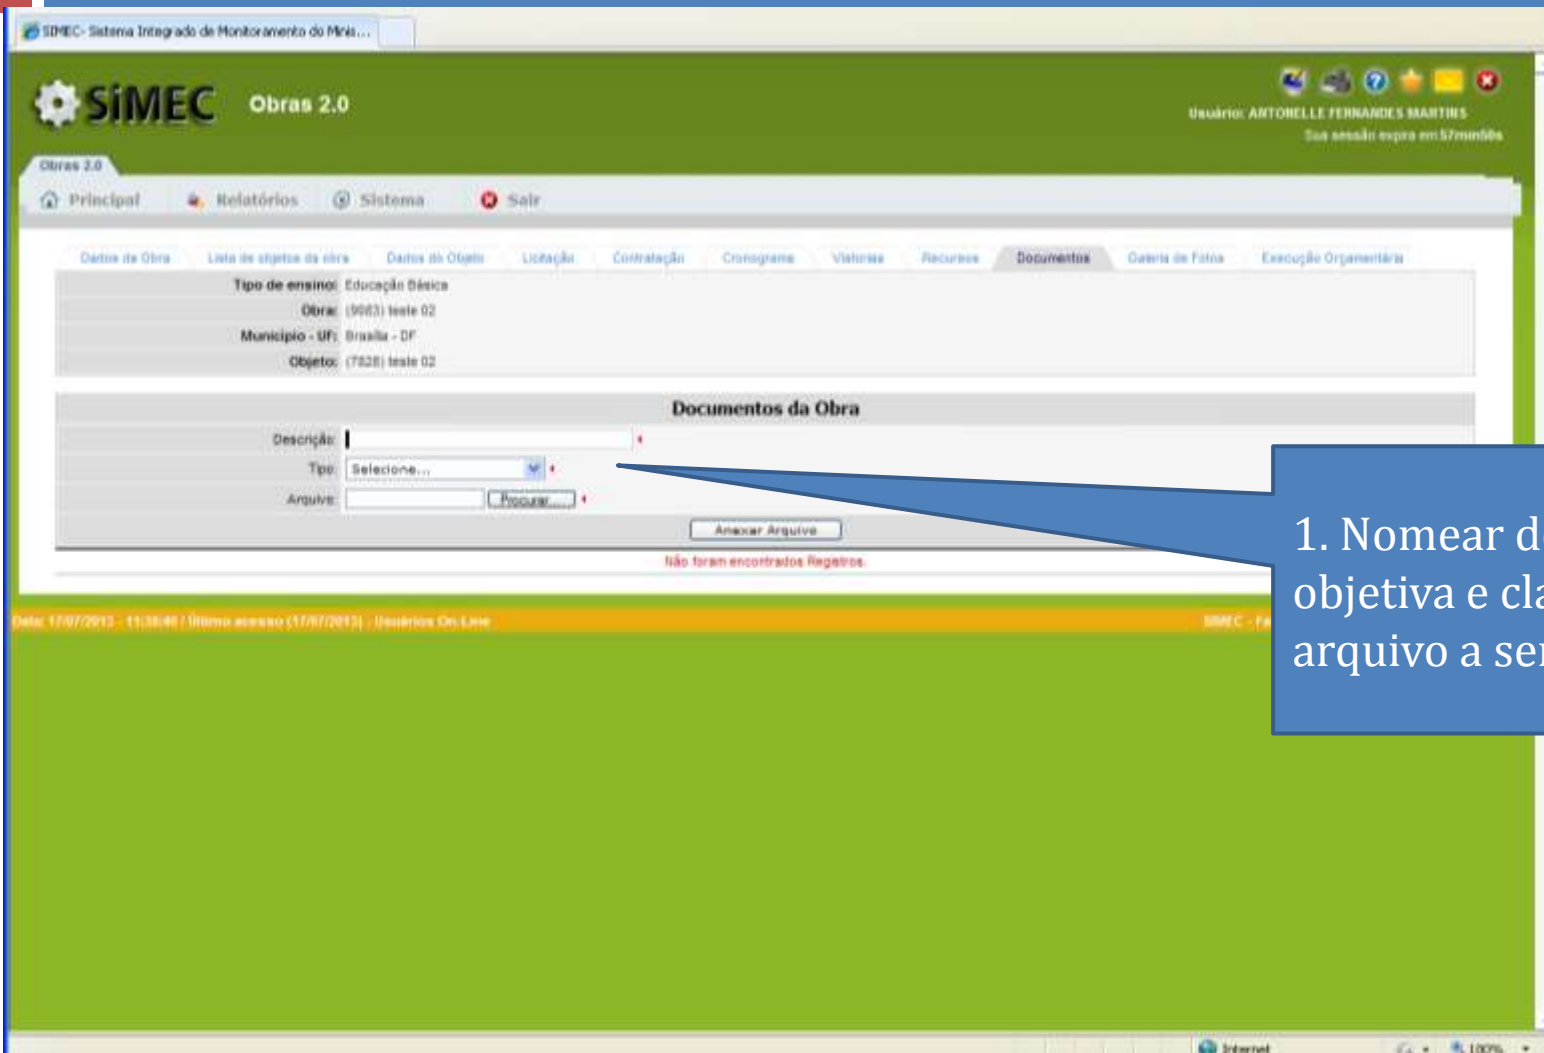


1. Nomear de forma objetiva e clara o arquivo a ser inserido;

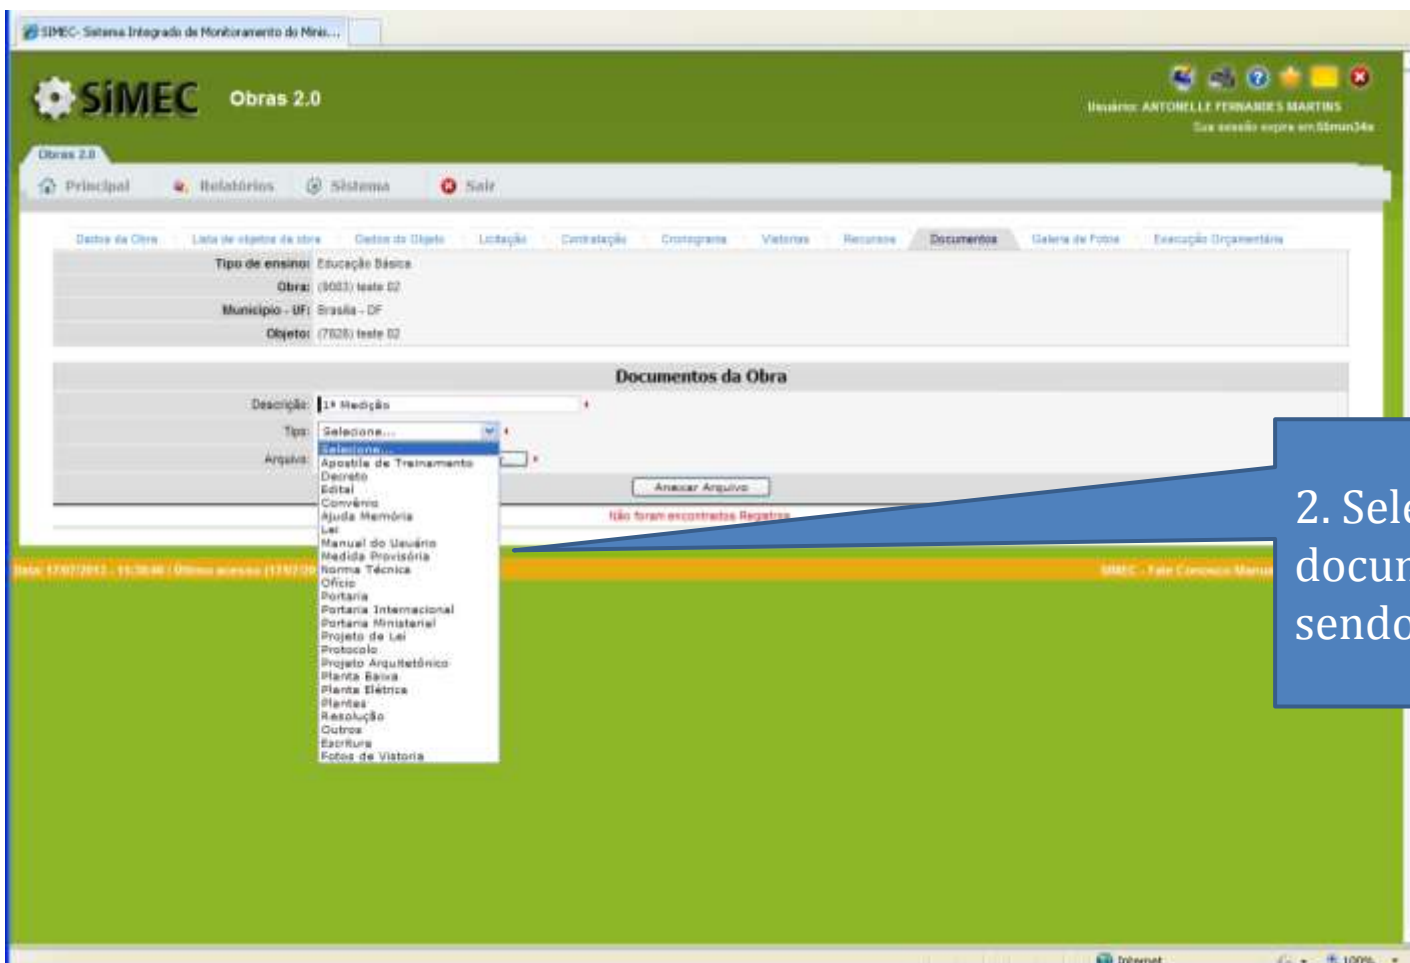


2. Selecionar o tipo de documento que está sendo inserido

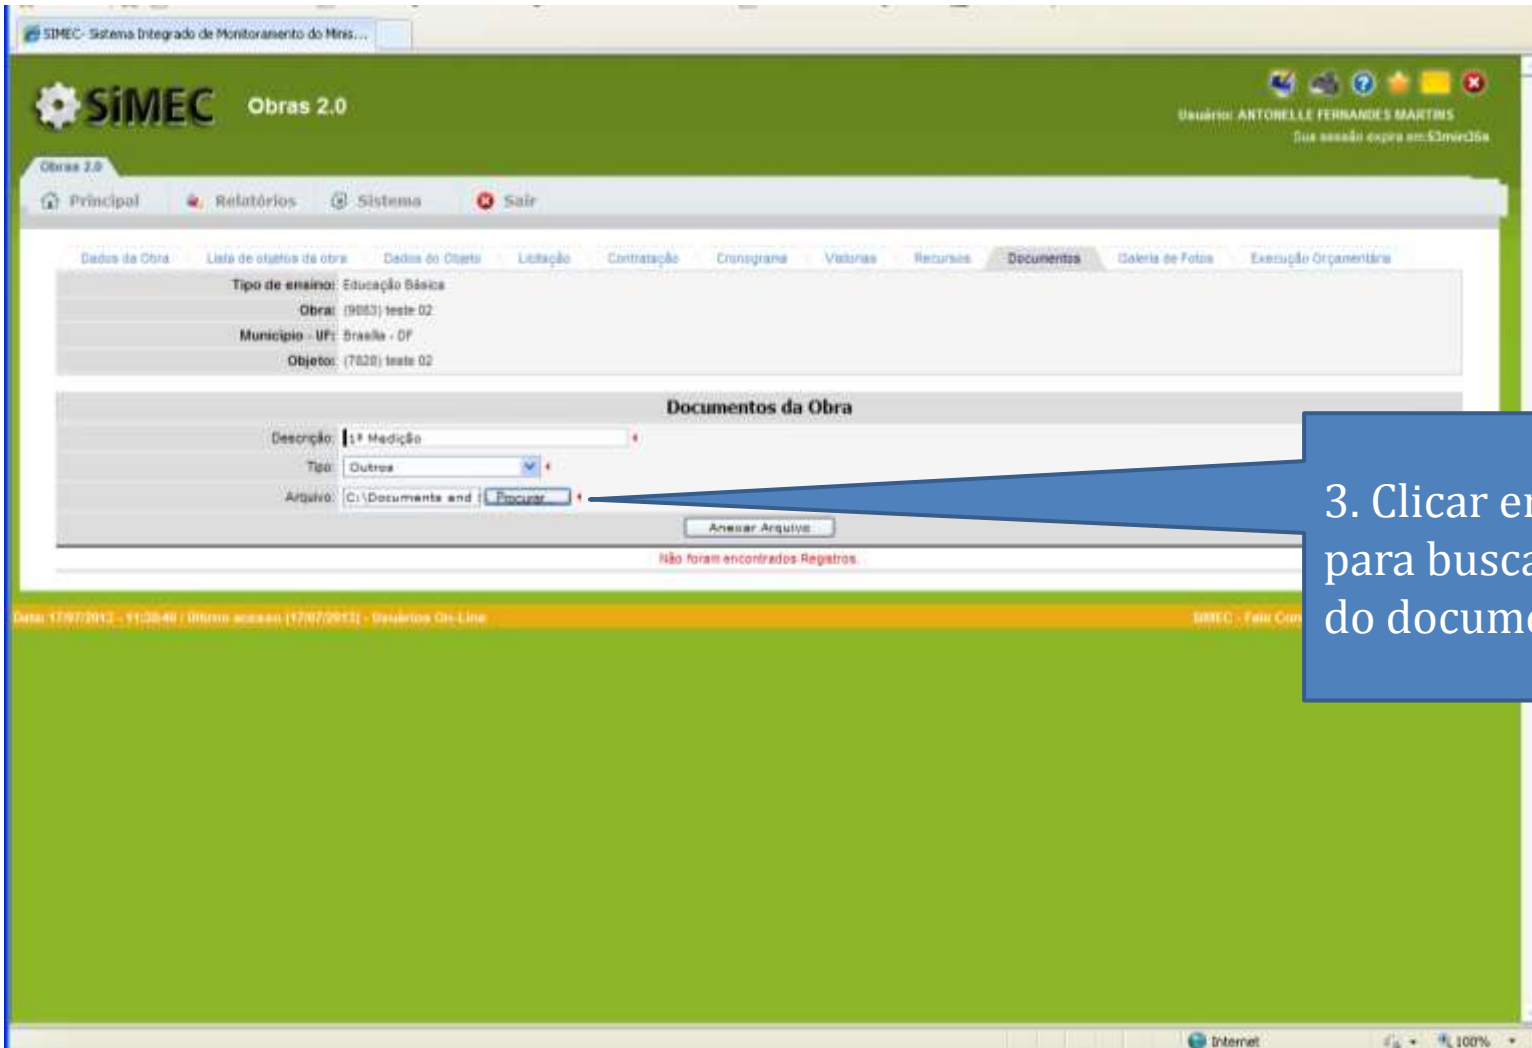

3. Clicar em Procurar para buscar o arquivo do documento;



Tela de confirmação de
arquivo anexado com sucesso

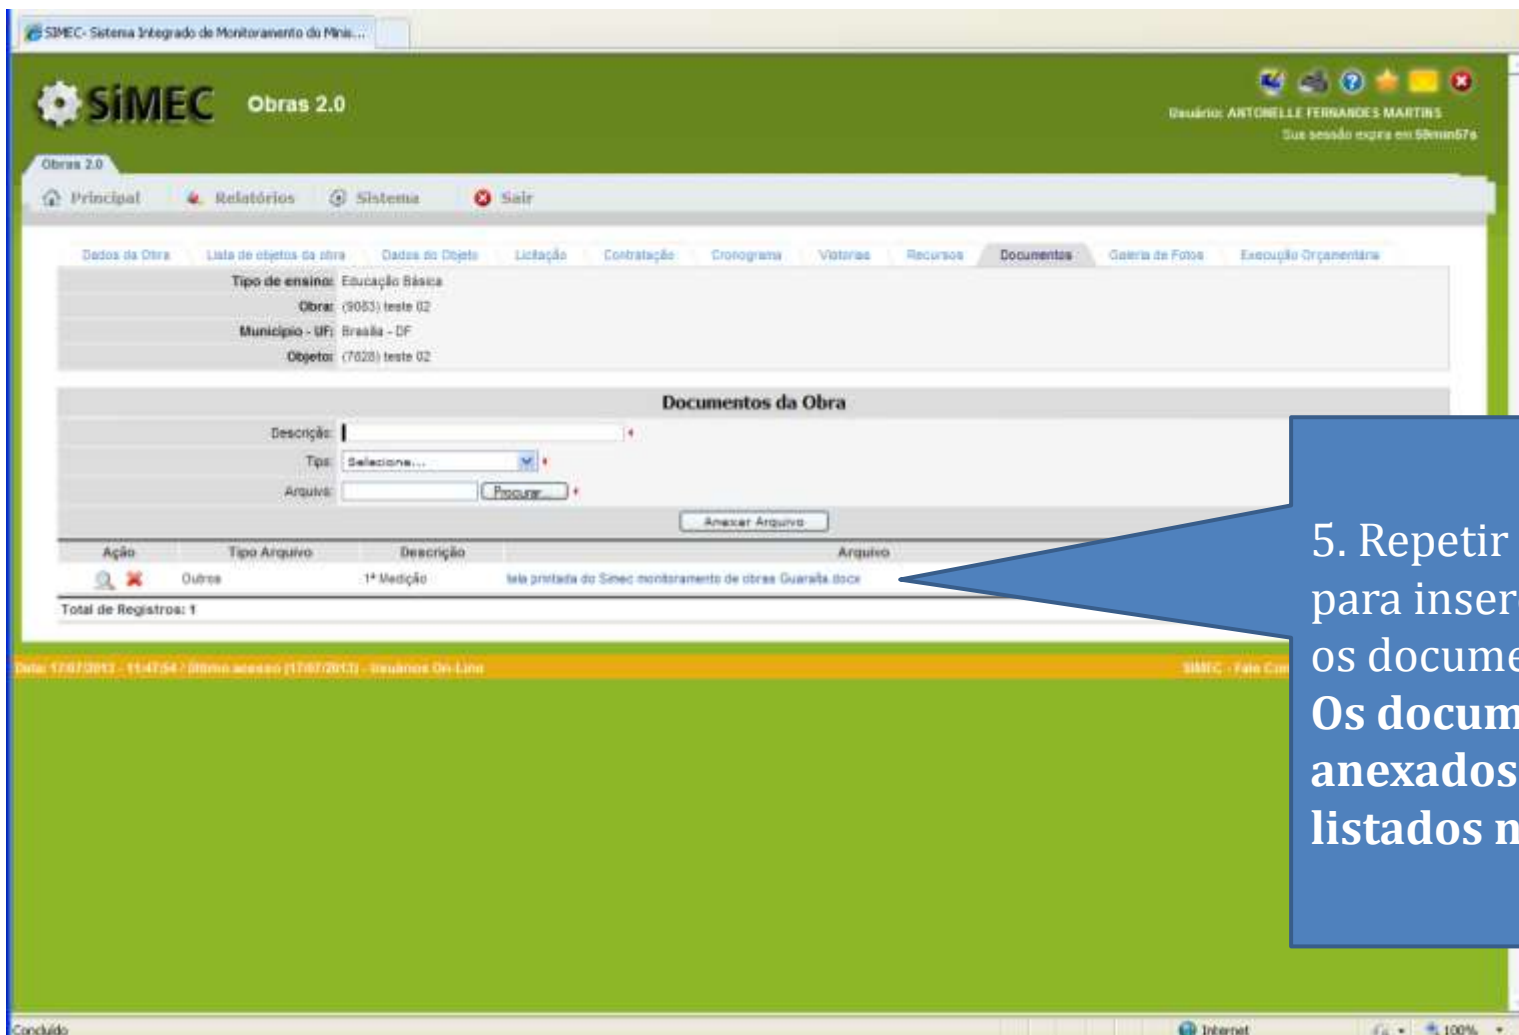

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento do Minis...

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERRANDES MARTINS
Sua sessão expira em 59min57s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Lista de objetos da obra Dados do Depoimento Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos **Documentos** Galeria de Fotos Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Obra: (9053) teste 02
Município - UF: Brasília - DF
Objeto: (7020) teste 02

Documentos da Obra

Descrição:
Tipo: Seleccione...
Arquivo:

Ação	Tipo Arquivo	Descrição	Arquivo
	Obras	1ª Medição	tela printada do Simec monitoramento de obras Guarulhos.docx

Total de Registros: 1

Data: 17/07/2013 - 11:47:54 - Último acesso: 17/07/2013 - Usuário: On-Line

SIMEC - Fale Con

Concluído

5. Repetir os passos para inserção de todos os documentos; **Os documentos anexados aparecerão listados na tela**

GALERIA DE FOTOS



A **Galeria de fotos** é uma aba onde devem ser inseridas as fotografias que melhor representem a obra executada.

Escolha suas melhores fotos e apresente sua escola aos gestores MEC.





Inserir Vistoria
Acompanhamento da Obra

Dados do Acompanhamento: (Arbitrário de Evolução da Execução da Obra)

Data do Acompanhamento: 21/08/2013
 Data Prevista de Conclusão: 28/09/2014
 Nome do Responsável: ALDA HELENA A.B DA SILVA FRANCO
 Situação: Em Execução

TOODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA FACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento:

Descrição	Valor (R\$)	[%] Sobre a Obra	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		
							[%] do Item já Executado	[%] do Item já Executado sobre a Obra	[%] Supervisão
* SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	7.331,85	0,38	-	-	05/07/2012	05/08/2012	100,00	0,38	100,00
* MOVIMENTO DE TERRA	17.108,10	1,00	-	-	05/07/2012	05/08/2012	100,00	1,00	100,00
* INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	29.947,88	3,41	-	-	05/07/2012	05/08/2012	100,00	3,41	100,00
* SUPERESTRUTURA	181.988,40	18,42	-	-	06/07/2012	04/09/2012	100,00	18,42	100,00
* ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	28.955,23	3,20	-	-	04/10/2012	01/01/2013	89,58	2,86	89,58
* ESQUADRIAS	29.073,79	3,31	-	-	04/10/2012	31/01/2013	61,46	2,19	61,46
* COBERTURA	240.528,40	27,00	-	-	04/10/2012	02/12/2012	85,12	22,21	85,12
* INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	110.589,74	12,52	-	-	05/08/2012	31/01/2013	18,88	2,25	18,88
* INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	19.088,51	2,24	-	-	05/08/2012	31/01/2013	39,76	0,89	39,76
* IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	838,82	0,10	-	-	05/08/2012	04/10/2012	100,00	0,10	100,00
* REVESTIMENTOS	28.518,16	3,25	-	-	01/01/2013	31/01/2013	90,55	2,94	90,55
* MÓDULOS	9.106,52	0,92	-	-	03/11/2012	31/01/2013	0,00	0,00	0,00
* PINTURA	40.017,88	4,50	-	-	02/12/2012	01/01/2013	0,00	0,00	0,00
* SERVIÇOS COMPLEMENTARES	92.707,38	10,12	-	-	04/09/2012	31/01/2013	80,10	2,88	80,10
* PAVIMENTOS / URBANIZAÇÃO	1.254,80	0,14	-	-	04/10/2012	31/01/2013	42,76	0,06	42,76
* FORRO	12.057,80	1,37	-	-	04/10/2012	01/01/2013	100,00	1,37	100,00
* PISO	68.418,47	7,80	-	-	03/11/2012	31/01/2013	66,63	4,73	66,63
Total	877.312,88	100,00					68,27	68,27	68,27

Relatório Técnico do Acompanhamento:

MOVIMENTO DE TERRA: Executado
 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES: Executado
 SUPERESTRUTURA: Executado
 ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA: Executado
 ESQUADRIAS: Executado
 COBERTURA: Executado
 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS: Em execução
 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS: Em execução
 IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA: Em execução
 REVESTIMENTOS: Em execução
 MÓDULOS: Em execução
 PINTURA: Em execução
 SERVIÇOS COMPLEMENTARES: Em execução
 PAVIMENTOS / URBANIZAÇÃO: Em execução
 FORRO: Em execução
 PISO: Em execução

Fotos do Acompanhamento: *Arraste as imagens para a área de 'Fotos da Galeria' para adicioná-las à galeria. Após adicioná-las, clique no botão 'Salvar' para confirmar as alterações.

Fotos da Galeria:

Pode-se enviar fotos para a galeria pela aba Vistoria.
 Selecione a foto e arraste para a galeria de fotos.

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. The top navigation bar includes 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The main menu contains 'Dados da Obra', 'Lista de objetos da obra', 'Dados do Objeto', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Visitas', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', and 'Execução Orçamentária'. The 'Galeria de Fotos' section is active, showing a form with the following fields: 'Tipo de ensino: Educação Básica', 'Obra: (3003) teste 02', 'Município - UF: Brasília - DF', and 'Objeto: (7020) teste 02'. Below these, the 'Galeria de Fotos' section has a 'Descrição:' text input, a 'Data da Foto:' date input, and an 'Arquivo (Foto):' file input with a 'Pesquisar' button. An 'Anexar Foto' button is also present. The status 'Não existem fotos cadastradas' is displayed at the bottom of the section. The footer shows the date 'Data: 17/07/2013 - 11:38:46 / Último acesso: 17/07/2013 - 09:45:06 On-Line' and the browser status 'Concluído'.

1. Preencher os campos com as informações solicitadas

SIMEC - Sistema Integrado de Monitoramento de Obras 2.0

Usuário: ANTORELLE FERREDES MARTINS
Sua sessão expira em 08min07s

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Lista de objetos da obra Dados do Objeto Licitação Contratação Cronograma Visitas Recursos Documentos Galeria de Fotos Exo...

Tipo de ensino: Educação Básica
Obra: (3003) teste 02
Município - UF: Brasília - DF
Objeto: (7020) teste 02

Galeria de Fotos

Descrição:

Data da Foto:

Arquivo (Foto): **Procurar**

Não existem fotos cadastradas


Data: 17/07/2013 - 11:30:40 / Último acesso: 17/07/2013 - 09:43:05 On-Line

SIMEC - Faça contato Manual - 11x: 0,2079x / 3,43

Concluído

Internet 100%

2. Clicar no botão
Procurar para localizar
o arquivo a ser inserido;

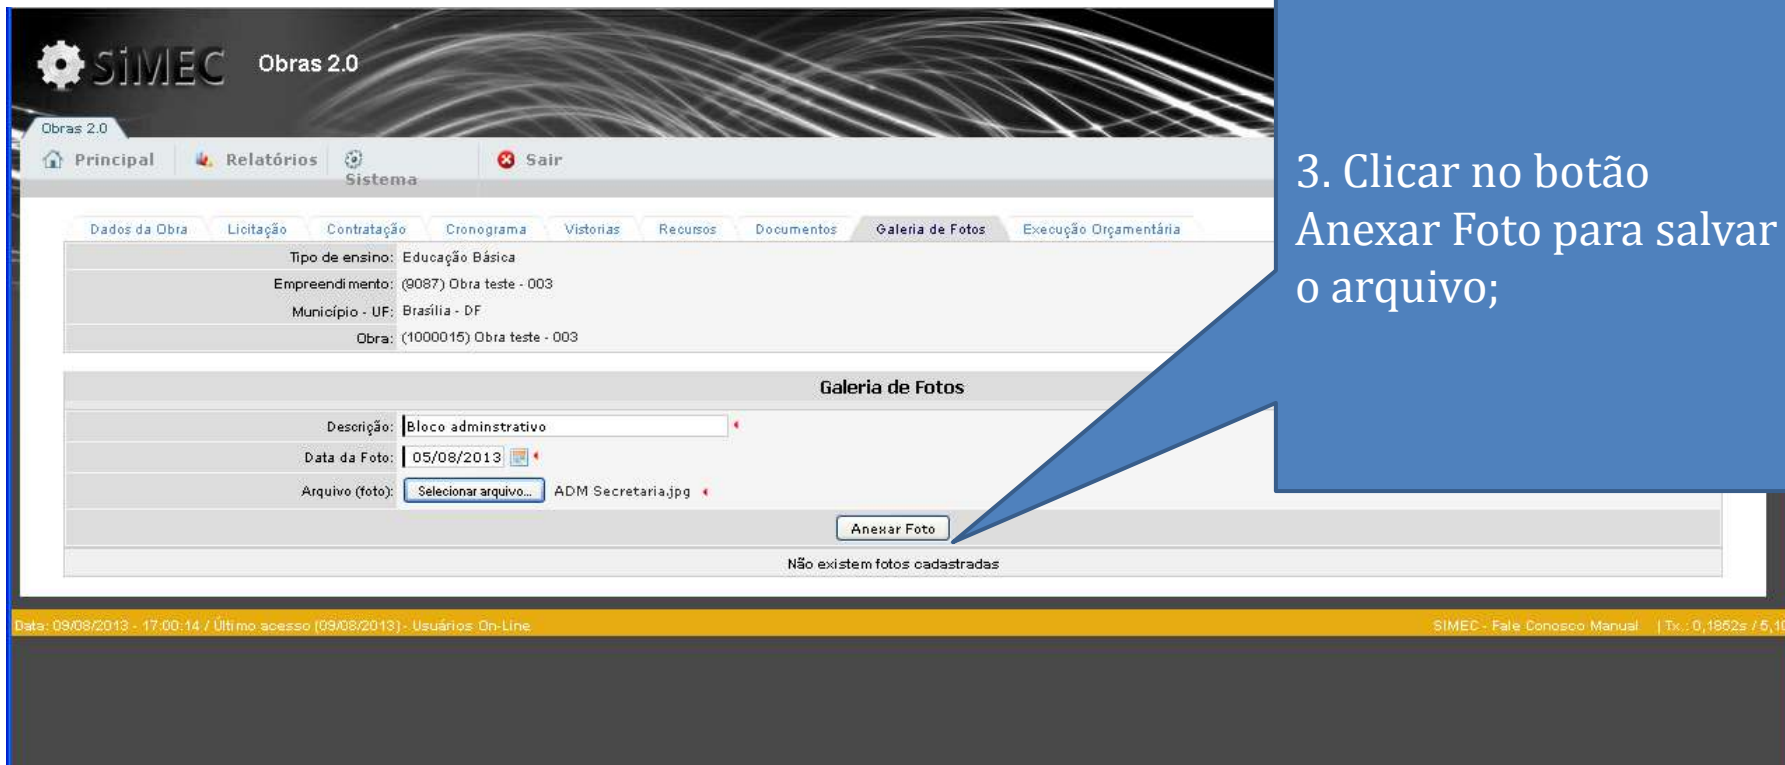

Obras 2.0

Principal Relatórios Sistema Sair

Dados da Obra Licitação Contratação Cronograma Vistorias Recursos Documentos Galeria de Fotos Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Galeria de Fotos

Descrição: Bloco administrativo
Data da Foto: 05/08/2013
Arquivo (foto): Selecionar arquivo... ADM Secretaria.jpg

Anexar Foto

Não existem fotos cadastradas


3. Clicar no botão Anexar Foto para salvar o arquivo;

Data: 09/08/2013 - 17:00:14 / Último acesso (09/08/2013) - Usuários On-Line

SIMEC - Faça Conosco Manual | Tx.: 0,1862s / 5,40



Tela de confirmação de
ação realizada;





The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. At the top left, the SIMEC logo and 'Obras 2.0' are visible. The top right shows the user 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' and a session expiration warning. A navigation menu includes 'Principal', 'Relatórios', and 'Sair'. Below this, a series of tabs are shown: 'Dados da Obra', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Galeria de Fotos', and 'Execução Orçamentária'. The 'Galeria de Fotos' tab is active, showing a form with fields for 'Descrição', 'Data da Foto', and 'Arquivo (foto)'. The 'Arquivo (foto)' field contains a 'Selecionar arquivo...' button and the text 'Nenhum arquivo selecionado.'. Below the form is an 'Anexar Foto' button. A single photo thumbnail is displayed with the date '09/08/2013'. At the bottom, a status bar shows 'Data: 09/08/2013 - 17:05:13 / Último acesso (09/08/2013) - Usuários On-Line'.

Todas as imagens salvas aparecerão na tela

EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 53min40s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | **Execução Orçamentária**

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Execução Orçamentária

Salve o orçamento para a obra e então será liberado o cadastro de detalhamento do orçamento

Orçamento para a Obra

Capital (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Custeio (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Total (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>

Data: 09/08/2013 - 17:06:34 / Último acesso (09/08/2013) - Usuários On-Line: 0,14615 / 5,88

1. Informar o valor contratado total da obra

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application interface. At the top left, the SIMEC logo and 'Obras 2.0' are visible. The user is identified as 'ANTONELLE FERNANDES MARTINS' with a session expiration of 55 minutes. The main navigation bar includes 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The 'Execução Orçamentária' tab is selected, showing a form with the following data:

Tipo de ensino:	Educação Básica
Empreendimento:	(9087) Obra teste - 003
Município - UF:	Brasília - DF
Obra:	(1000015) Obra teste - 003

Execução Orçamentária
Salve o orçamento para a obra e então será liberado o cadastro de detalhamento do orçamento.


Orçamento para a Obra

Capital (R\$):	<input type="text" value="1.190.000,00"/>
Custeio (R\$):	<input type="text" value="0,00"/>
Total (R\$):	<input type="text" value="1.190.000,00"/>

Buttons:

Footer: Data: 09/09/2013 - 17:06:34 / Último acesso (09/09/2013) - Usuários On-Line: SIMEC - Pare Conosco Manual | Tx.: 0,1481s / 5,68

2. Clicar em “Salvar” para que a informação seja armazenada e o botão “incluir empenho” fique ativado;



Tela de confirmação da operação realizada com sucesso



Mais visitados | Passados por você | Últimas notícias

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 00:00:00

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Detalhe da Obra | Livramento | Contabilização | Cronograma | Vistorias | Relatórios | Documentos | Galeria de Fotos | **Execução Orçamentária**

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (10000M) Obra teste - 003

Execução Orçamentária

Orçamento para a Obra

Capital (R\$)	1.190.000,00
Custeio (R\$)	0,00
Total (R\$)	1.190.000,00

Incluir Detalhamento Empenhado

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Incluir Detalhamento Liquidado

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Não foram encontradas Registros.

Salvar | Voltar

Exec: 09/03/13 - 17:18:03 | (Roteiro: 09/03/13) - SIMEC - On Line

SIMEC - Func. Controle Manual - | 11 - 0,17436 x 8,29

3. Clicar em “Incluir Detalhamento Empenho” para incluir empenho;



Cadastro de Detalhamento Orçamentário Empenhado

Indica Campo Obrigatório.

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 1.190.000,00
Custeio (R\$): 0,00
Total (R\$): 1.190.000,00

Detalhamento Orçamentário

Data:

Valor Empenhado (R\$):

% Empenhado: 0,00

Arquivo: Nenhum arquivo selecionado.

Município - UF: Itaitinga - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Execução Orçamentária

Orçamento para a Obra

Capital (R\$):
Custeio (R\$):
Total (R\$):

[Incluir Detalhamento Empenhado:](#)

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Não foram encontrados Registros.

[Incluir Detalhamento Liquidado:](#)

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Não foram encontrados Registros.

3. Inserir as informações solicitadas;



The screenshot displays the Simec web application interface. The top window shows the 'Cadastro de Detalhamento Orçamentário Empenhado' form with fields for Capital (R\$), Cadastre (R\$), Total (R\$), Data, Valor Empenhado (R\$), and % Empenhado. A file selection button is visible with the filename 'nota_de_empenho(1).pdf'. The bottom window shows the 'Execução Orçamentária' summary page for 'Município - UF: Brasília - DF' and 'Obra: (1000015) Obra beta - 000'. It includes summary fields for Capital, Cadastre, and Total, and sections for 'Incluir Detalhamento Empenhado' and 'Incluir Detalhamento Liquidado', both showing 'Não foram encontrados Registros'.


4. Anexar o arquivo digitalizado e salvo na extensão pdf;



The image shows a screenshot of the Simec system interface. On the left, a Mozilla Firefox browser window displays the 'Cadastro de Detalhamento Orçamentário Empenhado' form. The form includes fields for 'Capital (R\$): 1.190.000,00', 'Custeio (R\$): 0,00', and 'Total (R\$): 1.190.000,00'. Below these, there is a 'Detalhamento Orçamentário' section with 'Data: 09/08/2013', 'Valor Empenhado (R\$): 500.000,00', and '% Empenhado: 42,02'. A file upload field is labeled 'Arquivo: Selecionar arquivo... Empenho_29_Medicao[1].pdf'. At the bottom of the form are 'Salvar' and 'Fechar' buttons. A blue callout box points to the 'Salvar' button.

The main browser window shows the 'Execução Orçamentária' summary page. It displays the same financial data as the form: 'Capital (R\$): 1.190.000,00', 'Custeio (R\$): 0,00', and 'Total (R\$): 1.190.000,00'. Below this, there are two sections: 'Incluir Detalhamento Empenhado' and 'Incluir Detalhamento Liquidado', both with a red message: 'Não foram encontrados registros.' At the bottom of the page are 'Salvar' and 'Voltar' buttons.

5. Salvar informações;

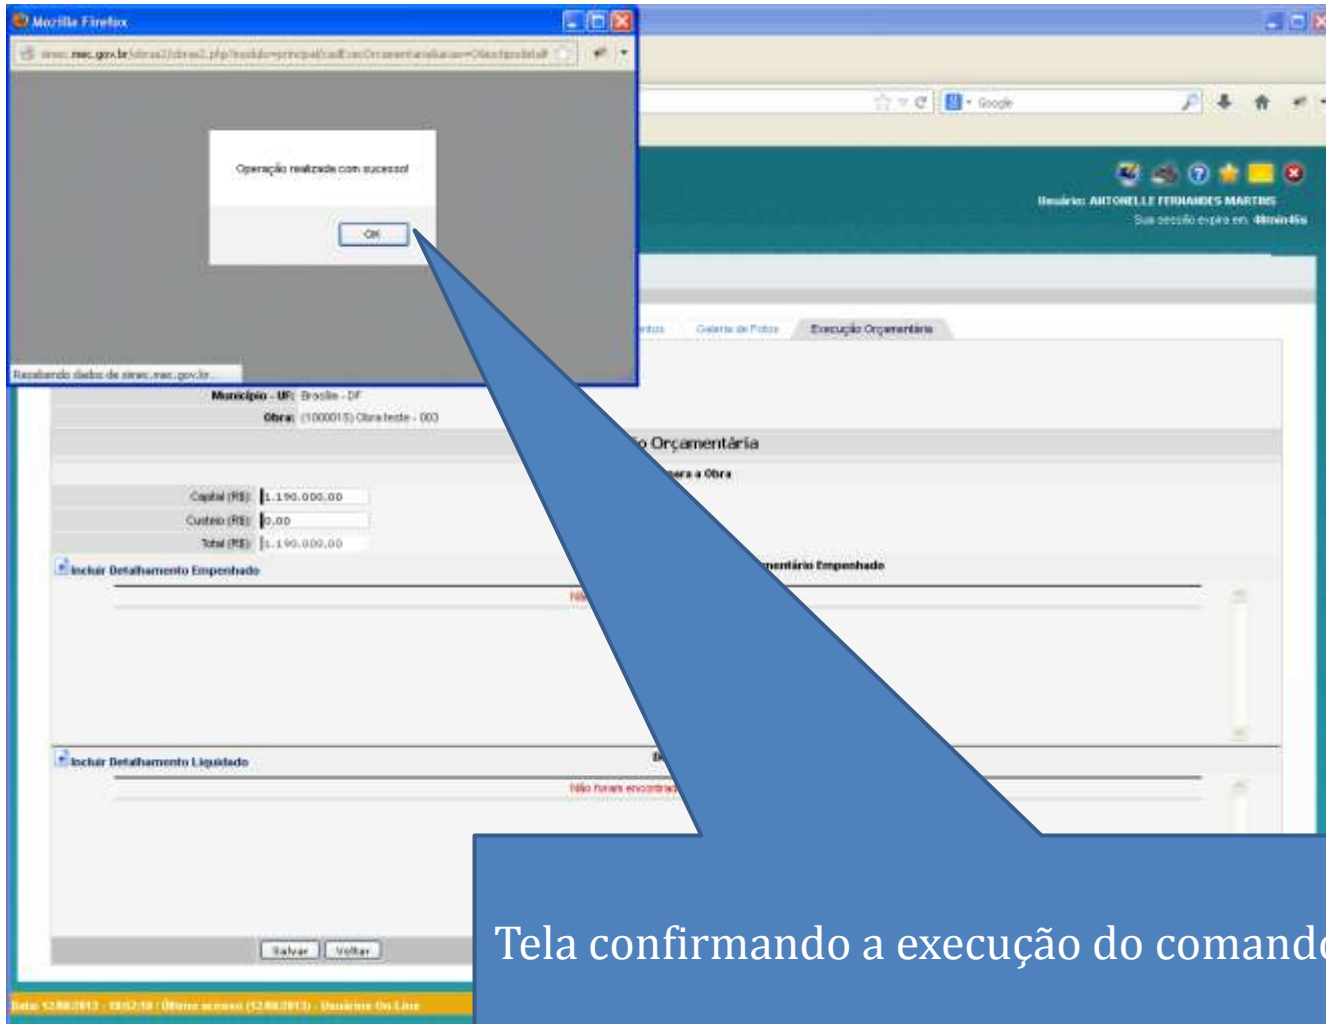

Tela confirmando a execução do comando com sucesso



The screenshot displays the 'Execução Orçamentária' (Budget Execution) section of the SiMEC Obras 2.0 system. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The main content area shows project details: 'Tipo de ensino: Educação Básica', 'Empreendimento: (9067) Obra teste - 003', 'Município - UF: Brasília - DF', and 'Obra: (1000015) Obra teste - 003'. Below this, the 'Execução Orçamentária' section is divided into 'Orçamento para a Obra' and 'Detalhamento Orçamentário Empenhado'. The 'Orçamento para a Obra' section shows input fields for 'Capital (R\$)' (1.190.000,00), 'Custo (R\$)' (0,00), and 'Total (R\$)' (1.190.000,00). The 'Detalhamento Orçamentário Empenhado' section contains a table with columns for 'Ação', 'Data', 'Valor Empenhado (R\$)', '% Empenhado', 'Arquivo', and 'Inscrito por'. A single record is shown for the date 09/08/2013, with a value of 500.000,00 and 42,02% empenho. A callout box points to this record with the text 'Informações sobre empenho salvas'. Below the empenho table, the 'Detalhamento Orçamentário Liquidado' section is empty, with a message 'Não foram encontrados Registros'. At the bottom, there are 'Salvar' and 'Voltar' buttons. The footer of the application shows the date 'Data: 12/04/2013 - 11:00:18 / Último acesso: (12/04/2013) - Usuário: On Line' and 'SiMEC - Fale Conosco Manual - [E:] 9,2/2013 / 5/6'.

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inscrito por
	09/08/2013	500.000,00	42,02	Empenho_2ª_Medicao[1].pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Total:		500.000,00	42,02		

Informações sobre empenho salvas



Execução Orçamentária

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 10,00
Custos (R\$): 0,00
Total (R\$): 10,00

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inserido por
<input checked="" type="checkbox"/>	16/07/2013	10,00	100,00		ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Totais		10,00	100,00		

Total de Registros: 1

6. Clicar para inserir valores liquidados




Form titled "Cadastro de Detalhamento Orçamentário Liquidado". It includes fields for "Capital (R\$)", "Custo (R\$)", and "Total (R\$)", all set to 10.00. Below, there is a "Detalhamento Orçamentário" section with a "Data" field, a "Valor Liquidado (R\$)" field set to 0.00, and a "% Liquidado" field set to 0.00. There is also an "Arquivo" field and a "Pesquisar" button. "Salvar" and "Fechar" buttons are at the bottom.

7. Preencher as informações conforme valores pagos liquidados nas notas fiscais;


Page titled "Execução Orçamentária" for "Município - UF: Brasília - DF" and "Objeto: (7828) teste t2". It shows "Orçamento para a Obra" with "Capital (R\$)", "Custo (R\$)", and "Total (R\$)" all at 10.00. Below is a table for "Detalhamento Orçamentário Empenhado":

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inserido por
	18/07/2013	10,00	100,00		AITONELLE FERNANDES MARTINS
Total:		10,00	100,00		

Below the table, it says "Total de Registros: 1". At the bottom, there is a section for "Detalhamento Orçamentário Liquidado" with a red message: "Não foram encontrados Registros." "Salvar" and "Voltar" buttons are at the bottom.

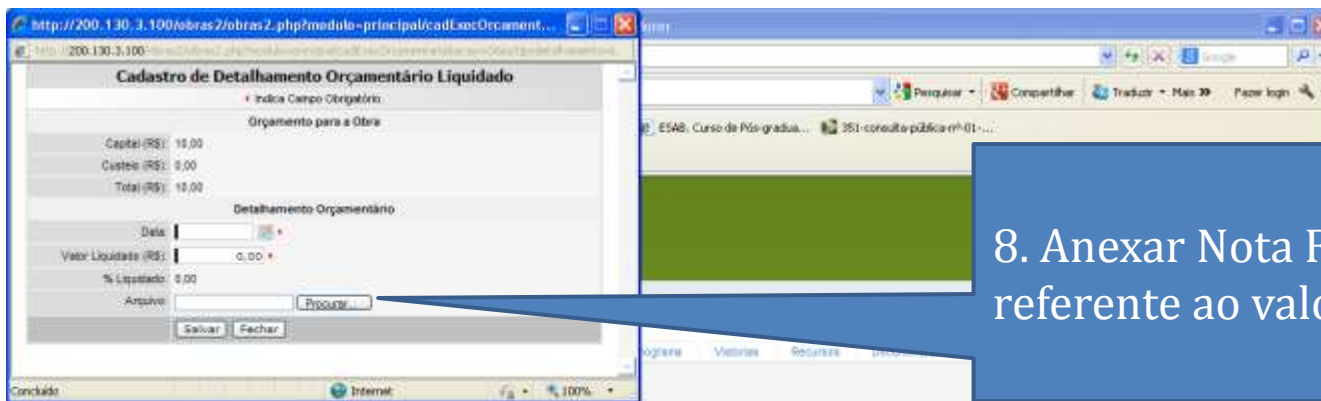

8. Anexar Nota Fiscal digitalizada referente ao valor informado;

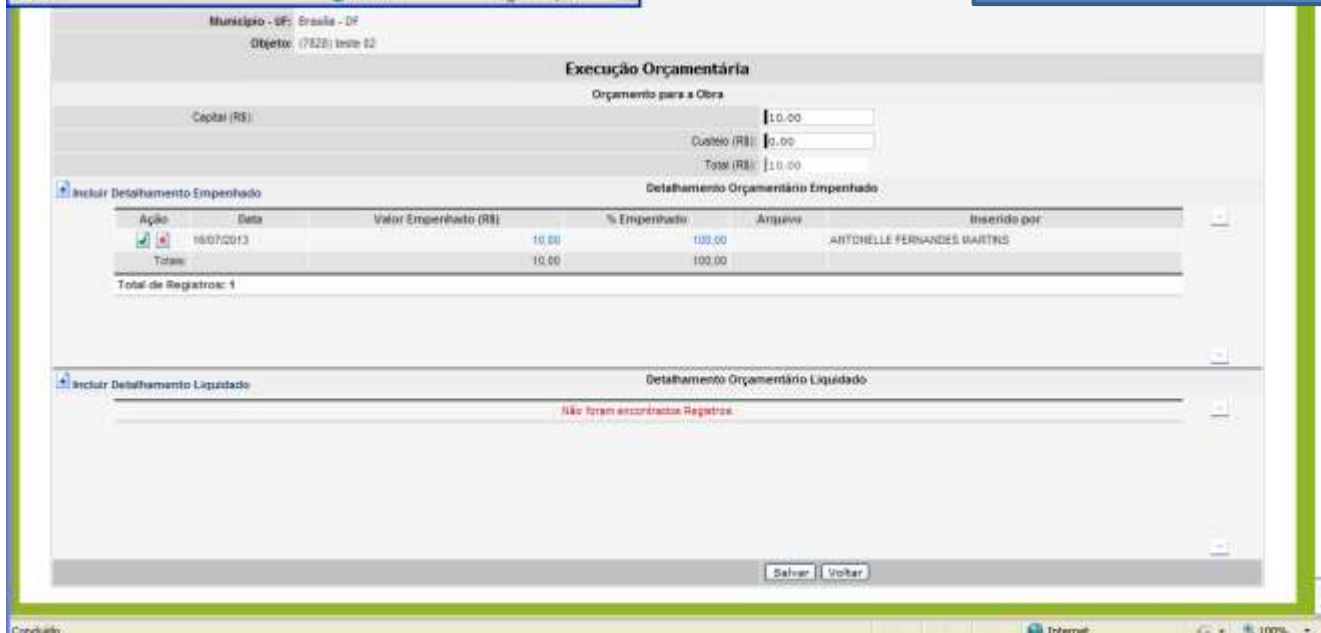



Cadastro de Detalhamento Orçamentário Liquidado

Índice Campo Obrigatório

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 10,00
Custo (R\$): 0,00
Total (R\$): 10,00

Detalhamento Orçamentário

Data:
Valor Liquidado (R\$):
% Liquidado: 0,00
Arquivo:

Execução Orçamentária

Município - UF: Brasília - DF
Objeto: (7828) teste t2

Orçamento para a Obra

Capital (R\$):
Custo (R\$):
Total (R\$):

Detalhamento Empenhado

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo
	18/07/2013	10,00	100,00	ANTONELLE FERNANDES M...
Total:		10,00	100,00	

Total de Registros: 1

Detalhamento Liquidado

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Não foram encontrados Registros.

9. Salvar as informações inseridas;



Operação realizada com sucesso!

OK

Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Capital (R\$): 1.190.000,00
Custo (R\$): 0,00
Total (R\$): 1.190.000,00

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado
<input checked="" type="checkbox"/>	08/08/2013	900.000,00	
Total:		900.000,00	

Total de Registros: 1

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Não foram encontrados Registros.

Salvar Verificar

Recebendo dados de simec.nec.gov.br...

Usuário: ANTOELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 53min06s

Execução Orçamentária

Salva de Fotos

1288.0911 - 118618 - Último acesso (1288.0911) - Usuário On-Line

SiMEC - Fm. Constr. Mater. - Tel: 8.27526-534

Mensagem confirmação da execução do comando



Informações salvas

SIMEC Obras 2.0 Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | **Execução Orçamentária**

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (5087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Execução Orçamentária

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 1.190.000,00
Custeio (R\$): 0,00
Total (R\$): 1.190.000,00

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inserido por
	09/08/2013	500.000,00	42,02	Empenho_2*_Medição[1].pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Totais:		500.000,00	42,02		

Total de Registros: 1

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Ação	Data	Valor Liquidado (R\$)	% Liquidado	Arquivo	Inserido por
	08/08/2013	100.000,00	0,40	Nota_Fiscal_Medicao_01_FL_01.pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Totais:		100.000,00	0,40		

Total de Registros: 1

Salvar Voltar

Data: 13/08/2013 - 11:15:21 / Último acesso (13/08/2013) - Usáritmo On-Line SIMEC - Fale conosco! | Tel: 5.40536 / 4.31

SIMEC Obras 2.0

Usuário: ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Sua sessão expira em: 53min57s

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Vistorias | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | **Execução Orçamentária**

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (5087) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Execução Orçamentária

Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 1.190.000,00
Custeio (R\$): 0,00
Total (R\$): 1.190.000,00

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inserido por
	09/08/2013	500.000,00	42,02	Empenho_2*_Medição[1].pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Totais:		500.000,00	42,02		

Total de Registros: 1

Detalhamento Orçamentário Liquidado


Ação	Data	Valor Liquidado (R\$)	% Liquidado	Arquivo	Inserido por
	08/08/2013	100.000,00	0,40	Nota_Fiscal_Medicao_01_FL_01.pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Totais:		100.000,00	0,40		

Total de Registros: 1

Salvar **Voltar**

Data: 13/08/2013 - 11:15:21 / Último acesso (13/08/2013) - Usáritmo On-Line | SIMEC - Faça o download do Manual | Tel.: 5.4059s | 6,3f

10. Clicar em “Salvar”;



Confirmação da execução com sucesso do comando

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA



155

SIMEC Obras 2.0 | Usuário: ANTONELLE FERRARDE | Sua sessão exp.

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dashboard da Obra | Listagem | Contratação | Cronograma | Visitas | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | **Execução Orçamentária**

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (9007) Obra teste - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000010) Obra teste - 003

Execução Orçamentária
Orçamento para a Obra

Capital (R\$): 1.190.000,00
 Custeio (R\$): 0,00
 Total (R\$): 1.190.000,00

Detalhamento Orçamentário Empenhado

Ação	Data	Valor Empenhado (R\$)	% Empenhado	Arquivo	Inserido por
	06/05/2013	500.000,00	42,02	Empenho_01_Medç&0(1).pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Total:		500.000,00	42,02		

Total de Registros: 1

Detalhamento Orçamentário Liquidado

Ação	Data	Valor Liquidado (R\$)	% Liquidado	Arquivo	Inserido por
	06/05/2013	100.000,00	6,40	Hds_Fiscal_Medç&0_01_Fc_01.pdf	ANTONELLE FERNANDES MARTINS
Total:		100.000,00	6,40		

Total de Registros: 1

Salvar Voltar

Data: 12/08/2013 09:22:48 | Última conexão: 12/08/2013 | Recursos On-Line | SIMEC - Fale Conosco Manual | F40: SIMEC / S.P.

Informações salvas

ADITIVO AO CONTRATO

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



Histórico de Tramitações
Fluxo de objeto do módulo Obras II - obra1000015

Seq.	Onde estava	O que aconteceu	Quem fez	Quando fez
1.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	05/08/2013 16:43:56
2.	Licitação	Retornar para planejamento pelo proponente	VERONICA BIS LEO	05/08/2013 16:48:47
3.	Planejamento pelo proponente	Enviado para licitação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	05/08/2013 16:48:09
4.	Licitação	Enviado para contratação	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	05/08/2013 11:46:56
5.	Contratação	Enviado para execução	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	05/08/2013 11:07:02
6.	Execução	Enviado para celebração de aditivo	ANTONELLE FERNANDES MARTINS	05/08/2013 11:25:00

Valor do Contrato (R\$): 1.200.000,00
Valor Previsto da Obra (R\$): 1.500.000,00
Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, encargos, impostos e lucro.)
Contrato Digitalizado: Acordo10692011.PDF

Vínculo da obra no contrato:
Obra: 1000015 - Obra teste - 003.
Data da Ordem de Serviço: 05/08/2013
Início da Execução: 07/08/2013
Prazo de Execução (dias): 210
Término da Execução: 05/03/2014
Ordem de Serviço: Acordo10692011.PDF

Observe a alteração da situação da obra, que passa de **Execução** para **Celebração de aditivo**

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



158

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 web application. The top navigation bar includes 'Principal', 'Relatórios', 'Sistema', and 'Sair'. The main menu has tabs for 'Dados da Obra', 'Lista de objetos da obra', 'Dados do Objeto', 'Licitação', 'Contratação', 'Cronograma', 'Vistorias', 'Recursos', 'Documentos', 'Geração de Fstas', and 'Execução Orçamentária'. The 'Contratação' tab is active, showing contract details for 'Educação Básica' in Brasília, DF. A table lists contract specifications such as 'Licitação: 123 - Tomada de Preço', 'Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A', and 'Valor do Contrato (R\$): 50,00'. A 'Vínculo da obra no contrato' table shows 'Objeto: 7827 - Profnancia Tipo B - Teste' with a start date of 16/07/2013 and an end date of 26/07/2013. A blue callout box points to the 'Editar Contrato' button at the bottom left of the interface.

Quando for realizado aditivo ao contrato, este deve ser inserido no Simec na aba **Contratação**:
1. Clicar em “Editar Contrato”;



Cadastro de Contrato

Indica Campo Obrigatório.

Contratação da Obra
(Para gravar qualquer alteração que se faça, clique em salvar)

Órgão: Educação Básica

Licitação: 123 - Concorrência

Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A

Data de Assinatura do Contrato: 05/08/2013

Prazo de Vigência do Contrato (dias): 250

Data de término do contrato: 12/04/2014

Valor do Contrato(R\$): 1.200.000,00

Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Contrato Digitalizado: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obras
1000015 - Obra teste - 003

Cronograma Atual

Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00

Área/Quantidade a ser Construída: 112,00 Unidade de Medida: m2

Custo Unitário R\$: 10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)

Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)

Planilha de Custos: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)

Adicionar Aditivo ao Contrato | Salvar e Voltar | Voltar

2. Clicar em “Adicionar Aditivo ao Contrato”;

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



The screenshot shows the 'Insistir Aditivo' page in Mozilla Firefox. The browser address bar shows the URL: `simec.fec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal/insistirAditivoAdicao=A`. The page title is 'Insistir Aditivo - Mozilla Firefox'. A dropdown menu labeled 'Tipo de Aditivo' is currently set to 'Selecione...'. Below this, there are several form fields and buttons:

- Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
- Contrato Digitalizado: Selecionar arquivo. Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)
- Obra(s): [Vincular Obra(s) ao Contrato]
- Obra: 1000015 - Obra teste - 005
- Data da Ordem de Serviço: 06/06/2013
- Início de Execução: 07/06/2013
- Prazo de Execução (dias): 210
- Término da Execução: 05/03/2014
- Ordem de Serviço: Selecionar arquivo. Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)
- Cronograma Atual
- Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00
- Área/Quantidade a ser Construída: 112,00 Unidade de Medida: m2
- Custo Unitário (R\$): 10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)
- Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro.)
- Planilha de Custos: Selecionar arquivo. Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)

Buttons at the bottom: Salvar e Voltar, Voltar.

Será aberto um **pop up** para inserção dos dados do Termo Aditivo.



3. Selecionar o “Tipo de Aditivo”;

Obras	
Obras	1000015 - Obra teste - 003
Data de Ordem de Serviço	06/06/2013
Início de Execução	07/06/2013
Prazo de Execução (dias)	210
Término de Execução	05/09/2014
Ordem de Serviço	Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acesso10032011.PDF)

Cronograma Atual	
Valor Contratado (R\$)	1.190.000,00
Área/Quantidade a ser Construída	112,00 Unidade de Medida: m2
Custo Unitário R\$	10.625,00 (R\$/Unidade de Medida)
Percentual BDI	22,00 (Administração, taxas, emendamentos, impostos e lucro)
Planilha de Custos	Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acesso10032011.PDF)

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



162

Inserir Aditivo Mozilla Firefox

www.simec.gov.br/obras/Contrato.php?trabalho=principal&id=1&insereAditivo=1

Tipo de Aditivo: Prazo

Denominação: 2º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato

Data de Assinatura do Aditivo: 03/03/2014

Prazo de Vigência do Aditivo do Contrato (dias): 230

Data de Término da Vigência do Aditivo do Contrato: 28/11/2014

Justificativa: Acréscimo de prazo de vigência e execução ao contrato

1997 máximo de caracteres

Arquivo: Selecionar arquivo... ADITIVO.pdf

Obras Vinculadas ao Aditivo

Obra	Início Anterior	Prazo Anterior	Término Anterior	Valor Anterior	Acréscimo de Prazo	Novo Prazo	Novo Término
<input type="checkbox"/> Obra teste - 003	07/06/2013	210	05/02/2014	1.190.000,00	+		

Salvar

Percentual BDI: 22,00% (Administração, honorários, impostos e lucro)

Contrato Digitalizado: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011 PDF)

Obras:

(Vincular Obra(s) ao Contrato)

Obra: 1000015 - Obra teste - 003	Cronograma Atual
Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013	Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00
Início da Execução: 07/06/2013	Área/Quantidade a ser Construída: 112,00 Unidade de Medida: m2
Prazo de Execução (dias): 210	Custo Unitário R\$: 10.625,00 (R\$/Unidade de Medida)
Término da Execução: 09/03/2014	Percentual BDI: 22,00% (Administração, honorários, impostos e lucro)
Ordem de Serviço: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011 PDF)	Planilha de Custos: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011 PDF)

Adicionar Aditivo ao Contrato

Salvar e Voltar Voltar

Data: 12/03/2013 - 16:57:32 / Último acesso: 12/08/2013 - Desativar Oo-Liste

SIMEC - Funcionário Manual - 131 4.2328s - 13/03

4. Preencher todos os campos;

5. Inserir os arquivos solicitados;

Inserir Aditivo - Mozilla Firefox

simec.nec.gov.br/obras2/obras2.php?modulo=principal&cop&[?]=InserirAditivo&sessao=A

Tipo de Aditivo: Prazo

Denominação: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato

Data de Assinatura do Aditivo: 02/03/2014

Prazo de Vigência do Aditivo do Contrato (dias): 290

Data de Término de Vigência do Aditivo do Contrato: 20/12/2014

Justificativa: Acréscimo de prazo de vigência e execução ao contrato.

Anexo: Selecionar arquivo... ADITIVO.pdf

Obras Vinculadas ao Aditivo

Obra	Início Anterior	Prazo Anterior	Término Anterior	Valor Anterior	Acréscimo de Prazo	Novo Prazo	Novo Término
<input checked="" type="checkbox"/> Obra teste - 003	07/08/2013	210	05/03/2014	1.190.000,00	290	440	22/10/2014

Salvar

6. Selecionar a obra;
7. Preenhecer as informações;
8. Clicar no botão "Salvar"

Percentual BDI: 22,00 (Administração, taxas, enduamentos, impostos e lucro.)

Contrato Digitalizado: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10692011.PDF)

[Vincular Obra(s) ao Contrato]

Obra: 1000015 - Obra teste - 003

Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013

Início de Execução: 07/08/2013

Prazo de Execução (dias): 210

Término de Execução: 05/03/2014

Ordem de Serviço: Selecionar arquivo... Nenhum arquivo selecionado. (Acordo10082011.PDF)

Cronograma Atual

Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00

Área/Quantidade a ser Construída: 112,00

Custo Unitário R\$: 10.629,00

Percentual BDI (lucro.): 22,00

Planilha de Custos: Selecionar arquivo... (Acordo10082011.PDF)

Adicionar Aditivo ao Contrato

Salvar e Voltar Voltar



The screenshot shows a web browser window with the URL simec.nec.gov.br/obras/2.0/obras2.php?modulo=principal&pagina=mainAdSolicacao=6. A modal dialog box is displayed in the center with the text "Operação realizada com sucesso!" and an "OK" button. Below the dialog, the main interface shows a form for "Adicionar Aditivo ao Contrato". The form includes fields for "Contrato Digitalizado" (with a file selection button), "Obras" (with a "Cronograma Atual" button), and various data points: "Obras: 1000015 - Obras teste - 003", "Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013", "Início da Execução: 07/08/2013", "Prazo de Execução (dias): 210", "Término da Execução: 09/03/2014", "Ordem de Serviço" (with a file selection button), "Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00", "Área/Quantidade a ser Construída: 112,00", "Custo Unitário R\$: 10.625,00", and "Percentual EDI: 22,00". At the bottom of the form are buttons for "Adicionar Aditivo ao Contrato", "Salvar e Voltar", and "Voltar".

Tela confirmação da execução da ação.

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



Cadastro do Contrato com as informações atualizadas

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



The screenshot displays the 'Cadastro de Contrato' (Contract Registration) page in the SiMEC Obras 2.0 system. The page is divided into two main sections: 'Cadastro de Contrato' and 'Cronograma'.

Cadastro de Contrato:

- Orgão: Educação Básica
- Tipo de Aditivo: Prazo
- Denominação: 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato
- Data de Assinatura do Aditivo: 03/03/2014
- Aditivo de Supressão: Não
- Justificativa: Ajuste de prazo de vigência e execução ao contrato
- Licitação: 012 - Condições
- Empresa Contratada: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
- Data de Assinatura do Contrato: 09/08/2013
- Prazo de Vigência do Contrato (dias): 400
- Data de término do contrato: 20/11/2014
- Valor do Contrato(R\$): 1.200.000,00
- Percentual DCI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro)
- Contrato Digitalizado: Nenhum arquivo selecionado.
- Anexo do Aditivo: ADITIVO.pdf

Cronograma:

- Obra: 1000015 - Obra teste - 000
- Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013
- Início de Execução: 07/08/2013
- Prazo de Execução (dias): 440
- Término de Execução: 23/10/2014
- Ordem de Serviço: Nenhum arquivo selecionado.
- Valor Contratado (R\$): 1.190.000,00
- Área/Quantidade a ser Construída: 112,00 Unidade de Medida
- Custo Unitário R\$: 10.625,00 (R\$ / Unidade de Medida)
- Percentual DCI: 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro)
- Planilha de Custos: Nenhum arquivo selecionado.

Buttons at the bottom: Adicionar Aditivo ao Contrato, Salvar e Voltar, Voltar.

10. Clicar em Cronograma atual para atualizar os prazos de execução do cronograma, conforme o aditivo de prazo;

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



167

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição: **Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A** | Início da Execução: 07/08/2013 | Término da Execução: 03/03/2014

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referência à Estrutura
1	SE	SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS	07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %
2	SE	MOVIMENTO DE TERRA	31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %
3	SE	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %
4	SE	SUPERESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %
5	SE	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %
6	SE	FORRO	31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %
7	SE	COBERTURA	02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %
8	SE	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
9	SE	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
10	SE	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %
11	SE	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
12	SE	REVESTIMENTOS	09/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %
13	SE	RISO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14	SE	PIXTURA	02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,08 %
15	SE	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
16	SE	ESQUADRIAS	03/12/2013	03/01/2014	90.000,00	7,56 %
17	SE	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
18	SE	CASTELO D'ÁGUA	10/09/2013	10/10/2013	60.000,00	5,04 %
19	SE	AIR CONDICIONADO	03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %
20	SE	PANSAJISMO / URBANIZAÇÃO	01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %
21	SE	LIMPEZA FINAL DA OBRA	01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

Inter Base

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar Voltar

11. Atualizar as informações de prazo para aditivo de prazo e dos valores, quando houver aditivo de valor;



Cronograma Físico-Financeiro
Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.


O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição: Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
Início de Execução: 07/08/2013
Término: 31/12/2014
Valor do Contrato: 1.190.000,00

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TECNICOS		07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %
2	MOVIMENTO DE TERRA		31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %
4	SUPERESTRUTURA		02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/VIDEIRA		24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %
6	FORRO		31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %
7	COBERTURA		02/01/2014	31/01/2014	40.000,00	3,36 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		28/10/2013	21/12/2013	30.000,00	2,52 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		28/09/2013	21/12/2013	30.000,00	2,52 %
10	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA		28/10/2013	21/12/2013	30.000,00	2,52 %
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)		28/10/2013	21/12/2013	30.000,00	2,52 %
12	REVESTIMENTOS		05/11/2013	10/12/2013	60.000,00	5,04 %
13	PISO		09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14	PINTURA		02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,08 %
15	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
16	ESQUADRIAS		03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
18	CASTELO D'ÁGUA		10/09/2013	10/11/2013	60.000,00	5,04 %
19	AR CONDICIONADO		08/11/2013	08/11/2013	70.000,00	5,88 %
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		01/02/2014	01/02/2014	40.000,00	3,36 %
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA		01/03/2014	03/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA FATURADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

12. Responder a pergunta;
13. Clicar em Salvar;



Tela confirmando a correta
execução da ação



WORKFLOW
Observe a situação atual da obra

Principal | Relatórios | Sistema

Bases da Obra | Licitação | Contatação | **Cronograma** | Vistorias

Tipo de ensino: Educação Básica
 Empreendimento: (0057) Obra total - 003
 Município - UF: Brasília - DF
 Obra: (1000015) Obra total - 003

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária.

Descrição: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS		07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,36 %
2	MOVIMENTO DE TERRA		31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %
3	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES		10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %
4	SUPERESTRUTURA		02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %
5	ALVENARIA/VEDAÇÃO/VIDEIRIA		24/10/2013	20/11/2013	200.000,00	16,81 %
6	FORDO		31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %
7	COBERTURA		02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,72 %
8	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
9	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS		28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
10	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA		28/10/2013	21/12/2013	25.000,00	2,10 %
11	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)		28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
12	REVESTIMENTOS		05/11/2013	10/12/2013	25.000,00	2,10 %
13	PISO		09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14	PINTURA		02/02/2014	26/02/2014	120.000,00	10,08 %
15	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA		10/09/2013	02/03/2014	60.000,00	5,04 %
16	ESQUADRIAS		03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %
17	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO		01/02/2014	15/02/2014	35.000,00	2,94 %
18	CABELO D'ÁGUA		10/09/2013	10/10/2013	60.000,00	5,04 %
19	AR CONDICIONADO		03/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %
20	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO		01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %
21	LIMPEZA FINAL DA OBRA		01/03/2014	02/03/2014	35.000,00	2,94 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante					0,00	0,00 %

Adição de Etapa | Remoção de Etapa | Adicionar | Excluir para Encerramento | Retornar

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FATURADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar Voltar

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



171

Principal | Relatórios | Sistema | Saír

Dados da Obra | Licitação | Contratações | Cronograma | Utilizadas | Recursos | Documentos | Data de Fim | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
 Empreendimento: (0007) Obra teste - 003
 Município - UF: Brasília - DF
 Obra: (1000015) Obra teste - 003

Cronograma Físico-Financeiro

Após inserir, visualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

Cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
 Início da Execução: 07/06/2013
 Término da Execução: 21/10/2014
 Valor (R\$): 1.100.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente à Estrutura	status	
1	Serviços Preliminares/Técnicos	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/08/2013	31/08/2013	40.000,00	3,56 %	Contratação aceita	
2	Movimento de Terra	MÓVIMENTO DE TERRA	31/08/2013	10/09/2013	15.000,00	1,26 %	Em Execução	
3	Infra-estrutura / Fundações Simples	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	10/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %	Em Execução	
4	Superestrutura	SUPERESTRUTURA	02/09/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %	Em Execução	
5	Alvenaria/vedação/divisória	ALVENARIA/VEDAÇÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	200.000,00	16,81 %	Em Execução	
6	Fôrro	FORRO	31/10/2013	11/01/2014	60.000,00	5,04 %	Em Execução	
7	Cobertura	COBERTURA	02/01/2014	31/01/2014	80.000,00	6,76 %	Em Execução	
8	Instalações Elétricas	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,33 %	Em Execução	
9	Instalações Hidráulicas e Sanitárias	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	29/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,33 %	Em Execução	
10	Instalações Lógica / Telefônica	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	28/10/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
11	Instalações Especiais (Som, Alarme, CFTV, dentre outros)	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	28/10/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
12	Revestimentos	REVESTIMENTOS	05/11/2013	05/11/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
13	Piso	PISO	09/01/2014	09/01/2014	0,00	0,00 %	Em Execução	
14	Pintura	PINTURA	02/02/2014	02/02/2014	0,00	0,00 %	Em Execução	
15	Impermeabilização, Isolamento Térmico e Acústico	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	10/09/2013	10/09/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
16	Esquadrias	ESQUADRIAS	09/12/2013	09/12/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
17	Instalações de Combate a Incêndio	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2014	01/02/2014	0,00	0,00 %	Em Execução	
18	Castelo d'água	CASTELO D'ÁGUA	10/09/2013	10/09/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
19	Ar Condicionado	AR CONDICIONADO	03/11/2013	03/11/2013	0,00	0,00 %	Em Execução	
20	Prisamento / Urbanização	PRISAMENTO / URBANIZAÇÃO	01/02/2014	01/03/2014	40.000,00	3,36 %	Em Execução	
21	Limpeza Final da Obra	LIMPEZA FINAL DA OBRA	01/03/2014	20/05/2014	35.000,00	2,94 %	Em Execução	
					Total	1.100.000,00	100,00 %	
					Valor do Contrato	1.100.000,00	100,00 %	
					Valor Restante	0,00	0,00 %	

Inserir Etapa

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FACTURADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar | Voltar

Clicar em "Enviar para Execução" ocorrerá a alteração da situação da obra para este status.



Somente na situação de "Execução" pode-se inserir novas vistorias

Obras 2.0

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Dados da Obra | Localização | Contratação | **Execução** | Vistorias | Recursos | Documentos

Tipo de ensino: Educação Básica
 Empreendimento: (0037) Obra teste - 003
 Município - UF: Brasília - DF
 Obra: (1000015) Obra teste - 003

Descrição
 Contrato: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERRÓVIAS S/A

Lista das etapas da obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Início	Data de Término	Valor do Item (R\$)	%	Vistoria	
1	+	SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/06/2003	31/06/2003	40.000,00	2,11 %		
2	+	MOVIMENTO DE TERRA	21/06/2003	10/09/2003	15.000,00	0,77 %		
3	+	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	18/06/2003	30/09/2003	10.000,00	0,52 %		
4	+	SUPERESTRUTURA	02/06/2003	01/11/2003	20.000,00	1,04 %		
5	+	ALVENARIA/MADEIRA/VIDRAÇA	24/10/2003	30/11/2003	100.000,00	5,18 %		
6	+	FERRÃO	31/10/2003	11/02/2004	80.000,00	4,14 %		
7	+	COBERTURA	02/04/2004	24/04/2004	80.000,00	4,14 %		
8	+	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2003	21/12/2003	40.000,00	2,07 %		
9	+	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/06/2003	21/12/2003	40.000,00	2,07 %		
10	+	INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2003	21/12/2003	25.000,00	1,28 %		
11	+	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (COM ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2003	21/12/2003	15.000,00	0,77 %		
12	+	REVESTIMENTOS	05/11/2003	18/12/2003	25.000,00	1,28 %		
13	+	PISO	09/04/2004	01/02/2004	60.000,00	3,05 %		
14	+	PINTURA	02/02/2004	26/02/2004	120.000,00	6,10 %		
15	+	IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	18/06/2003	02/01/2004	60.000,00	3,05 %		
16	+	ESQUADRIAS	02/12/2003	02/01/2004	80.000,00	4,14 %		
17	+	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2004	15/02/2004	15.000,00	0,77 %		
18	+	CASTELO D'ÁGUA	18/06/2003	18/06/2003	60.000,00	3,05 %		
19	+	AIR-CONDICIONADO	02/11/2003	08/12/2003	70.000,00	3,57 %		
20	+	PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	01/02/2004	01/03/2004	40.000,00	2,07 %		
21	+	LIQUIDAÇÃO FINAL DA OBRA	01/02/2004	29/02/2004	15.000,00	0,77 %		
					Total	1.900.000,00	100,00 %	
					Valor do Contrato	1.900.000,00	100,00 %	
					Valor restante	0,00	0,00 %	

Insere etapa

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPÕEM A PLANILHA FICAM COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? SIM NÃO

Salvar | Voltar

10/01/2012 17:04:04 | Obras - sistema (1000015) | Usuário: Oliveira

10001 - Painel Control - Manual - 15 - 3.790x1.750

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



173

Tela de confirmação para execução da ação

The screenshot displays the 'Cronograma Físico-Financeiro' (Physical-Financial Schedule) interface. A modal dialog box is centered on the screen, asking 'Deseja realmente enviar para Execução?' (Do you really want to send to Execution?). The dialog has 'OK' and 'Cancelar' (Cancel) buttons. The background interface shows a table of construction activities with columns for 'Ordem' (Order), 'Ação' (Action), 'Descrição' (Description), 'Início da Ação' (Action Start), 'Término da Execução' (Execution End), and 'Valor (R\$)' (Value). The table lists various construction tasks such as 'SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS', 'MOVIMENTO DE TERRA', 'INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES', etc. At the bottom, there are summary statistics for 'Valor do Contrato' (Contract Value) and 'Valor Realizado' (Value Realized).

Ordem	Ação	Descrição	Início da Ação	Término da Execução	Valor (R\$)
1	1	SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS	08/2011	08/2011	40.000,00
2	1	MOVIMENTO DE TERRA	09/2011	09/2011	15.000,00
3	1	INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	09/2011	09/2011	20.000,00
4	1	SUPERESTRUTURA	12/2011	12/2011	60.000,00
5	1	ALUMINARIAS/VEDAÇÃO/VIDRAÇA	03/2012	03/2012	100.000,00
6	1	FERRÃO	11/10/2011	11/01/2012	60.000,00
7	1	COBERTURA	02/04/2012	10/04/2012	80.000,00
8	1	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	09/10/2011	11/12/2011	40.000,00
9	1	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	08/04/2011	11/12/2011	40.000,00
10	1	INSTALAÇÕES LÓGICA/TELEFÔNICA	09/10/2011	11/12/2011	25.000,00
11	1	INSTALAÇÕES ESPECIAIS (GSM, ALARME, CFTV, OUTROS)	09/10/2011	11/12/2011	15.000,00
12	1	REVESTIMENTOS	03/11/2011	10/12/2011	25.000,00
13	1	PISO	08/01/2012	01/02/2012	60.000,00
14	1	PINTURA	02/02/2012	10/02/2012	120.000,00
15	1	IMPENETRABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	01/04/2012	01/02/2012	60.000,00
16	1	ESQUADRIAS	01/12/2011	01/01/2012	80.000,00
17	1	INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	01/02/2012	12/02/2012	15.000,00
18	1	CANTEIS D'ÁGUA	10/04/2011	10/10/2011	60.000,00
19	1	AR CONDICIONADO	02/11/2011	08/11/2011	20.000,00
20	1	PARAQUEDISMO E URBANIZAÇÃO	01/01/2012	01/01/2012	40.000,00
21	1	ÚLTIMA FINAL DA OBRA	01/01/2012	10/01/2012	25.000,00
Total					1.100.000,00
Valor do Contrato					1.100.000,00
Valor Realizado					0,00

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



174

The screenshot displays the SIMEC Obras 2.0 interface. A central dialog box titled "Estado alterado com sucesso!" (State changed successfully!) is overlaid on the main content. The dialog contains a checkbox labeled "Bloquear janelas de confirmação desta página?" (Block confirmation windows of this page?) and an "OK" button. The background shows a Gantt chart titled "Cronograma Físico-Financeiro" (Physical-Financial Schedule) with columns for "Término de Execução" (End of Execution) and "Valor (R\$)" (Value (R\$)). The chart lists various construction tasks such as "SERVIÇOS PRELIMINARES TÉCNICOS", "MOVIMENTO DE TERRA", "INFRA-ESTRUTURA", etc., with their respective completion dates and values.

Tela de confirmação da ação executada

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



Workflow:
Situação da obra alterada

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Definição da Obra | Utilidade | Contratação | **Cronograma** | Visualizar | Recursos | Documentos | Biblioteca de Fichas | Emissão Orçamentária

Tipo de contrato: Educação Básica
Empreendimento: (0057) Obras gerais - 003
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000016) Obra teste - 000

Cronograma Físico-Financeiro

Após inserir, atualizar ou excluir uma etapa, clique em salvar.

O cronograma deve ser preenchido com todas as etapas que compõem a planilha orçamentária contratada.

Descrição: VALEC ENGENHARIA CONSTRUÇÕES E FERROVIAS S/A
Início da Execução: 07/06/2013
Término da Execução: 21/10/2014
Valor (R\$): 1.190.000,00

Lista das Etapas da Obra

Ordem	Ação	Descrição	Data de Físico	Data de Término	Valor do Item (R\$)	(%) Referente à Estrutura
1		SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	07/06/2013	21/06/2013	40.000,00	3,36 %
2		MOVIMENTO DE TERRA	15/06/2013	19/06/2013	15.000,00	1,26 %
3		INFRAESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	16/06/2013	30/06/2013	20.000,00	1,68 %
4		SUPERESTRUTURA	02/07/2013	01/11/2013	60.000,00	5,04 %
5		ALVENARIA/PEDAGÃO/DIVISÓRIA	24/10/2013	30/11/2013	100.000,00	8,40 %
6		FORRO	11/10/2013	11/01/2014	40.000,00	3,36 %
7		COBERTURA	02/01/2014	21/01/2014	80.000,00	6,72 %
8		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	28/10/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	28/09/2013	21/12/2013	40.000,00	3,36 %
10		INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
11		INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	28/10/2013	21/12/2013	15.000,00	1,26 %
12		REVESTIMENTOS	02/11/2013	19/12/2013	25.000,00	2,10 %
13		PISO	09/01/2014	01/02/2014	60.000,00	5,04 %
14		PINTURA	02/02/2014	20/02/2014	110.000,00	9,24 %
15		IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	16/09/2013	02/01/2014	80.000,00	6,72 %
16		ESQUADRIAS	01/12/2013	02/01/2014	80.000,00	6,72 %
17		INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	02/02/2014	15/02/2014	25.000,00	2,10 %
18		CRISTALO D'ÁGUA	16/09/2013	19/10/2013	40.000,00	3,36 %
19		AR CONDICIONADO	01/11/2013	08/12/2013	70.000,00	5,88 %
20		PARQUEAMENTO / URBANIZAÇÃO	02/02/2014	01/01/2014	40.000,00	3,36 %
21		LIMPEZA FINAL DA OBRA	02/03/2014	20/02/2014	25.000,00	2,10 %
Total					1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato					1.190.000,00	100,00 %
Valor Realizado					0,00	0,00 %

Inserir Etapa

TOODOS OS SERVIÇOS QUE COMPOEM A PLANILHA FISCALIZADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Salvar | Voltar



Histórico de Tramitações

Fluxo de objeto do processo: Obras II - obra 1000018

De quem acordamos: Quando fez Quando fez

1. Planejamento pelo proponente: Enviado para licitação: 08/09/2013 16:40:00
2. Licitação: Recebido para planejamento pelo proponente: 08/09/2013 16:40:47
3. Planejamento pelo proponente: Enviado para licitação: 08/09/2013 16:40:00
4. Licitação: Enviado para contratação: 08/09/2013 11:40:58
5. Contratação: Enviado para execução: 08/09/2013 11:07:02
6. Execução: Enviado para contratação de aditivo: 13/09/2013 11:25:08
7. Contratação de aditivo: Enviado para execução: 13/09/2013 17:23:38

Estado atual: Execução

Fechar

	Início de Execução:	Término de Execução:	Valor (R\$)	% Referente à Estrutura:
	07/08/2013	21/10/2014		
07/08/2013	21/09/2013	45.000,00	1,34 %	
31/04/2013	16/09/2013	25.000,00	1,34 %	
15/09/2013	30/09/2013	30.000,00	2,52 %	
02/09/2013	06/11/2013	60.000,00	5,54 %	
24/7/2013	18/11/2013	100.000,00	10,81 %	
31/10/2013	11/01/2014	80.000,00	5,87 %	
02/01/2014	11/01/2014	80.000,00	6,72 %	
28/10/2013	31/12/2013	40.000,00	3,73 %	
28/09/2013	11/11/2013	45.000,00	1,74 %	
28/10/2013	25/12/2013	25.000,00	2,19 %	
28/10/2013	21/11/2013	11.000,00	1,24 %	
02/11/2013	18/11/2013	21.000,00	2,18 %	
08/01/2014	06/02/2014	60.000,00	5,36 %	
02/02/2014	28/02/2014	120.000,00	10,86 %	
18/09/2013	05/01/2014	60.000,00	5,54 %	
03/12/2013	03/01/2014	80.000,00	6,72 %	
04/02/2014	15/02/2014	31.000,00	2,86 %	
18/09/2013	18/10/2013	60.000,00	5,54 %	
02/11/2013	08/11/2013	70.000,00	6,38 %	
04/02/2014	06/02/2014	45.000,00	1,74 %	
04/02/2014	18/02/2014	35.000,00	3,14 %	
Total			1.190.000,00	100,00 %
Valor do Contrato			1.190.000,00	100,00 %
Valor Restante			0,00	0,00 %

Workflow:
Clicando no histórico tem-se a tela de **Histórico de Tramitações**

Histórico de tramitação

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec ADITIVO AO CONTRATO



177

The screenshot displays the 'SiMEC Obras 2.0' web application. The main content area is titled 'Contratação' and shows the following details:

- Unidade:** 123 - Descontrole
- Empresa Contratada:** MALDE ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
- Data de Assinatura do Contrato:** 05/06/2013
- Prazo de Vigência do Contrato (EAC):** 480
- Data de Término do contrato:** 28/11/2014
- Valor do Contrato (R\$):** 1.200.000,00
- Valor Previsto da Obra (R\$):** 1.200.000,00
- Percentual BDI:** 22,00 (Administração, taxas, envelopes, impostos e frete.)
- Contrato Digitalizado:** Acordo10662011.PDF
- Tipo de Aditivo:** Preço
- Descrição:** 1º Termo Aditivo de Preço ao Contrato
- Data de Assinatura do Aditivo:** 03/01/2014
- Aditivo de Suprção:** Não
- Justificativa:** Aumento de preço de vigência e execução ao contrato

Below the contract details, there is a section for 'Valor da obra no contrato' with a table:

Item	Valor Contratado (R\$)
1000010 - Obra teste - 001	1.100.000,00

Additional contract details shown include:

- Ass/Quantidade e por Central de:** 112,00 Unidade de Medida: m2
- Custo Unitário R\$:** 10.825,00 (R\$/ Unidade de Medida)
- Percentual BDI:** 22,00 (Administração, taxas, envelopes, impostos e frete.)
- Planilha de Custos:** Acordo10662011.PDF

Com a obra em **execução** deve-se **manter atualizadas** as informações no Simec com as vistorias apresentando a evolução física da obra e a correta inserção de todos os documentos, seguindo os passos apresentados neste manual.

OBRAS PARALISADAS

Podem ocorrer situações em que se faça necessário paralisar a obra.

Para estes casos o fiscal institucional deverá:

- 1- Inserir vistoria completa da obra, apresentando o executado até o momento da paralisação da obra;
- 2- Na vistoria deverá apresentar a situação de “Paralisada”;
- 3- Apresentar justificativa da paralisação;
- 4- Atualizar e completar as informações e inserção dos documentos da aba execução orçamentária;
- 5- Inserir todos os documentos solicitados nas abas;
- 6- Inserir distrato na aba documentos
- 7- Inserir documentos da nova licitação/contratação na aba documentos e solicitar à equipe CGIMP/FNDE a criação da obra vinculada;

NOVA CONTRATAÇÃO:

- 8- Solicitar à equipe da CGIMP/FNDE a criação da obra vinculada após a contratação da nova empresa;
- 9- Inserir todas as informações do procedimento licitatório e da nova contratação;
- 10- Manter as informações atualizadas garantindo a veracidade dos fatos.

Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Visitas | **Inserir Vistoria** | Recursos

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (1000237) teste vinculada
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Inserir Vistoria

Acompanhamento da Obra

Dados do Acompanhamento: (Ver Orçário de Evolução da Execução da Obra)

Data do Acompanhamento: 02/09/2013
Data Prevista de Conclusão: 30/09/2013
Nome do Responsável: ANTONELLE FERNANDES MARTINS

Situação: **Paralada**

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPEM A PLANILHA FACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS?

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento:

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão			Valor Executado	Porcentagem Executada sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado	(% Executado)
							(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão					
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,36	-	-	07/08/2013	31/08/2013	10,00	0,34	10,00	4.000,00	0,34	0,00	0,00	
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,26	-	-	31/08/2013	10/09/2013	10,00	0,13	10,00	1.500,00	0,13	0,00	0,00	
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	5,00	0,13	5,00	1.500,00	0,13	0,00	0,00	
SUPERESTRUTURA	80.000,00	6,74	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALVENARIA/VEDAÇÃO DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORRO	60.000,00	5,04	-	-	31/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,36	-	-	28/10/2013	21/11/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	0,00	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,36	-	-	28/09/2013	21/11/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	0,00	
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	-	28/10/2013	21/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	-	08/11/2013	10/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PISO	60.000,00	5,04	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PINTURA	120.000,00	10,08	-	-	02/02/2014	26/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INFERMEABILIZAÇÃO	60.000,00	5,04	-	-	19/09/2013	03/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

VITÓRIA DE OBRA PARALISADA

Inserir vistoria detalhada com várias fotografias, apresentando a situação da obra no momento da paralisação e informando os percentuais de serviços executados

VER INSERÇÃO DE VISTORIA



Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Lista de Obras | Dados da Obra | Licitação | Contratação | Cronograma | Visitas | **Inserir Vistoria** | Recursos | Documentos | Galeria de Fotos | Execução Orçamentária

Tipo de ensino: Educação Básica
Empreendimento: (1000237) teste vinculada
Município - UF: Brasília - DF
Obra: (1000015) Obra teste - 003

Inserir Vistoria

Acompanhamento da Obra

Dados do Acompanhamento: (Ver Gráfico de Evolução da Execução da Obra)

Data do Acompanhamento: 02/09/2013
 Data Prevista de Conclusão: 30/09/2013
 Nome do Responsável: ANTONELLE FERNANDES MARTINS

Situação: **Paralada**

Selecione a Situação Paralisada

Selecione...
 Seleciona...
 Concluido
 Em Execução
Paralada

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento:

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual			Diferença para a Supervisão anterior	
							(%) do Item já Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra	(%) Supervisão	Valor Executado	(%) do Item já Executado sobre a Obra após Supervisão	Quantidade Executada	Valor Executado
10 SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,36	-	-	07/08/2013	31/08/2013	10,00	0,34	10,00	4.000,00	0,34	0,00	0,00
11 MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,26	-	-	31/08/2013	10/09/2013	10,00	0,13	10,00	1.500,00	0,13	0,00	0,00
12 INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	5,00	0,13	5,00	1.500,00	0,13	0,00	0,00
13 SUPERESTRUTURA	80.000,00	6,74	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 ALVENARIA/VEDAÇÃO DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 FERRO	60.000,00	5,04	-	-	31/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,36	-	-	28/10/2013	21/12/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	0,00
18 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,36	-	-	28/09/2013	21/12/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	0,00
19 INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	-	08/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 PISO	60.000,00	5,04	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 PINTURA	120.000,00	10,08	-	-	02/02/2014	26/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 IMPERMEABILIZAÇÃO	60.000,00	5,04	-	-	19/09/2013	03/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VER INSERÇÃO DE VISTORIA

Módulo Monitoramento de Obras 2.0 - Simec

OBRAS PARALISADAS



Principal | Relatórios | Sistema | Sair

Situação: Paralisado
 Favor preencher a aba Restrições e Providências

Tipo de Paralisação: abandono da empresa

TODOS OS SERVIÇOS QUE COMPEM A PLANILHA FACTUADA COM O FNDE FORAM CONTRATADOS? Sim Não

Detalhamento de Supervisão e Acompanhamento

Descrição	Valor (R\$)	(% Sobre a Obra)	Quantidade	Unidade de Medida	Data de Início	Data de Término	Última Supervisão		Supervisão Atual		Diferença para a Supervisão anterior		
							(% do Item já Executado)	(% do Item já Executado sobre a Obra)	(%) Supervisão	Valor Executado	(% do Item já Executado sobre a Obra)	Quantidade Executada	Valor Executado
SERVIÇOS PRELIMINARES/TÉCNICOS	40.000,00	3,36	-	-	07/08/2013	31/08/2013	10,00	0,34	10,00	4.000,00	0,34		
MOVIMENTO DE TERRA	15.000,00	1,28	-	-	31/08/2013	10/09/2013	10,00	0,13	10,00	1.500,00	0,13		
INFRA-ESTRUTURA / FUNDAÇÕES SIMPLES	30.000,00	2,52	-	-	10/09/2013	30/09/2013	5,00	0,13	5,00	1.500,00	0,13	0,00	
SUPERESTRUTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/09/2013	01/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ALVENARIA/VEDAÇÃO DIVISÓRIA	200.000,00	16,81	-	-	24/10/2013	30/11/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
FORRO	60.000,00	5,04	-	-	31/10/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
COBERTURA	80.000,00	6,72	-	-	02/01/2014	31/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,36	-	-	28/10/2013	21/12/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,36	-	-	28/09/2013	21/12/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	3,36	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, OTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	-	28/10/2013	21/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	35.000,00	2,90	-	-	05/11/2013	10/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	6,72	-	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	120.000,00	10,08	-	-	02/02/2014	28/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	60.000,00	5,04	-	-	10/09/2013	02/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	80.000,00	6,72	-	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.000,00	2,94	-	-	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	80.000,00	6,72	-	-	10/09/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AR CONDICIONADO	70.000,00	5,88	-	-	03/11/2013	09/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PANSADEMO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,36	-	-	01/02/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LINHA FINAL DA OBRA	35.000,00	2,94	-	-	01/03/2014	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00						7,31					

Relatório Técnico do Acompanhamento

Selecionar o motivo da paralisação

Inserir os percentuais realizados até o momento da paralisação da obra

VER INSERÇÃO DE VISTORIA



ATIVIDADE	Valor Estimado	Valor Realizado	% Execução	Data Início	Data Término	Valor Contratado	Valor Pago	Valor em Aberto	Valor em Garantia	Valor em Suspensão	Valor em Cancelamento	Valor em Outros	Valor em Total
FORNO	80.000,00	5,04	-	31/03/2013	11/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBERTURA	80.000,00	8,72	-	02/01/2014	31/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	40.000,00	3,36	-	28/03/2013	21/02/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS	40.000,00	3,36	-	28/03/2013	21/02/2013	100,00	3,36	100,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES LÓGICA / TELEFÔNICA	25.000,00	2,10	-	28/03/2013	21/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES ESPECIAIS (SOM, ALARME, CFTV, DENTRE OUTROS)	15.000,00	1,26	-	28/03/2013	21/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REVESTIMENTOS	25.000,00	2,10	-	05/11/2013	10/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PISO	80.000,00	5,04	-	09/01/2014	01/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PINTURA	120.000,00	10,08	-	02/02/2014	25/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	40.000,00	3,04	-	10/08/2013	02/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	80.000,00	6,72	-	03/12/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	38.000,00	2,94	-	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	80.000,00	5,04	-	10/08/2013	10/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIR CONDICIONADO	70.000,00	5,80	-	03/11/2013	08/02/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,36	-	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	35.000,00	2,94	-	01/03/2014	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00					7,21						

Redigir relatório detalhado sobre o andamento da obra

- No relatório deverão constar informações pertinentes à execução da obra, tais como:
- O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
 - A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obras (preenchido e atualizado), dentre outros;
 - Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho);
 - Atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
 - Comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra;
 - Outros apontamentos.

Relatório Técnico do Acompanhamento

No relatório deverão constar informações pertinentes à execução da obra, tais como:

- O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução;
- A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos, especificações, memoriais, ART's, licenças, alvarás, caderno de encargos, diários de obras (preenchido e atualizado), dentre outros;
- Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho);
- Atrasos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
- Comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada serviço da obra;

4500 máximo de caracteres

Fotos de Acompanhamento: Ação adicional as fotos, clique no botão "Adicionar" para controlar as alterações.

Fotos de Acompanhamento

VER INSERÇÃO DE VISTORIA



IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAÇÃO TÉRMICA E ACÚSTICA	60.000,00	5,04	--	--	1009/2013	02/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ESQUADRIAS	60.000,00	6,72	--	--	03H/2013	03/01/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO	35.000,00	2,04	--	--	01/02/2014	15/02/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CASTELO D'ÁGUA	60.000,00	5,04	--	--	1009/2013	10/10/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AIR CONDICIONADO	70.000,00	3,56	--	--	03H/2013	08/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO	40.000,00	3,36	--	--	01/02/2014	01/03/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMPEZA FINAL DA OBRA	35.000,00	2,34	--	--	01/03/2014	20/05/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.190.000,00	100,00						7,55				7,31	

Relatório Técnico do Acompanhamento

Por favor, preencher os campos obrigatórios precedidos e encerrados por barras (/) e pontos (.)

a. O nome do Responsável Técnico da obra e o número da ART de execução
 b. A existência ou não de todos os documentos necessários para a execução da obra, tais como: projetos; especificações; memoriais; ART's; licenças; alvarás; caderno de encargos; diário de obras (preenchido e atualizado); entre outros;
 c. Informações sobre o canteiro de obra (existência, organização e segurança do Trabalho);
 d. Atrazos na execução da obra e a necessidade ou não de aditivos;
 e. comentário sobre a situação geral da obra e/ou de cada grupo de obra;
 f. outros apontamentos

4354 **máximo de caracteres**

Fotos do Acompanhamento *Após adicionar as fotos, clique no botão "Salvar" para confirmar as alterações.

Fotos do Acompanhamento

Inserir Fotos

Salvar Voltar

Redigir relatório detalhado sobre o andamento da obra

Inserir fotografias

VER INSERÇÃO DE VISTORIA

Salvar vistoria



Estado atual da Obra

The screenshot displays the 'Contratação' (Contracting) section of the Simec system. It shows details for a contract with the following information:

- Licitação:** 123 - Concorrência
- Empresa Contratada:** VALEC ENGENHARIA CONSTRUCOES E FERROVIAS S/A
- Data de Assinatura do Contrato:** 05/08/2013
- Prazo de Vigência do Contrato (dias):** 480
- Data de término do contrato:** 20/11/2014
- Valor do Contrato (R\$):** 1.200.000,00
- Valor Previsto da Obra (R\$):** 1.500.000,00
- Percentual BDI:** 22,00 (Administração, taxas, emolumentos, impostos e lucro)
- Contrato Digitalizado:** Acordao10692011.PDF
- Este obra foi adiada, para visualizar o histórico de adiados clique aqui.**
- Tipo de Aditivo:** Prazo
- Denominação:** 1º Termo Aditivo de Prazo ao Contrato
- Data de Assinatura do Aditivo:** 03/03/2014
- Aditivo de Supressão:** Não
- Justificativa:** Acréscimo de prazo de vigência e execução ao contrato

At the bottom, there is a table titled 'Vínculo da obra no contrato' (Work link in the contract) with the following data:

Obra:	Valor Contratado (R\$):
1000015 - Obra teste - 003	
Data da Ordem de Serviço: 06/08/2013	Área/Quantidade a ser Construída:
Início da Execução: 07/08/2013	Custo Unitário R\$:
Prazo de Execução (dias): 440	Percentual BDI:
Término da Execução: 21/10/2014	Planilha de Custos:
Ordem de Serviço: Acordao10692011.PDF	

Somente retorne para execução quando a mesma empresa contratada for dar continuidade à execução dos serviços

OBRAS CONCLUÍDAS


No caso da obra ter concluído deve-se:

- 1- Inserir vistoria completa da obra (Ver detalhe em Inserir Vistoria);
- 2- Na vistoria deverá apresentar a situação de “Concluída”;
- 3- Atualizar e completar as informações e inserção dos documentos da aba execução orçamentária;
- 4- Inserir todos os documentos solicitados nas abas;
- 5- Inserir o Termo de Recebimento Definitivo na aba Documentos;
- 6- Inserir Planilha acumulativa de medições .

SUGESTÃO MÍNIMA
PARA FOTOGRAFIAS


Modulo Monitoramento de Obras - Simec Fotos Externas – Posicionamentos adequados

Se posicionar de forma que o ângulo da foto seja o mais abrangente possível, de forma que se visualize o máximo de elementos construídos em cada foto (sejam eles as fundações, estruturas, paredes, esquadrias e até cobertura).

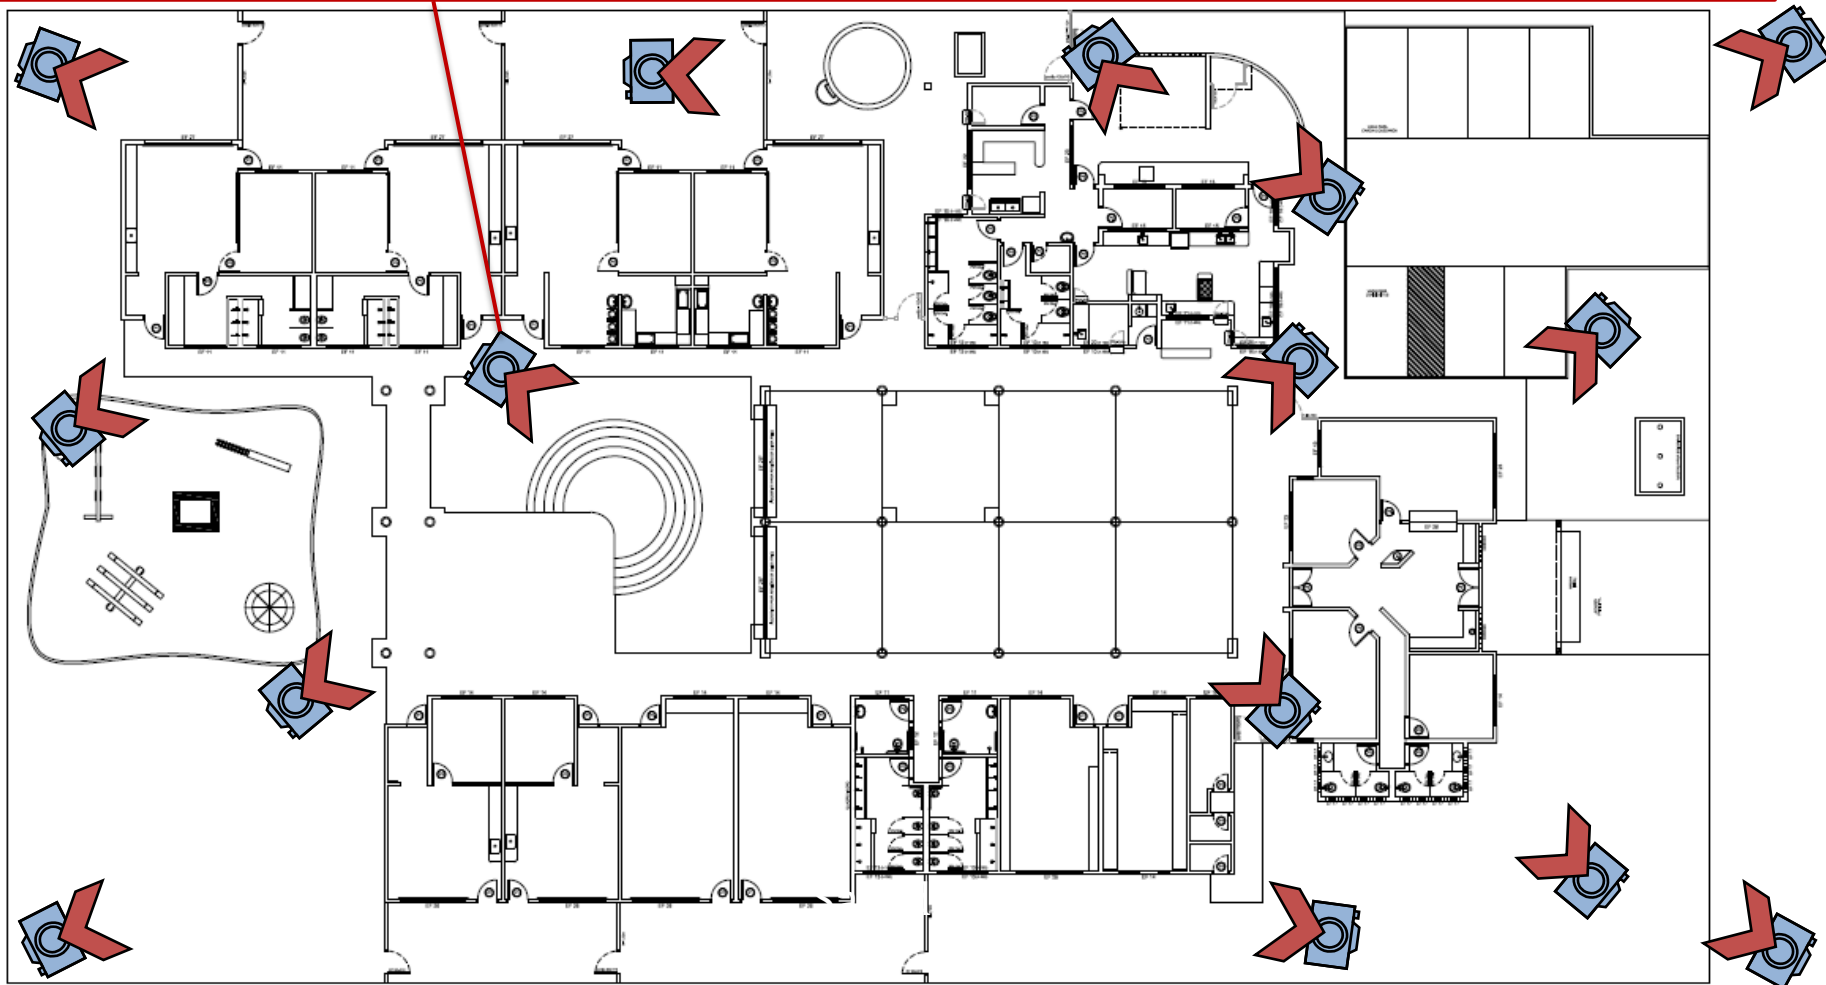

Modulo Monitoramento de Obras - Simec Fotos Internas – Posicionamentos Adequados

Se posicionar nas **entradas ou nos cantos** dos compartimentos, de forma que o ângulo da foto seja abrangente e visualize as paredes, piso, teto, esquadrias e objetos instalados em, no mínimo, 2 lados do ambiente.

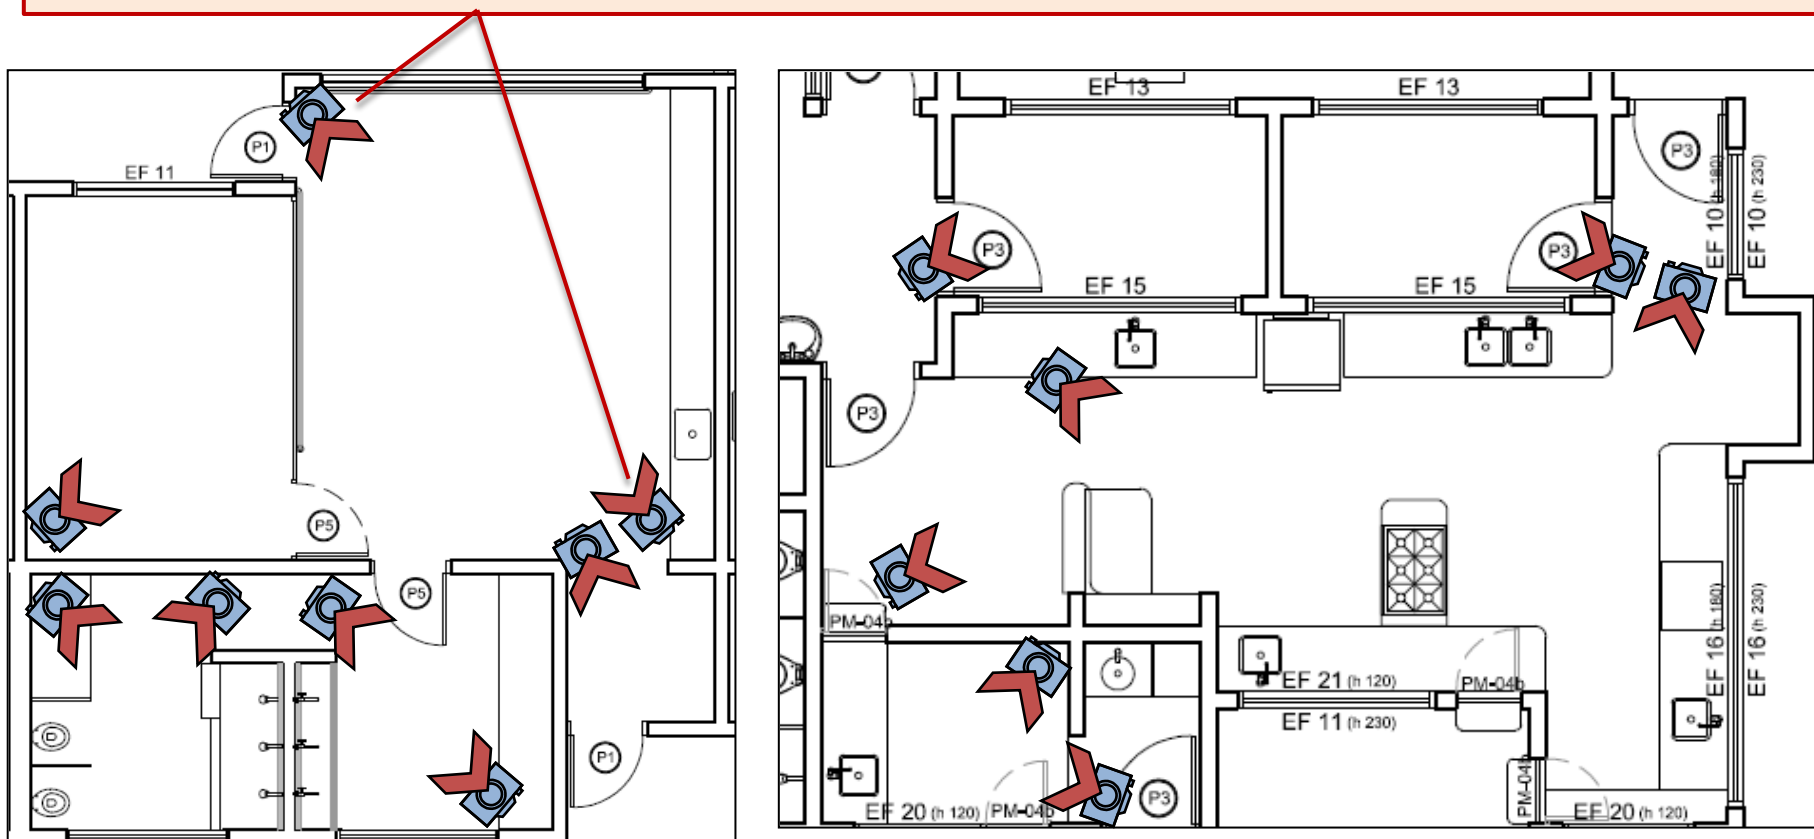

Exemplos de posições adequadas para fotografar os ambientes

CONTATO

Contatos:

Telefones:

0800 61 6161

(61) 2022 4695

E-mails:

Atendimento: atendimento.monitora@fnde.gov.br

Equipe técnica: monitoramento.obras@fnde.gov.br

Solicitação de senha: senha.monitoramento@fnde.gov.br

FNDE - Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação

Setor Bancário Sul, Quadra 2, Bloco F, Edifício FNDE - Brasília/DF - CEP: 70070-929
